

# **PROJECT COMPLETION REPORT**

**IMED 04/2003(Revised)**



## **BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD**

**Name of the Project:** Shibpur Flood Control, Drainage and Irrigation Project under Shibpur Upazila in Narsingdi District  
(1<sup>st</sup> Revised)

**Name of Division:** Narsingdi O & M Division, BWDB, Narsingdi.

**Name of Circle:** Dhaka O & M Circle, BWDB, Dhaka.

**Name of Zone:** Central Zone, BWDB, Dhaka.



**Government of the People's Republic of Bangladesh**  
**Ministry of Planning**  
**Implementation Monitoring and Evaluation Division**

**PROJECT COMPLETION REPORT : IMED 04/2003 (Revised)**

**A. PROJECT DESCRIPTION :**

01. Name of the Project : Shibpur Flood Control, Drainage and Irrigation Project under Shibpur Upazila in Narsingdi District (1<sup>st</sup> Revised)
02. Administrative Ministry/Division : Ministry of Water Resources.
03. Executing Agency : Bangladesh Water Development Board.
04. Location of the Project : District-Narsingdi Upazilla-Shibpur
05. Objective of the Project : The main objective's of the project are:
- To protect flood water intrusion of the Paharia River in the monsoon to the project area of 3950 ha. through construction of embankment;
  - Remove water logging and improve drainage system of 1600 ha;
  - Increase irrigation facility of about additional 400 ha land by using surface water during the dry season.; and
  - Protect river erosion at Palpara Bazar.
06. Estimated Cost :

|                      | (In lakh Taka) |                |
|----------------------|----------------|----------------|
|                      | Original       | Latest Revised |
| (a) Total            | 4441.75        | 5085.23        |
| (b) Taka             | 4441.75        | 5085.23        |
| (c) Foreign Currency | 0.00           | 0.00           |
| (d) Project Aid      | 0.00           | 0.00           |
| (e) RPA              | 0.00           | 0.00           |

07. Date of Approval : 

|     |    |
|-----|----|
| PCP | PP |
|-----|----|
- (a) Original : 22-09-2015
- (b) Latest Revised : 28-01-2018
- (c) No cost time extension : 15-04-2018
08. Implementation Period :

|                                     | Date of Commencement | Date of Completion |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------|
| (a) Original                        | April'2015           | June'2018          |
| (b) Revised                         | April'2015           | June'2018          |
| (c) Actual (No. cost extension-1yr) | April'2015           | June'2019          |

B



09. Financing Arrangement (Source-wise) :

9.1 Status of Loan/Grant

a) Foreign Financing : Not Applicable

| Source (s) | Currency as per Agreement | Amount in US \$ (Million) | Nature (Loan/Grant/supplier's/credit) | Date of Agreement | Date of Effective -ness | Date of Closing |         |
|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|---------|
|            |                           |                           |                                       |                   |                         | Original        | Revised |
| 1          | 2                         | 3                         | 4                                     | 5                 | 6                       | 7               | 8       |

b) GOB :

(In lakh Taka)

| Total amount | Loan | Grant   | Cash Foreign Exchange |
|--------------|------|---------|-----------------------|
| 1            | 2    | 3       | 4                     |
| 5085.23      | -    | 5085.23 | -                     |

9.2 Utilization of Project Aid : (Source wise) N/A.

(In million)

| Source (s) | Total Amount |                   | Actual Expenditure |                   | Unutilized Amount |                   |
|------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | In US \$     | In Local Currency | In US \$           | In Local Currency | In US \$          | In Local Currency |
| 1          | 2            | 3                 | 4                  | 5                 | 6                 | 7                 |

9.3 Re-imbursible Project Aid (RPA): N/A.

(In lakh Taka)

| R P A Amount |                  | Amount Spent | Amount Claimed | Amount Re-imbursed | Remarks |
|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------------|---------|
| As per PP    | As per Agreement |              |                |                    |         |
| 1            | 2                | 3            | 4              | 5                  | 6       |

**B. IMPLEMENTATION POSITION**

01. Implementation Period :

| Implementation Period as per PP |                         | Actual Implementation period                    | Time Over-run (% of original implementation period) | Remarks                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Original                        | Latest Revised          |                                                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                               | 2                       | 3                                               | 4                                                   | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| April'2015 to June'2018         | April'2015 to June'2018 | April'2015 to June'2019 (No cost extension-1yr) | (+) 27.27%                                          | As there was no provision of Land Acquisition for construction of Embankment, the land owner retarded the Embankment construction work and also writ to the Honourable High Court. 1458m River Bank Protection Work increases . For these reasons 1 year time extension was required. |

R



02. Cost of the Project :

(In lakh Taka)

| Description | Estimated Cost |                | Actual expenditure | Cost over-run<br>(% of original cost) | Remarks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Original       | Latest revised |                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1           | 2              | 3              | 4                  | 5                                     | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TOTAL       | 4441.75        | 5085.23        | 3701.20            | (-)16.67%                             | Due to Injunction of honourable High Court 1.600 km embankment couldn't be constructed. Objections of Local people and DO letter of Honourable MP's 15 Nos Pipe Outlet couldn't be constructed . As 15 Nos Pipe Outlet couldn't be constructed, full land of DPP couldn't be acquired. But project purposes almost achieved which assesed by a Technical Committee fromed by BWDB (Enclosure-1) |
| TAKA        | 4441.75        | 5085.23        | 3701.20            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PA          | -              | -              | -                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

03. Project Personnel : Project work has been implemented by existing manpower of Narsingdi O&M Division, BWDB.

| Sanctioned         | Manpower                                                                                   | Status of the existing manpower        |                             |        | Manpower |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------|
| strength as per PP | employed during execution                                                                  | Manpower requirement for O&M as per pp | Existing manpower for O & M | Others | Employed |        |
| 1                  | 2                                                                                          | 3                                      | 4                           | 5      | Male     | Female |
| Officer (s)        | Existing manpower of the implementing agency were deployed during execution of the project |                                        |                             |        |          |        |
| Staff(s)           |                                                                                            |                                        |                             |        |          |        |
| Total :            |                                                                                            |                                        |                             |        |          |        |

04. Training of Project Personnel (Foreign/Local) : No provision of training in this project.

| Field of   | Provision as per PP |             | Actual           |             | Remarks |
|------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|---------|
|            | Number of person    | Man -months | Number of person | Man -months |         |
| 1          | 2                   | 3           | 4                | 5           | 6       |
| a. Foreign | N/A                 |             |                  |             |         |
| b. Local   | N/A                 |             |                  |             |         |

B



05. Component-wise Progress (As per latest approved PP) :

(In lakh Taka)

| Sl. No.                      | Items of work                                                                | Unit | Target (as per PP) |                     | Actual Progress |                     | Reasons for deviation (±)                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                              |      | Financial          | Physical (Quantity) | Financial       | Physical (Quantity) |                                                                                                                                            |
| 1                            | 2                                                                            | 3    | 4                  | 5                   | 6               | 7                   | 8                                                                                                                                          |
| <b>(a) Revenue Component</b> |                                                                              |      |                    |                     |                 |                     |                                                                                                                                            |
|                              | Supplies and Services:                                                       |      |                    |                     |                 |                     |                                                                                                                                            |
| 1                            | Petrol & Lubricant                                                           | item | 5.75               | item                | 5.19            | 1 item              |                                                                                                                                            |
| 2                            | Printing & Publication                                                       | item | 5.96               | item                | 5.90            | 1 item              |                                                                                                                                            |
| 3                            | EIA & SIA Study                                                              | item | 19.23              | item                | 19.22           | 1 item              |                                                                                                                                            |
| 4                            | Honorarium/Fee/Remuneration                                                  | item | 3.02               | item                | 2.40            | 1 item              |                                                                                                                                            |
| 5                            | Survey & Investigation                                                       | item | 15.81              | item                | 15.77           | 1 item              |                                                                                                                                            |
|                              | Repairs, maintenance & rehabilitation                                        |      |                    |                     |                 |                     |                                                                                                                                            |
| 6                            | Repair & Maintenance of existing Vehicles (Jeep 2 nos. & Motor Cycle 3 nos.) | item | 6.97               | item                | 6.95            | item                |                                                                                                                                            |
|                              | <b>a) Revenue Total</b>                                                      |      | <b>56.74</b>       |                     | <b>55.43</b>    |                     |                                                                                                                                            |
| <b>(b) Capital Component</b> |                                                                              |      |                    |                     |                 |                     |                                                                                                                                            |
|                              | Acquisition of Assets                                                        |      |                    |                     |                 |                     |                                                                                                                                            |
| 1                            | Jeep 2477 C.C.(Made by Pragati) 1 no                                         | Nos  | 95.00              | 1 Nos               | -               | -                   | Ministry of Finance didn't give consent.                                                                                                   |
| 2                            | Motor Cycle 2 nos.                                                           | Nos  | 3.90               | 2 Nos               | 3.88            | 2 nos               |                                                                                                                                            |
| 3                            | Photocopier (1 no)                                                           | Nos  | 1.50               | 1 Nos               | 1.49            | 1 no                |                                                                                                                                            |
| 4                            | Leveling Instrument with Stands (2 nos.)                                     | Sets | 1.00               | 2 sets              | 0.99            | 2 sets              |                                                                                                                                            |
| 5                            | Hand GPS (1 no)                                                              | Nos  | 0.90               | 1 Nos               | 0.90            | 1 no                |                                                                                                                                            |
| 6                            | Brand Computer with Laser Printer and accessories                            | Sets | 2.00               | 2 Sets              | 1.99            | 2 sets              |                                                                                                                                            |
|                              | Acquisition/Purchase of lands and landed properties of Assets:               |      |                    |                     |                 |                     |                                                                                                                                            |
| 7                            | Acquisition of Land (2.271 hectares)                                         | ha.  | 1319.66            | 2.271 ha.           | 1077.35         | 1.407 ha            | Due to the objections of local people of Shibpur Upazilla Honourable MP's issued DO letter (Enclosure-2) for not constructing 15 Nos. Pipe |

R



| Sl. No. | Items of work                                                             | Unit  | Target (as per PP) |                     | Actual Progress |                     | Reasons for deviation (±)                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                           |       | Financial          | Physical (Quantity) | Financial       | Physical (Quantity) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1       | 2                                                                         | 3     | 4                  | 5                   | 6               | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                                                           |       |                    |                     |                 |                     | Outlets, So total land-of DPP has not been acquired.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | <b>Construction of works:</b>                                             |       |                    |                     |                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | <b>Regulators</b>                                                         |       |                    |                     |                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8       | a) Bhanderdia Regulator(2 vent 1.5 x 1.8 m)                               | Nos   | 175.58             | 1 no                | 169.235         | 1 Nos               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9       | b) Ghaserdia Regulator(2 vent 1.5 x 1.8m)                                 | Nos   | 175.58             | 1 no                | 169.235         | 1 Nos               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10      | c) Jhaukandi Regulator(2 vent 1.5 x 1.8 m)                                | Nos   | 173.13             | 1 no                | 170.00          | 1 Nos               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11      | d) Gariar Beel Regulator(3 vent 1.5 x 1.8 m)                              | Nos   | 199.55             | 1 no                | 192.46          | 1 Nos               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         | <b>Construction of Pipe Sluice &amp; Pipe Outlet :</b>                    |       |                    |                     |                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12      | a) South Baniadi Pipe Sluice (1.0- 0.90 m dia)                            | Nos   | 53.27              | 1 no                | 45.13           | 1 Nos               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13      | b) Shibpur Bazar Pipe Sluice (1 vent: 0.90 m dia)                         | Nos   | 53.27              | 1 no                | 45.13           | 1 Nos               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                                                           |       |                    |                     |                 |                     | Due to the objections of local people of Shibpur Upazilla Honourable MP's issued DO letter (Enclosure-2) for not constructing 15 Nos. Pipe Outlets. A technical                                                                                                                                        |
| 14      | Pipe Outlet (20 nos.)                                                     | Nos   | 419.96             | 20 nos              | 59.35           | 5 Nos               | committee has been formed by BWDB Authority for considering the affects of not constructing 15 Nos. Pipe Outlet & committee found that as there is 1.600km embankment could n't be constructed due to injunction of Honourable High Court, the drainge of the area will not be affected (Enclosure-2). |
|         | <b>Bank Protective Work</b>                                               |       |                    |                     |                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15      | a)Bank Revetment Work (From km.3.700 to km.4.000 at Palpara Bazar)        | meter | 166.09             | 300 m               | 151.58          | 300 m               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16      | b)Bank Revetment Work ( From km. 1.143 to km 1.383)                       | meter | 182.39             | 240 m               | 181.50          | 240 m               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17      | c)Bank Revetment Work ( From km.4.380 to km 4.740 & km 5.040 to km 5.310) | meter | 470.70             | 630 m               | 452.96          | 630 m               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

R



| Sl. No. | Items of work                                                                  | Unit  | Target (as per PP) |                     | Actual Progress |                     | Reasons for deviation (±)                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                |       | Financial          | Physical (Quantity) | Financial       | Physical (Quantity) |                                                                                                                                                                                                               |
| 1       | 2                                                                              | 3     | 4                  | 5                   | 6               | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                             |
| 18      | d) Bank Revetment Work (From km.5.340 to km 5.928)                             | meter | 439.69             | 588 m               | 409.25          | 588 m               |                                                                                                                                                                                                               |
|         | <b>Re-excavation of Khal:</b>                                                  |       |                    |                     |                 |                     |                                                                                                                                                                                                               |
| 19      | a) Re-excavation of Dewan Khali Khal (Length- 7.060 km)                        | km    | 69.83              | 7.060 km            | 58.67           | 7.060 km            |                                                                                                                                                                                                               |
| 20      | b) Re-excavation of Ghaserdia Khal (Length – 1.030 km)                         | km    | 24.22              | 1.030 km            | 10.61           | 1.000 km            | As there is no provision of Land Acquisition for Re-excavation of Canal, the concerned land owner retarded Canal Re-excavation.                                                                               |
| 21      | c) Re-excavation of Jhaukandi Khal (Length-1.200 km)                           | km    | 28.01              | 1.200 km            | 10.61           | 0.500 km            | As there were no provision of Land Acquisition for Re-excavation of Canal, the concerned land owner retarded Canal Re-excavation. Honourable MP's issued DO letter (Enclosure-3) for not re-excavating Canal. |
| 22      | d) Re-excavation of Fultala Khal (Length-3.500 km)                             | km    | 79.13              | 3.500 km            | 39.60           | 2.10 km             | As there were no provision of Land Acquisition for Re-excavation of Canal, the concerned land owner retarded Canal Re-excavation. Honourable MP's issued DO letter (Enclosure-4) for not re-excavating Canal. |
| 23      | e) Re-excavation of Haridola River to Madina Jute Mills Khal (Length-2.100 km) | km    | 41.02              | 2.100 km            | 21.23           | 1.300 km            | As there is no provision of Land Acquisition for Re-excavation of Canal, the concerned land owner retarded Canal Re-excavation. Honourable MP's issued DO letter (Enclosure-5) for not re-excavating Canal.   |

B



| Sl. No.               | Items of work                                         | Unit  | Target (as per PP) |                     | Actual Progress |                     | Reasons for deviation (±)                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                       |       | Financial          | Physical (Quantity) | Financial       | Physical (Quantity) |                                                                                                                                                                                                  |
| 1                     | 2                                                     | 3     | 4                  | 5                   | 6               | 7                   | 8                                                                                                                                                                                                |
|                       | Construction of Embankment                            |       |                    |                     |                 |                     |                                                                                                                                                                                                  |
|                       |                                                       |       |                    |                     |                 |                     | As there were no provision of Land Acquisition for Construction of Embankment, the concerned land owner retarded Construction of Embankment &                                                    |
| 24                    | Construction of Embankment cum Road (Length-7.500 km) | km    | 853.11             | 7.500 km            | 372.62          | 5.900km             | Writ to the Honourable High Court and also there is a Law-Year Notice of Contempt of Court and injunction of Honourable High Court (Enclosure-6). So 1.600km embankment couldn't be constructed. |
| Capital Sub Total (b) |                                                       |       | 5028.49            | 100%                | 3645.77         |                     |                                                                                                                                                                                                  |
| Total (a+b)           |                                                       |       | 5085.23            | 100%                | 3701.20         |                     |                                                                                                                                                                                                  |
|                       | Price Contingency                                     | 1item | 0.00               | -                   |                 |                     |                                                                                                                                                                                                  |
|                       | Price Contingency                                     | 1item | 0.00               | -                   |                 |                     |                                                                                                                                                                                                  |
| Grand Total (a+b)     |                                                       |       | 5085.23            | 100%                | 3701.20         | 89%                 |                                                                                                                                                                                                  |

**06. Information regarding Project Director (s) :**

| Name & Designation with pay Scale.                                                                     | Full time | Part time | Responsible for more than one project | Date of    |            | Remarks |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|------------|------------|---------|
|                                                                                                        |           |           |                                       | Joining    | Transfer   |         |
| 1                                                                                                      | 2         | 3         | 4                                     | 5          | 6          | 7       |
| Mohammad Ali<br>Superintending Engineer<br>50,000-71,200 (4 <sup>th</sup> grade)                       | Full time | -         | Yes                                   | May/2015   | 31.01.2016 |         |
| Md. Abdul Matin Sarker<br>Superintending Engineer<br>50,000-71,200 (4 <sup>th</sup> grade)             | Full time | -         | Yes                                   | 01.02.2016 | 13.11.2018 |         |
| Bejoy Indra Sanker<br>Chakraborty<br>Executive Engineer (C.C)<br>43,000-69,850 (5 <sup>th</sup> grade) | Full time | -         | No                                    | 13.11.2018 | 30.06.2019 |         |

R



# 07. Procurement of Transport (in Nos.) :

| Type of transport | Number as per P.P. | Procured with date | Transferred to Transport Pool with date | Transferred to O & M with date                      | Condemned /damaged with date | Remarks                                                                 |
|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 2                  | 3                  | 4                                       | 5                                                   | 6                            | 7                                                                       |
| Motor Cycle       | 2 Nos              | june/2016          | -                                       | Narsingdi O & M Division BWDB, Narsingdi (01-07-18) | -                            | Registration No:<br>*Narsingdi-HA-11-1821<br>&<br>*Narsingdi-HA-11-1824 |

# 08. Procurement of Goods, Works and Consultancy Services:

## 08.1 Goods & Works of the Project costing above Tk. 200.00 lakh.

| Description of procurement (goods/works/consultancy) as per bid document | Tender/Bid/Proposal Cost (in Lakh Taka) |                  | Tender/Bid/Proposal |                                    | Date of completion of works/ services and supply of goods |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | As per PP                               | Contracted value | Invitation date     | Contract signing/ L.C opening date | As per contract                                           | Actual                                                                   |
| 1                                                                        | 2                                       | 3                | 4                   | 5                                  | 6                                                         | 7                                                                        |
| Bank Revetment Work ( From km.4.380 to km 4.740 & km 5.040 to km 5.310)  | 470.70                                  | 456.58           | 20-12-2017          | 14-02-2018                         | 30-06-18                                                  | 31-05-2019<br>(The extension of time is approved by compitent authority) |
| Bank Revetment Work ( From km.5.340 to km 5.928)                         | 439.69                                  | 430.89           | 20-12-2017          | 15-02-2018                         | 30-06-18                                                  | 31-05-2019<br>(The extension of time is approved by compitent authority) |
| Pipe Outlet (20 nos.)                                                    | 419.96                                  | 377.97           | 11-10-2017          | 04-02-2018                         | 30-06-18                                                  | 25-06-2019<br>(The extension of time is approved by compitent authority) |
| Construction of Embankment cum Road (Length-7. 500 km)                   | 853.11                                  | 853.11           | 15-06-2016          | 18-09-2016                         | 16-06-2017                                                | 31-05-2019<br>(The extension of time is approved by compitent authority) |
| Construction of Regulator (Banderdia 2-Vent) & (Ghaserdia 2-Vent)        | 351.16                                  | 351.16           | 22-09-16            | 14-12-2016                         | 16-03-2018                                                | 31-05-2019<br>(The extension of time is approved by compitent authority) |
| Construction of Regulator (Garierbeel 3-Vent) & (Jhaukandi 2-Vent)       | 372.68                                  | 372.68           | 22-09-16            | 14-12-2016                         | 16-03-2018                                                | 31-05-2019<br>(The extension of time is approved by compitent authority) |

## 8.2 Use of Project Consultant (s) (Foreign/Local) : N/A

| Name of the Field | Approved man month |                 | Actual man month utilised | Remarks |
|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|---------|
|                   | As per PP          | As per contract |                           |         |
| 1                 | 2                  | 3               | 4                         | 5       |
| a. Foreign        | -                  | -               | -                         | -       |
| b. Local          | -                  | -               | -                         | -       |

R



09. Construction/Erection/Installation Tools & Equipment : N/A

| Description of items | Quantity (as per PP) | Quantity procured with date | Transferred to O & M with date | Disposed off as per rule with date | Balance | Remarks |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 1                    | 2                    | 3                           | 4                              | 5                                  | 6       | 7       |
| Not Applicable       |                      |                             |                                |                                    |         |         |

C. FINANCIAL AND PHYSICAL PROGRAMME :

01. (a) Original and revised schedule as per PP :

(In lakh Taka)

| Financial Year | Financial provision & physical target as per original PP |         |      |            | Financial provision & physical target as per latest revised PP |         |      |            |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------|------|------------|----------------------------------------------------------------|---------|------|------------|
|                | Total                                                    | Taka    | P.A. | Physical % | Total                                                          | Taka    | P.A. | Physical % |
| 1              | 2                                                        | 3       | 4    | 5          | 6                                                              | 7       | 8    | 9          |
| 2014-15        | 663.20                                                   | 663.20  | -    | 14.93%     | 0.00                                                           | 0.00    | -    | -          |
| 2015-16        | 1852.21                                                  | 1852.21 | -    | 41.70%     | 200.00                                                         | 200.00  | -    | 3.93%      |
| 2016-17        | 1090.72                                                  | 1090.72 | -    | 24.56%     | 1222.46                                                        | 1222.46 | -    | 24.04%     |
| 2017-18        | 835.62                                                   | 835.62  | -    | 18.81%     | 3662.77                                                        | 3662.77 | -    | 72.03%     |
| 2018-19        | -                                                        | -       | -    | -          | -                                                              | -       | -    | -          |
| Total          | 4441.75                                                  | 4441.75 | -    | 100%       | 5085.23                                                        | 5085.23 | -    | 100%       |

01. (b) Revised ADP allocation and progress :

(In lakh Taka)

| Financial Year | Revised Allocation & target |         |      |            | Taka release | Expenditure & physical progress |         |      |            |
|----------------|-----------------------------|---------|------|------------|--------------|---------------------------------|---------|------|------------|
|                | Total                       | Taka    | P.A. | Physical % |              | Total                           | Taka    | P.A. | Physical % |
| 1              | 2                           | 3       | 4    | 5          | 6            | 7                               | 8       | 9    | 10         |
| 2014-15        | 0.00                        | 0.00    | -    | 0.00       | 0.00         | 0.00                            | 0.00    | -    | 0.00       |
| 2015-16        | 200.00                      | 200.00  | -    | 4.50       | 200.00       | 200.00                          | 200.00  | -    | 4.50       |
| 2016-17        | 1300.00                     | 1300.00 | -    | 23.50      | 1300.00      | 1222.46                         | 1222.46 | -    | 23.50      |
| 2017-18        | 1500.00                     | 1500.00 | -    | 32.00      | 1213.33      | 1213.33                         | 1213.33 | -    | 30.00      |
| 2018-19        | 1693.00                     | 1693.00 | -    | 40.00      | 1693.00      | 1065.41                         | 1065.41 | -    | 31.00      |
| Total          | 4693.00                     | 4693.00 | -    | 100.00%    | 4693.00      | 3701.20                         | 3701.20 | -    | 89.00%     |

B



#### D. ACHIEVEMENT OF OBJECTIVES OF THE PROJECT :

| Objectives as per PP                                                                                                                     | Actual achievement                                                                                                                                                                                | Reasons for shortfall, if any                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| To protect flood water intrusion of the Paharia River in the monsoon to the project area of 3950 ha. through construction of embankment; | To protect flood water intrusion of the Paharia River in the monsoon to the project area of 3950 ha. through construction of embankment.                                                          | <p>As there were no provision of Land Acquisition for Construction of Embankment, the concerned land owner retarded Construction of Embankment &amp; Writ to the Honourable High Court and also there is a Law-Year Notice of Contempt of Court and injunction of Honourable High Court . So 1.600km embankment couldn't be constructed.</p> <p>Due to the objections of local people of Shibpur Upazilla Honourable MP's issued DO letter for not constructing 15 Nos. Pipe Outlets. A technical committee has been formed by BWDB Authority for considering the affects of not constructing 15 Nos. Pipe Outlet &amp; committee found that as there is 1.600km embankment could n't be constructed due to injunction of Honourable High Court, the drainage of the area will not be affected (Enclosure-1).</p> |
| Remove water logging and improve drainage system of 1600 ha;                                                                             | Remove water logging and improve drainage system of 1600 ha                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Increase irrigation facility of about additional 400 ha land by using surface water during the dry season.; and                          | Increase irrigation facility of about additional 400 ha land by using surface water during the dry season.; and                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Protect river erosion at Palpara Bazar.                                                                                                  | 1758m protective work will resist the erosion of the Paharia river hence save huge immovable public and private properties dispersed in the vicinity of the affected area from the river Paharia. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### E. BENEFIT ANALYSIS

##### 01. Annual Out-put:

| Items of out-put                     | Unit | Estimated quantity expected at full capacity | Actual quantity of out-put during the 1st year of operation at full capacity (or during, real production for newly completed project). |
|--------------------------------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Benefited Area                    | Ha   | 3950.00                                      | 3950.00                                                                                                                                |
| b) Incremental Food Grain Production | Mt.  | 8389.00                                      | 8389.00                                                                                                                                |
| c) Increase irrigation facility      | Ha   | 400.00                                       | 400.00                                                                                                                                 |

B



**02. Cost / Benefit :**


| Item                                  | Estimated  | Actual                                                        |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
| (1) Benefit cost ratio of the project |            |                                                               |
| (i) Financial                         | 1.74 :1.00 | Will be evaluated later by concern directors of BWDB and IMED |
| (ii) Economic                         | 2.12:1.00  |                                                               |
| (2) Internal Rate of Return           |            |                                                               |
| (i) Financial                         | 23.14%     |                                                               |
| (ii) Economic                         | 28.41%     |                                                               |

03. Please give reasons for shortfall, if any, between the estimated and actual benefit: N/A.

**F. MONITORING AND AUDITING****0.1 Monitoring:**

| Name & designation of the inspecting official                                                              | Date of Inspection | Identified Problems | Recommendations                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2                  | 3                   | 4                                                                           |
| Name & designation of the inspecting official                                                              | Date of Inspection | Identified Problems | Recommendations                                                             |
| <b>IMED :</b><br>Lasmi Chakma<br>Assistant Director<br>IMED                                                | 31-10-2017         |                     | Sugestted to increase the monitoring and quick repair of eroded embankment. |
| Md. Afzol Hossain<br>Director<br>IMED                                                                      | 28-03-2018         |                     | Sugestted to increase monitoring and 1 year time extension of the project.  |
| Lasmi Chakma<br>Assistant Director<br>IMED                                                                 | 11-06-2019         |                     | Sugestted for proper management of the re-excavated earth of Canals.        |
| <b>Others:</b> (Please specify)<br>Muhammad Yousuf<br>Additional Secretary<br>Ministry of Water Resources. | 17-04-2018         |                     | Sugestted to increase monitoring and progress of Works.                     |
| A.K.M. Momtaz uddin<br>Additional Director General (Eastern Region),<br>BWDB, Dhaka.                       | 15-07-2017         |                     | Sugestted to increase monitoring.                                           |

B



| Name & designation of the inspecting official                                           | Date of Inspection                                                 | Identified Problems | Recommendations                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                       | 2                                                                  | 3                   | 4                                    |
| A.M. Aminul Haque<br>Additional Director General (Planning),<br>BWDB, Dhaka.            | 13-04-2019                                                         |                     | Sugestted to increase<br>monitoring. |
| A.H.M Fakhrul Islam<br>Chief Engineer,<br>Central Zone,<br>BWDB, Dhaka.                 | 27-02-2017<br>29-05-2017<br>06-12-2017                             |                     | Sugestted to increase<br>monitoring. |
| Akhil Kumar Bishwas<br>Chief Engineer,<br>Central Zone,<br>BWDB, Dhaka.                 | 01-03-2019                                                         |                     | Sugestted to increase<br>monitoring. |
| Md. Abdul Matin Sarker<br>Superintending Engineer,<br>Dhaka O&M Circle,<br>BWDB, Dhaka. | 25-03-2017<br>29-05-2017<br>22-02-2018<br>28-03-2018<br>13-04-2019 |                     | Sugestted to increase<br>monitoring. |
| Md. Abdul Basit<br>Superintending Engineer,<br>Design Circle-1, BWDB, Dhaka.            | 24-06-2019                                                         |                     | Sugestted to increase<br>monitoring. |
| Md. Masoodur Rahman<br>Executive Engineer,<br>Design Circle-1, BWDB, Dhaka.             | 10-08-2017                                                         |                     | Sugestted to increase<br>monitoring. |

## 0.2. Auditing during and after Implementation:


### 2.1. Internal Audit (Resolved/Not Resolved/Partially resolved) : No audit conducted

| Period of Audit | Date of submission of<br>Audit Report | Major findings/<br>objections | Whether objections<br>resolved or not. |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| 1               | 2                                     | 3                             | 4                                      |
| -               | -                                     | -                             | -                                      |
| -               | -                                     | -                             | -                                      |

### 2.2. External Audit (Resolved/Not Resolved/Partially resolved) : No audit conducted

| Audit<br>period | Date of submission<br>of Audit Report | Major findings/ objections | Whether objections<br>resolved or not. |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| 1               | 2                                     | 3                          | 4                                      |
| -               | -                                     | -                          | -                                      |
| -               | -                                     | -                          | -                                      |

R



## G. DESCRIPTIVE REPORT

### **1. General Observations/Remarks of the Project on Shibpur Flood Control, Drainage and Irrigation Project under Shibpur Upazila in Narsingdi District.**

#### **Background:**

The water resources management in Bangladesh plays a determining role in maintaining our ecological balance. The balance between man and nature in riverine Bangladesh rests inventively on the year-round sweet water flow through the main rivers and tributaries/distributaries. But illegal human intervention along the riverbed has caused severe detrimental effects. This has not only adversely affected the navigability in riverine routes but also the declining of carrying capacity of rivers has led to the natural hazards of either floods or desertification.

The proposed project is located in Shibpur upazila of Narshingdi District and is 15 km north away from Narshingdi district town. The project is an important area along the right bank of Paharia River of Shibpur Upazila of Narshingdi District.

During monsoon, the croplands, road, various installation including homesteads the area of *Masimpur, Daulatpure, Ayubpure, Sadharchar* and an area of *Patia Union* are submerged by overtopping flood water of the Paharia River. Due to the flood event, huge damage occurs every year in the said area. Besides, huge damages are occurred to a great many of educational institutions, Mosques, Madrasa, homesteads, village markets and trade centre by flooding of Dhaka-Monohordi road. Subsequently the flood water turns into water logging due to inadequate drainage system. Palpara bazar of Narshingdi District is under threat to the river erosion. On the other hand, the flood water of the Brahmaputra River through the Garia Beel Bridge, Jhaukandi Khal and Kumardi khal enters in the project area and submerges the croplands, roads, homesteads. The people are badly affected due to the floods. Consequently crop damages are prevalent in the area. Low agricultural productivity is one of the major causes of poverty. Low agricultural productivity low farm employment, which leads to poverty to the vulnerable group.

The project area also suffers from better road communication. Construction of embankment will be considered as an indirect benefit to road communication to the people of the area.

R



As a solution to the above problems, the technical committee suggested for construction work with a view to getting flood free area for better agricultural activities and improved road communication. Constructions of major items of physical work are given below:

- Embankment 7.50 km;
- 6 Regulators;
- 2 pipe sluices;
- 300 meters protective work; and
- 16.10 km re-excavation of khals.

### **1.2 : Justification/Adequacy:**

Bangladesh is a riverine country and bank-line erosion of different rivers has been a recurrent effect. River bank erosion in alluvial lands of Bangladesh is a complex and dynamic thrust of nature due to strong onrush of water and major variation in between normal water flow and surges of inflow during monsoon & post-monsoon period in each year. The monsoon discharge of the major rivers is so large that there is recurrence of floods every year. Sometimes it becomes very severe and causes immense damages impacted by occurrence of devastating river erosion. This has significant social and economic impacts. The loss of land, crop and property has led to landlessness and impoverishment of thousands of dwellers living within bankline/flood-plains. The large seasonal variation in river flow results in varying sediment transportation capacity and causes river-bank erosion, migration of river-bank and meandering river channels. There is a direct relevance of the project to the objectives stated above. Immediate objective of bank protection from river bank erosion and the ultimate objective of safety of lives, properties and its economic impacts will be fulfilled for improved socio-economic and environmental impacts. Most of the land of Bangladesh is fertile and cultivable. So a FCDI project- like this project is very effective.

Under this Project River Bank Protection Work is effective to Reduce River Bank erosion and save the adjacent Properties. Re-excavation of khals and construction of Pipe Sluices and Pipe Outlets remove water logging by drainage. Constructed Regulators facilitates the irrigation facilities.

### **1.3: Objectives:**

- To protect flood water intrusion of the Paharia River in the monsoon to the project area through construction of embankment;
- Reduce possibility to damage to the crops and croplands of the project area;
- Remove water logging and improve drainage system;
- Improve road communication through construction of embankment; and
- Protect river erosion at Palpara Bazaar.

### **1.4 : Reason for revision:**

"Shibpur Flood Control, Drainage and Irrigation Project under Shibpur Upazila Narsingdi District" was approved by ECNEC and published GO on October 29, 2015. The administrative approval of the said project was published by Ministry of Water Resources on November 15, 2015. Total cost of the project is 4441.75 Lac BDT which is approved for fully financed by



Government of Bangladesh (GoB). Actual project implementation period is from 01 April, 2015 to 30 June, 2018. As per DPP, main items of the project are construction of 6 Nos. Regulator, 2 Nos. Pipe sluice, 5 Nos. Culvert and Gate, 20 Nos. Pipe outlet, 300 meter Protective work, 16.000 Km Canal Re-excavation and 7.500 Km Embankment construction.

1<sup>st</sup> meeting of the Steering Committee was held on 20/04/2016, 2<sup>nd</sup> meeting of the same was held on 27/12/2016 and 3<sup>rd</sup> meeting of the same was held on 27/08/2017. All the above mentioned meetings were presided by Senior Secretary of Ministry of Water Resources. The 1<sup>st</sup> PIC Meeting of the project was held on 24-08-2017.

According to the decision of 1<sup>st</sup> Steering Committee's meeting, Kumardi Regulator and Baznabo Regulator have been dropped. The proposed Kumardi Regulator has been dropped as there is no drainage connection system and existence of households in front of the proposed regulator. The proposed Baznabo Regulator has been dropped as there already exists a regulator constructed by BADC. According to the decision of 2<sup>nd</sup> Steering Committee's meeting, a proposed pipe sluice is shifted from Shadar Char to Shibpur Bazar because there is no drainage connection system at Shadar Char and existence of households in front of the proposed pipe sluice.

As per decision of the 3<sup>rd</sup> Steering Committee's meeting according to the demand of Local MP's, 5.600 Km Canal Re-excavation and 1.458 Km Protective work are included in this project. The total length of canal re-excavation is now 14.890 Km instead of 16.000 Km. Also the total length of protective work is now 1758m instead of 300m.

After revision of DPP, total cost of the project has increased from Tk. 4441.75 Lac to Tk. 5085.23 Lac and the project implementation period remains the same (from 01 April, 2015 to 30 June, 2018). The DPP cost increases 14.49%.

## **2. Rationale of the project in respect of Concept, Design, Location and Timing.**

The very nature and objectives of this Project have direct relevance with the national objectives of attaining generation of rural employment, poverty alleviation especially for rural poorer section, creation of social & environmental balance and building economic infrastructures for the future generations to sustain.

National Water policy (NWP-1999) is the basic guide for sustainable development of water resources projects. The policy indicates priorities for different multi-sectoral needs to be ensured in planning & development of water management projects.

R



1758m River bank Protection work done to the vulnerable erosion areas of Paharia River. 05 Nos. Outlets and 02 Nos. Pipe Sluices constructed to the critical water logging area. 04 nos. Regulators and constructed for giving maximum irrigation So, in respect of Concept, Design, Location and Timing, this project is perfect.

### 3. Brief description on planning and financing of the project and its applicability.

#### ◆ Project Identification

BWDB constitute a technical committee for feasibility study of the project. The summary of the recommendations of the study are given below:

- The proposed project comprises about 3950 hectares in Sibpure upazila of Narshingdi District. Upon the analysis of all related documents, field visit and in consultant with the local stakeholders that the project will useful for the local stakeholders for their socio-economic development in the course improved agricultural activities and rural employment generation. Also the project will impact positively on the environment of the area. Therefore the committee recommended the project for implementation.
- The committee recommended the following work for getting the targeted benefits:
  - Embankment 7.50 km;
  - 6 Regulators;
  - 2 pipe sluices;
  - 300 meters protective work; and
  - 16.10 km re-excavation of khals.
- The project is technical feasible, economically viable and acceptable to the local people. Therefore the committee recommended the proposal for implementation through approval of the DPP.

#### ◆ Project Preparation

- ◆ As the project area is in threat from floods, Honorable Member of Parliament (MP), Narshingdi-3 requested the Honorable Minister for Water Resources Ministry to take immediate mitigation measures. In pursuance of the DO letter from the honourable MP, the BWDB constituted a technical committee for feasibility and viability of the project. The committee studied the area and submitted the report. The recommendation of the report is given below:

“১। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলায় অবস্থিত ৩৯৫০ হেক্টর বিশিষ্ট একটি বৃহদাকার এফ,সি,ডি প্রকল্প। প্রকল্প এলাকার ম্যাপ পরীক্ষা নিরীক্ষা/ বিশ্লেষণ, প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন, স্থানীয় পাউবো এর কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনগণের সহিত মত বিনিময়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য / উপাত্তের ভিত্তিতে কমিটির নিকট প্রতীয়মান হইয়াছে, প্রস্তাবিত বিষয়ভূক্ত এফ,সি,ডি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা



হইলে প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হইবে এবং কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। দেশের খাদ্য ঘাটতি পূরন করিতে এবং স্থানীয় কর্মহীন জনগণের কর্মসংস্থানের সহায়ক ভূমিকা পালন করিবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করিলে পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রভাব পড়িবে না। তাই প্রকল্পটি বাস্তবায়নযোগ্য বলিয়া কমিটি মনে করে।

২। বিষয়ভূক্ত প্রস্তাবিত প্রকল্পের বন্যা নিয়ন্ত্রন, নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য প্রাথমিক ভাবে নিরূপিত / অনুমিত ৭.৫০ কিঃমিঃ বাঁধ, ৬ টি বিভিন্ন সাইজের রেগুলেটর নির্মাণ, ২ টি পাইপ স্ট্রুইস নির্মাণ, ৩০০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ও ১৬.০০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন ইত্যাদি কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।”

Accordingly the DPP has been formulated which was submitted to the MoWR on 11.03.2012.

Therefore DPP has been recast to modify the implementation period (from January, 2015 to June, 2017) and to re-estimate the costs of the physical works by the current schedule of rates (2014-2015) as per instruction of DPP Rationalization meeting held on the MoWR on dated 22-07-2014 .

♦ **Appraisal/PEC**

The meeting of Project Evaluation Committee (PEC) held on 26-02-2015 at Planning Commission.

- ♦ **Credit Negotiation:** Not Applicable.
- ♦ **Credit Agreement:** Not Applicable.
- ♦ **Credit Effectiveness:** Not Applicable.

- ♦ **Loan Disbursement:** Not Applicable.
- ♦ **Loan Conditionalities:** Not Applicable.

♦ **Project Approval.**

The project was approved by ECNEC on 29-10-2015

- ♦ **Others (if any) :** Null.

**4. Analysis of the Post-Implementation situation and result of the project :**

**4.1 Whether the beneficiaries of the project have clear knowledge about the Target/ Objectives of the project.**

Yes.

**4.2 Programme for use of created-facilities of the project**

The stack holders are directly taking advantages of the created facilities of the project.

**4.3 O & M programme of the project.**

After completion of the project major repair/ rehabilitation works will be accomplished from regular O&M budget of BWDB.

**4.4 Impact of the project -**

**4.4.1 Direct**

- Protecting flood water intrusion of the Paharia River in the monsoon to the project area of 3950 ha. through construction of embankment;
- Removed water logging and improve drainage system of 1600 ha;
- Increase irrigation facility of about additional 400 ha land by using surface water during the dry season.; and
- Protecting river erosion at Palpara Bazaar.

R



#### **4.4.2 Indirect**

- Safety of human livelihood and properties.
- Improvement of socio-economic condition.

#### **4.5 Transfer of Technology and Institutional Building through the project**

Not Applicable.

#### **4.6 Employment generation through the project.**

A large number of skilled/unskilled workers were employed during construction period.

#### **4.7 Possibility of Self employment**

There are possibilities of self employment as existing commercial, industrial and business centres are protected from river bank erosion & the environmental degradation.

#### **4.8 Possibility of women-employment opportunity**

Yes, there is possibility of women-employment through the project benefited area enhanced.

#### **4.9 Women's participation in development**

Yes.

#### **4.10 Probable Impact on Socio-Economic activity.**

By protecting the river bank erosion, various infrastructures are saved from the erosion. Irrigation facilities increases and so crop production increases. As a result socio-economic balance in the locality is enhanced.

#### **4.11 Impact on environment**

Environmental enhancement is achieved through the implementation of the project.

#### **4.12 Sustainability of the project**

The project is sustainable but requires periodic maintenance.

#### **4.13 Contribution to poverty alleviation/reduction**

- 1758 meter revetment works along the right bank of the Paharia river is done. After Completion of the project 1758 meter bank erosion along the right bank of the Paharia river is under control.
- Increased Irrigation facilities increases the crop production which helps poverty reduction.
- 1758 meter protective work will resist the erosion of the Paharia river hence save huge immovable public and private properties dispersed in the vicinity of the affected area from the river paharia.
- Socio-economic development of the area.
- livelihood options during project implementation period.

#### **4.14 Opinion of the public representatives, local elite, local administration, teachers, religious leaders, women's representatives etc.**

Positive remarks regarding the project.

#### **4.15 Contribution of Micro-credit programmes and Comments on overlapping with any NGO activities.**

Not Applicable.

PR



5. *Problems encountered during Implementation (with duration & steps taken to remove those)*

|      |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1  | Project Management                         | : N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.2  | Project Director                           | : N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.3  | Land Acquisition                           | : Due to the objections of local people of Shibpur Upazilla Honourable MP's issued DO letter (Enclosure-1) for not constructing 15 Nos. Pipe Outlets, So total land of DPP has not been acquired.                                                                                                                                              |
| 5.4  | Procurement                                | : N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.5  | Consultancy                                | : N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.6  | Contractor                                 | : N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.7  | Manpower                                   | : N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.8  | law & Order                                | : As there is no provision of Land Acquisition for Construction of Embankment, the concerned land owner retarded Construction of Embankment & Writ to the Honourable High Court and also there is a Law-Year Notice of Contempt of Court and injunction of Honourable High Court (Enclosure-4). So 1.600km embankment couldn't be constructed. |
| 5.8  | Natural calamity                           | : N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.9  | Project financing, allocation and Release. | : N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.10 | Design formulation/approval                | : N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.12 | Project aid disbursement and re-imbursment | : N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.13 | Mission of the development partners.       | : N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.14 | Time & Cost Over-run                       | : (+)26.67% & (+)14.49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.15 | Project Supervision/Inspection             | : N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.16 | Delay in Decision                          | : N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.17 | Transport                                  | : N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.18 | Training                                   | : N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.19 | Approval                                   | : N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.20 | Others.                                    | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

6 : Remarks & Recommendations of the Project Director :

A technical committee formed by BWDB for assessment of the impact of completed and partially completed of the components such as: pipe outlets, khals and embankments. The technical committee submitted report (Enclosure-5) and main theme is- as 1.6 km embankment could not be constructed because of the injunction of Honourable High Court, there the drainage System alive although 15 Nos. of pipe Outlets could not be constructed. Committee also suggested not to take any project without sufficient land acquisition of that area .

*B*



Under this Project River Bank Protection Work is effective to Reduce River Bank erosion and save the adjacent Properties. Re-excavation of khals and construction of Pipe Sluices and Pipe Outlets remove water logging by drainage. Constructed Regulators facilitates the irrigation facilities. This is a perfect FCDI project. However Routine maintenance and operations of all structures is essential for getting more benefits. Close monitoring of completed River Bank Protection works is also necessary whenever flood level is high.

*B. Chakraborty*  
22/02/19

(Bejoy Indra Sanker Chakraborty)

ID-830907001

Project Director

“Shibpur Flood Control, Drainage and Irrigation  
Project under Shibpur Upazila in Narsingdi District  
(1<sup>st</sup> Revised)”

Date : 29.09.2019

Signature and seal of the Project Director/Manager

(Bejoy Indra Sanker Chakraborty)  
Executive Engineer (C.C)  
Narsingdi O & M Division  
BWDB, Narsingdi.

7. Remarks/Comments of Agency Head

Constructed embankment and ancillary water control structures to re-excavation of internal khals have facilitated drainage on 9950 ha. area. Due to land acquisition issues and local issues, some components couldn't be implemented as per target quantity. A technical committee was formed under these circumstances and they have recommended declaring completion of the project at this stage. They have assessed that the stakeholders can enjoy project benefit up to a certain extent in current implemented status. BWDB may implement the remaining components whenever there is a further requisition of work from stakeholders.

*Md. Mahfuzur Rahman*  
02/10/2019

8. Remarks/Comments of the officer in-charge of the Ministry/Division

(Md. Mahfuzur Rahman)  
Director General  
BWDB, Dhaka

Date : .....

Signature and Seal



# বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড



“ নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ”  
শীর্ষক প্রকল্পের কারিগরী প্রতিবেদন।

জুলাই/২০১৯



বিষয়ঃ- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নরসিংদী পওর বিভাগাধীন নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ শীর্ষক প্রকল্পের বিভিন্ন স্থানে খাল পুনঃখনন কাজ ও পাইপ আউটলেট নির্মাণ বন্ধ করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনপূর্বক হালনাগাদ তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে সম্ভাব্যতা যাচাই করে সুপারিশমালাসহ কারিগরী কমিটির প্রতিবেদন।

## ১। ভূমিকা :

নদীমাতৃক বাংলাদেশের ভারসাম্য রক্ষায় পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রকল্পটি নরসিংদী জেলা শহর থেকে ১৫.০০ কিঃমিঃ উত্তরে অবস্থিত। প্রকল্পটির পূর্বে রায়পুরা উপজেলা, পশ্চিমে পলাশ উপজেলা ও উত্তরে বেলাব ও মনোহরদী উপজেলা এবং দক্ষিণে সদর উপজেলা অবস্থিত। উক্ত প্রকল্পটি পাহাড়িয়া নদীর ডান তীর ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র/হাড়িদোয়া নদীর বামতীরে অবস্থিত। বর্ষা মৌসুমে মাছিমপুর, আইয়ুবপুর, সাদারচর এবং পুটিয়া ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানের ফসলাদি, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট ইত্যাদি বন্যার পানিতে নিমজ্জিত হয় এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। উক্ত এলাকাসমূহের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটিতে রেগুলেটর নির্মাণ, পাইপ সুইচ নির্মাণ এবং পাইপ আউটলেট নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণ আছে। কিন্তু বাঁধ নির্মাণ কাজে কোন ভূমি অধিগ্রহণ নেই। ইতোমধ্যে ১.০০ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণপূর্বক ০৪টি রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়েছে। রেগুলেটরের বরাবর বাঁধ নির্মাণ কাজ চলমান থাকা অবস্থায় স্থানীয় জনগন কাজে বাঁধা দেন এবং ভূমি অধিগ্রহণ করে বাঁধ নির্মাণ করতে বলেন। কিছু সংখ্যক জমির মালিক ইতোমধ্যে তাঁদের জমিতে বাঁধ নির্মাণ না করার জন্য মহামান্য হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন। ৭.৫০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের মধ্যে প্রায় ৫.৯০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। মহামান্য হাইকোর্টে রিট ও কনটেম্প অফ কোর্টের উকিল নোটিশ হওয়ায় এবং জনগণের বাঁধা থাকায় অবশিষ্ট বাঁধ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়ার আশংকা আছে। তাছাড়া জনগণের দাবী অনুযায়ী স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য ২০টি আউটলেট-এর মধ্যে ১৫টি আউটলেট নির্মাণ না করার জন্য ডিও লেটার দিয়েছেন এবং ভূমি অধিগ্রহণ না করে খাল খনন কাজ বন্ধ করার জন্য ডিও লেটার প্রদান করেছেন। সামগ্রিক বিষয়ে বোর্ড কর্তৃক স্মারক নং- বাপাউবো(সচি)/পরি-১/বিবিধ-৩/২০১৯(১ম খন্ড)/১০৪, তারিখঃ ১৯/০৫/২০১৯ খ্রিঃ মোতাবেক নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কারিগরী কমিটি গঠিত হয়েছে (সংযোজনী-১)।

### কারিগরী কমিটি নিম্নরূপ :

|    |                                                                                               |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ১। | তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল-১, বাপাউবো, ৭২-গ্রীন রোড, ঢাকা।                          | আহ্বায়ক   |
| ২। | জনাব মোঃ আবুল বাশার, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান পরিকল্পনা'র দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।              | সদস্য      |
| ৩। | জনাব এ এইচ মনজুর মোর্শেদ, উপ-প্রধান (অর্থনীতি) যুগ্ম-প্রধান পরিকল্পনা'র দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। | সদস্য      |
| ৪। | জনাব মোঃ আকবর হোসেন, সহকারী প্রধান (পরিবেশ ও বন), প্রধান পরিকল্পনা'র দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।    | সদস্য      |
| ৫। | নির্বাহী প্রকৌশলী, নরসিংদী পওর বিভাগ, বাপাউবো, নরসিংদী।                                       | সদস্য সচিব |

## ২। কমিটির কার্যপরিধি :

### কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ :

- সরেজমিনে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট Stakeholder তথা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ প্রশাসনের সাথে আলোচনাপূর্বক বিষয়ভূক্ত কার্যক্রমের যথার্থতা নিরূপণ করা।
- সংশ্লিষ্ট সকল নদী/খালসমূহ পুনরুদ্ধার ও ব্যবস্থাপনার নিরীখে প্রকল্পটির আওতায় মাঠ পর্যায়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নির্ধারিত কাজ বন্ধ ও ব্যয়ের যৌক্তিকতা নির্ধারণ করতঃ প্রবাহের প্রকৃতি, প্রভাব ও গতি প্রকৃতি (Morphological Change) Site Plan এ প্রদর্শন করবেন।
- বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নে খাল পুনঃখনন কাজ ও পাইপ আউটলেট নির্মাণ বন্ধ করার ফলে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে কিনা তা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশমালা প্রণয়ন করবেন।
- প্রস্তাবিত আরডিপিপি'র অঙ্গসমূহ সংযোজন বিয়োজনের ফলে ইতোপূর্বে প্রস্তুতকৃত ডিপিপি'তে কোন অসামঞ্জস্যতা থাকলে তা নিরসনে সুপারিশমালা পেশ করবেন।
- প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব পড়বে কিনা তা নিরূপণ করবেন।
- বর্ণিত স্থানসমূহ রঙ্গিন সূচক ম্যাপ-এ প্রদর্শন করবেন।

১০৮ -১- ১৯ ৬৮ ৮৮



### ৩। কমিটির কার্যক্রম :

উল্লিখিত কারিগরী প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্তে কমিটি কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয় :

- সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা সমূহ পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ।
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার যে পরিমান এলাকা উপকৃত হবে তা সরেজমিনে পরিদর্শন।
- নরসিংদী পওর বিভাগ এর নির্বাহী প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দের সহিত প্রকল্পের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও তথ্য সংগ্রহ।
- স্থানীয় সংশ্লিষ্ট Stakeholder এর সাথে সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় ও তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ।
- নদী/খালসমূহ পুনরুদ্ধার ও ব্যবস্থাপনার নিরীখে নদী ভাংগনের কারন ও গতি প্রকৃতি (Morphological Change) নদীর গতি প্রকৃতি নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সহিত আলোচনা।
- প্রকল্পের Sustainability নিয়ে আলোচনা।
- প্রকল্পের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশ বিষয়ক পর্যালোচনা।
- মতামত ও সুপারিশ প্রণয়ন।

### ৪। প্রকল্পের অবস্থান :

প্রকল্পটি নরসিংদী জেলা শহর থেকে ১৫.০০ কিঃমিঃ উত্তরে অবস্থিত। প্রকল্পটির পূর্বে রায়পুরা উপজেলা, পশ্চিমে পলাশ উপজেলা ও উত্তরে বেলাব ও ননোহরদী উপজেলা এবং দক্ষিণে সদর উপজেলা অবস্থিত। উক্ত প্রকল্পটি পাহাড়িয়া নদীর ডান তীর ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র/হাড়িদোয়া নদীর বামতীরে অবস্থিত।

### ৫। প্রকল্প এলাকার বিদ্যমান সমস্যা :

- ❖ পর্যাপ্ত ভূমি অধিগ্রহণ সংস্থান না থাকা।
- ❖ অবশিষ্ট বাঁধ ও আউটলেট নির্মাণে স্থানীয় জনগণের বাঁধা।
- ❖ স্থানীয় জনগণ কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে রিটপীটিশন দায়ের।
- ❖ স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক কাজ বাস্তবায়ন না করার জন্য ডিও লেটার প্রদান।

### ৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- ❖ বাঁধ নির্মাণ করে ৩৯৫০ হেক্টর এলাকায় বর্ষাকালে পাহাড়িয়া নদীর পানি প্রবেশ রোধ করণ।
- ❖ ১৬০০ হেক্টর এলাকার জলাবদ্ধতা রোধ এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- ❖ সেচ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে অতিরিক্ত ৪০০ হেক্টর জমি চাষের আওতায় আনা।
- ❖ পালপাড়া বাজার এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধ।

### ৭। প্রকল্পের বর্ণনা :

প্রকল্পটি নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার মাছিমপুর, পুটিয়া, আয়ুবপুর, সাধারণচর ইউনিয়নের এলাকা নিয়ে বিস্তৃত। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হলে নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলার মাছিমপুর, পুটিয়া, আয়ুবপুর, সাধারণচর ইউনিয়নের জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নত হবে।

### ৮। যৌক্তিকতা :

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো নিশ্চিত হবে এবং উক্ত এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে।

- দারিদ্র্য বিমোচন হবে।
- বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী স্থাপনা ও বাজার রক্ষা পাবে।
- বন্যা নিয়ন্ত্রন ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে।
- খাদ্য নিরাপত্তা বাড়বে।
- জনগণের পুষ্টি স্তর বৃদ্ধি পাবে।

*(Signature)*

*(Signature)*



- সবুজ অর্থনীতির পক্ষে সহায়ক হবে।
- মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি হবে।
- স্কুল-কলেজ স্থাপন সহ শিক্ষা প্রসারের সহায়ক হবে।
- জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।
- Vision 2021, Sustainable Development Goals (SDG) বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

#### ৯। কমিটির সদস্যবৃন্দের প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও স্থানীয় জনগণের সাথে মত বিনিময় :

কারিগরি কমিটি কর্তৃক গত ২৪/০৬/২০১৯ খ্রিঃ “নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিক্ষেপন ও সেচ প্রকল্প” এলাকাটি সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে নরসিংদী পওর বিভাগ এর নির্বাহী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট শাখা কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে পরিলক্ষিত হয় প্রকল্পটিতে রেগুলেটর নির্মাণ, পাইপ স্পাইচ নির্মাণ এবং পাইপ আউটলেট নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণ আছে। কিন্তু বাঁধ নির্মাণ কাজে কোন ভূমি অধিগ্রহণ নেই। ইতোমধ্যে ১.০০ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণপূর্বক ০৪টি রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়েছে। রেগুলেটরের ঠিক বরাবর বাঁধ নির্মাণ কাজ চলমান থাকা অবস্থায় স্থানীয় জনগণ কাজে বাঁধা দেন এবং ভূমি অধিগ্রহণ করে বাঁধ নির্মাণ করতে বলেন। কিছু সংখ্যক জমির মালিক ইতোমধ্যে তাদের জমিতে বাঁধ নির্মাণ না করার জন্য মহামান্য হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছেন। ৭.৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের মধ্যে প্রায় ৫.৯০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। মহামান্য হাইকোর্টে রিট ও কনটেম্প অব কোর্টের উকিল নোটিশ হওয়ায় এবং জনগণের বাঁধা থাকায় অবশিষ্ট বাঁধ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া জনগণের দাবী অনুযায়ী স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য ২০টি আউটলেট-এর মধ্যে ১৫টি আউটলেট নির্মাণ না করার জন্য ডিও লেটার দিয়েছেন এবং ভূমি অধিগ্রহণ না করে খাল পুনঃখনন কাজ বন্ধ করার জন্যও ডিও লেটার প্রদান করেছেন।

পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে ডিপিতে খাল পুনঃখননের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান ছিল না। ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান না থাকার কারনে জনগণের ফসলী জমি কাটা পরে বিধায় সাধারণ জনগণ কাজ বাস্তবায়নে বাঁধা দেয়। পরিদর্শনকালে আরও দেখা যায় যে প্রস্তাবিত খাল দুইটির কিছু অংশে খালের অস্তিত্ব বিদ্যমান এবং বেশির ভাগ অংশ মাটি ভরাট হওয়াতে উচু হয়ে সমান ফসলী জমিতে পরিণত হয়েছে। যাহা জনগণের ব্যক্তিমালিকানা খারিজ সম্পত্তি হিসেবে তাদের কাছে কাগজ পত্রাদি রয়েছে। জনগণের দাবির প্রেক্ষিতে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য প্রান্তিক কৃষক/ব্যক্তি মালিকধীন ফসলী জমির উপর দিয়ে উল্লেখিত খাল দুইটির পুনঃখনন কার্যক্রম জনস্বার্থে বন্ধ করার জন্য বাপাউবো বরাবর পত্র প্রেরণ করেন (সংযোজনী-২)। অপর খাল দুইটির অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকলেও ভূমি অধিগ্রহণ নাই বিধায় জনগণের দাবীর প্রেক্ষিতে এবং মাননীয় সংসদ সদস্যের আপত্তির প্রেক্ষিতে খাল দুইটির পুনঃখনন কাজ ডিজাইন মোতাবেক খনন করা সম্ভব হয় নাই।

অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতায় শিবপুর বাজার হতে ঢাকা-সিলেট হাইওয়ে পর্যন্ত নির্মাণাধীন বাঁধ কাম রাস্তা তৈরী কাজের মধ্যে পানি নিক্ষেপনের জন্য ২০টি পাইপ আউটলেট নির্মাণের জন্য নির্ধারিত ছিল। বর্তমানে ২টি পাইপ স্পাইচ ও ৫টি পাইপ আউটলেট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বাকী ১৫টি পাইপ আউটলেট নির্মাণের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে স্থানীয় জনগণ বাধা প্রদান করে। জনগণের দাবির প্রেক্ষিতে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য ১৫টি পাইপ আউটলেট নির্মাণ কার্যক্রমটি জনস্বার্থে বন্ধ করার জন্য বাপাউবো বরাবর ডিও লেটার প্রেরণ করেন (সংযোজনী-৩)। স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয়ের পত্রের অনুরোধে জনস্বার্থে অবশিষ্ট ১৫টি আউটলেটের কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। তবে মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শনে দেখা গেছে অবশিষ্ট ১৫টি আউটলেটের অবস্থান অপেক্ষাকৃত উচু এবং বসতবাড়ী ইত্যাদি থাকায় জলবদ্ধতা তেমন প্রকট নয়। কিছু কিছু স্থানে সামান্য জলাবদ্ধতা থাকলেও স্থানীয় জনগণ নিজ প্রচেষ্টায় পিভিসি পাইপ এর মাধ্যমে তাহা নিরসন করছেন।

উল্লেখ্য যে অংশে বাঁধ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি সে অংশে আউটলেট নির্মাণের কোন সুযোগ নেই। বাস্তবায়িত ৫টি আউটলেটের অবস্থান বাঁধের অপেক্ষাকৃত নিচু এলাকায় নির্মাণ হওয়াতে উক্ত এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ সহজ হবে এবং কৃষক তার সুবিধামত সেচ কাজ পরিচালনা করিতে পারবেন। তাছাড়া খালের যে অংশে পুনঃখনন করা হয়েছে তাতে নিক্ষেপন ব্যবস্থা সচল থাকবে। ফলে অবশিষ্ট ১৫টি আউটলেট নির্মাণ করা না গেলেও প্রকল্প এলাকার সার্বিক নিক্ষেপন ব্যবস্থায় তেমন কোন বিঘ্ন ঘটবে না বলে প্রতীয়মান হয়।

#### ১০। কমিটির কাজের সীমাবদ্ধতা :

কারিগরি কমিটির কর্মপরিধির ব্যাপকতার তুলনায় স্বল্প সময়ের কারণে কমিটির পক্ষে বিস্তারিত সমীক্ষা করার কোন সুযোগ নেই। কমিটি কর্তৃক সমস্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন, কারিগরি দিক ও স্থানীয় জনগণের প্রয়োজনীয়তা, অনুভূতি ও সামাজিক মূল্যবোধকে বিবেচনা করা হয়েছে। কারিগরি কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদনটি পূর্বের ব্যবহৃত তথ্যাদি (Secondary data) ও মাঠ পর্যায়ের দণ্ডর হতে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয়েছে।



১১। প্রকল্প এলাকার ইনডেক্স ম্যাপ :

প্রকল্প এলাকার ইনডেক্স ম্যাপ সংযোজনী-৪ সংযুক্ত করা হল।

১২। প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজ সমূহ :

| ক্রমিক<br>নং | প্রধান প্রধান ভৌত অঙ্গ নাম | পরিমাণ/দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ)<br>(কম/বেশী প্রায়) |
|--------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| ১            | ২                          | ৩                                           |
| ১।           | রেগুলেটর নির্মাণ           | ৪ টি                                        |
| ২।           | পাইপ সুইচ নির্মাণ          | ২ টি                                        |
| ৩।           | পাইপ আউটলেট                | ৫ টি                                        |
| ৪।           | নদী তীর সংরক্ষণ            | ১.৭৫৮                                       |
| ৫।           | খাল পুনঃখনন                | ১০.২৩০                                      |
| ৬।           | বাঁধ নির্মাণ               | ৫.৯০                                        |

১৩। প্রকল্পের নকশা :

ভৌত কাজের ডিজাইন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল-১, বাপাউবো, ঢাকা হতে প্রাপ্ত।

১৪। প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব পর্যালোচনা : প্রকল্পের আওতায় কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত রেগুলেটর নির্মাণ, পাইপ সুইচ নির্মাণ, পাইপ আউটলেট নির্মাণ, নদী তীর সংরক্ষণ, খাল পুনঃখনন ও বাঁধ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে প্রকল্প এলাকায় পরিবেশ বান্ধব অবস্থা বিরাজ করবে এবং জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন হবে।

১৫। কৃষি, পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব :

ভৌত কাজসমূহ আর্থিকভাবে সমর্থিত ও সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য।

কৃষি :

প্রস্তাবিত ১.৭৫৮ কিঃ মিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ সফলভাবে বাস্তবায়নের ফলে কৃষি জমি, বাজার ও অন্যান্য স্থাপনা নদী ভাংগনের হাত হতে রক্ষা হয়েছে। বন্যা ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি হবে।

পরিবেশ :

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজের ফলে নদী ভাংগন রোধ, বন্যা ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও খাল খননের ফলে তা প্রকল্প এলাকায় পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক হবে। প্রকল্পের যে অংশ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি তার ফলে প্রকল্প এলাকায় পরিবেশগত তেমন কোনো বিরূপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা নেই বলে কমিটির কাছে প্রতিয়মান হয়।

আর্থ-সামাজিক :

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কৃষি জমিও বসতিভিটা রক্ষা পেয়েছে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ হয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে, জনমনে স্বস্তি ফিরে এসেছে এবং কাজের উৎসাহ বেড়েছে। কৃষি জমির ব্যবহার নিশ্চিত হওয়ার ফলে অধিক কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন সম্ভব হবে। তাছাড়া প্রতিরক্ষা বাস্তবায়ন কাজে ও বাস্তবায়নোত্তর রক্ষনাবেক্ষণ কাজে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর জন্য বিশেষতঃ দিনমজুর, স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা মহিলাদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়ে ছিল। ফলে স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখার কাজে অবদান রাখছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে কৃষিভিত্তিক নানারকম ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে এলাকার জনগণের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন :

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হয়েছে।



১৮। কমিটির মতামত ও সুপারিশ :


কারিগরী কমিটি কর্তৃক প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ, বর্তমান অবস্থা, নরসিংদী বাপাউবো'র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ও প্রকল্প এলাকার জনগণের সাথে আলোচনা, স্থানীয় আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থা পর্যালোচনা এবং কারিগরী ও অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় কমিটি নিম্নরূপ সুপারিশ প্রদানের সিদ্ধান্তে উপনীত হয় :

ক) প্রকল্পের আওতায় ডিপিসি মোতাবেক ৭.৫০ কি.মি. বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের মধ্যে ৫.৯০ কি.মি বাঁধ, ৪টি রেগুলেটর, ০২টি পাইপ স্লুইচ ও ২০ টি পাইপ আউটলেটের মধ্যে ০৫টি পাইপ আউটলেট এবং ১৪.৮৯০ কি.মি খাল পুনঃখননের মধ্যে ১০.২৩০ কি.মি খাল খনন সম্ভব হয়েছে। ১.৬ কি.মি. দৈর্ঘ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ না হওয়ায় সে উন্মুক্ত স্থান দিয়ে এবং নির্মিত অরকাঠামোগুলো দ্বারা নিষ্কাশন ব্যবস্থা সচল থাকবে।

খ) ভূমি অধিগ্রহণ না থাকা, জমির মালিকের বাধা, মহামান্য হাইকোর্টের রিট চলমান থাকায় এবং কনটেন্ট অব কোর্ট এর উকিল নোটিশ আছে বিধায় ১.৬ কি.মি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও ১৫টি পাইপ আউটলেট এবং ৪.৬৬০ কিঃমিঃ খাল খনন সম্ভব হয়নি। কোর্ট কেইস সহসাই নিষ্পত্তি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় এবং জমির মালিকগণ জমি দিতে রাজি না হওয়ায় ১.৬ কি.মি বাঁধ ও ১৫টি পাইপ আউটলেট ও ৪.৬৬০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন ব্যতিরেকেই প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা যেতে পারে।

গ) অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে এবং জন সাধারণের চাহিদা থাকিলে অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত অথবা নতুন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে অবশিষ্ট ১.৬ কি.মি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও ১৫টি আউটলেট ও ৪.৬৬০ কি.মি খাল খনন কাজ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

ঘ) ভবিষ্যতে জমি অধিগ্রহণ ব্যতিরেকে এ ধরনের কোন প্রকল্প গ্রহণ সমীচীন হবে না।

  
২৪/০৫/২০১২

(মোঃ আকবর হোসেন)

সহকারী প্রধান (পরিবেশ ও বন)

প্রধান পরিকল্পনার দপ্তর,

বাপাউবো, ঢাকা

ও

সদস্য, কারিগরী কমিটি।

  
২৪/০৫/২০১২

(এ এইচ মনজুর মোশেক)


উপ-প্রধান (অর্থনীতি)

মুখ্য প্রধান পরিকল্পনা'র দপ্তর,

বাপাউবো, ঢাকা।

ও

সদস্য, কারিগরী কমিটি।

  
২৪/০৫/২০১২

(বিজয় ইন্দ্র শংকর চক্রবর্তী)


নির্বাহী প্রকৌশলী

নরসিংদী পওর বিভাগ,

বাপাউবো, নরসিংদী।

ও

সদস্য সচিব, কারিগরী কমিটি।

  
২৪/০৫/২০১২

(জনাব মোঃ আবুল বাশার)


নির্বাহী প্রকৌশলী

প্রধান পরিকল্পনা'র দপ্তর,

বাপাউবো, ঢাকা।

ও

সদস্য, কারিগরী কমিটি।

  
২৪/০৫/২০১২

(মোঃ আব্দুল বাছিত)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

নকশা সার্কেল-১, বাপাউবো,

৭২-শ্রীন রোড, ঢাকা

ও

আহ্বায়ক, কারিগরী কমিটি।



ফোন :

অফিস : ৯৫১১২৯৩, ৯৫৫৫১৩৩

ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৫৬৪৭৬৩

সচিবালয়  
ওয়াদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

Phone :

Office : 9511293, 9555133

Fax : 88-02-9564763

স্মারক নং-বাপাউবো(সচি)/পরি-১/বিবিধ-৩/২০১৯(১ম খণ্ড)/১০৪

তারিখঃ ১৯-০৫-২০১৯ খ্রিঃ

## দপ্তরাদেশ

“নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিকাশন ও সেচ প্রকল্প” এর অধীনে বিভিন্ন স্থানে খাল পুনঃখনন কাজ ও পাইপ আউটলেট নির্মাণ বন্ধ করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শনপূর্বক হালনাগাদ তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সম্ভাব্যতা যাচাই করে সুপারিশমালাসহ কারিগরি প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে সুনির্দিষ্ট কার্যপরিধিসহ একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হলো। কমিটি প্রয়োজনে অন্য যে কোন কর্মকর্তাকে সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে।

| ক্রমিক<br>নং | কর্মকর্তাদের নাম ও পদবী                                                                        | কমিটিতে<br>অবস্থান |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ১।           | তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল-১, বাপাউবো, ঢাকা।                                         | আহ্বায়ক           |
| ২।           | জনাব মোঃ আবুল বাশার, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান পরিকল্পনা'র দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।               | সদস্য              |
| ৩।           | জনাব এ এইচ মনজুর মোর্শেদ, উপ-প্রধান (অর্থনীতি), যুগ্ম-প্রধান পরিকল্পনা'র দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। | সদস্য              |
| ৪।           | জনাব মোঃ আকবর হোসেন, সহকারী প্রধান (পরিবেশ ও বন), প্রধান পরিকল্পনা'র দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।     | সদস্য              |
| ৫।           | নির্বাহী প্রকৌশলী, নরসিংদী পত্তর বিভাগ, বাপাউবো, নরসিংদী।                                      | সদস্য-সচিব         |

## কমিটির কার্যপরিধিঃ

- সরেজমিনে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিদর্শন করে সংশ্লিষ্ট Stakeholder তথা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ প্রশাসনের সাথে আলোচনাপূর্বক বিষয়ভূক্ত কার্যক্রমের যথাযথতা নিরূপণ করবেন;
  - সংশ্লিষ্ট সকল নদী/খালসমূহ পুনরুদ্ধার ও ব্যবস্থাপনার নিরীখে প্রকল্পটির আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নির্ধারিত কাজ বন্ধ ও ব্যয়ের যৌক্তিকতা নির্ধারণ করতঃ প্রবাহের প্রকৃতি, প্রভাব ও গতি প্রকৃতি (Morphological Change) Study Plan এ প্রদর্শন করবেন;
  - বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিকাশন ও সেচ প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নে খাল পুনঃখনন কাজ ও পাইপ আউটলেট নির্মাণ বন্ধ করার ফলে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য বাস্তব হতে কিনা তা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশমালা প্রণয়ন করবেন;
  - প্রস্তাবিত আরডিপিপি'র অঙ্গসমূহ সংযোজন-বিয়োজনের ফলে ইতোপূর্বে প্রস্তুতকৃত ডিশিপিংতে কোন অসামঞ্জস্যতা থাকলে তা নিরসনে সুপারিশমালা পেশ করবেন;
  - প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পরিবেশগত বিঘ্নন প্রভাব গড়নে কিনা তা নির্ধারণ করবেন;
  - বর্ণিত স্থানসমূহ রাস্তা সূচক ম্যাপ-এ প্রদর্শন করবেন।
- কমিটি সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের সুপারিশমাদসহ কারিগরি প্রতিবেদন এ আদেশ জারীর পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে ৩(তিন) প্রহে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) মহোদয়ের দপ্তরে দাখিল করবেন।
  - মূল প্রতিবেদনের Soft Copy(Text) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) মহোদয়ের [adgpi.bwd@b@gmail.com](mailto:adgpi.bwd@b@gmail.com) ঠিকানায় E-mail যোগে প্রেরণ করবেন।
  - মহাপরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো।

(মোঃ সাহিদুল ইসলাম খান)  
উপ-সচিব (পরিকল্পনা)  
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড  
ঢাকা।

## বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ও ক্রমিকতার ভিত্তিতে নহে)ঃ

- তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল-১, বাপাউবো, ঢাকা।
- জনাব মোঃ আবুল বাশার, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান পরিকল্পনা'র দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- জনাব এ এইচ মনজুর মোর্শেদ, উপ-প্রধান (অর্থনীতি), যুগ্ম-প্রধান পরিকল্পনা'র দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- জনাব মোঃ আকবর হোসেন, সহকারী প্রধান (পরিবেশ ও বন), প্রধান পরিকল্পনা'র দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, নরসিংদী পত্তর বিভাগ, বাপাউবো, নরসিংদী।

## অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে)ঃ


- প্রধান পরিকল্পনা, বাপাউবো, ঢাকা।
- প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা।
- যুগ্ম-প্রধান, যুগ্ম-প্রধান পরিকল্পনা'র দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৪-৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল-১/ঢাকা পত্তর সার্কেল, বাপাউবো, ঢাকা।
- সিএসও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
- সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, বাপাউবো, ঢাকা। বাপাউবো'র ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ।
- ব্যক্তিগত সহকারী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা/ইস্টার্ন রিজিয়ন), বাপাউবো, ঢাকা।

১০৫ ২০/৬/২০১৯

১০/৬/১৯

একটি অনুলিপি  
১০/৬/১৯





সংসদ সদস্য মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা

সংসদ সদস্য

২০১- নরসিংদী-৩ (শিবপুর)

সদস্য, রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

ডিও নং : জ.স.স. ২০১/নর-৩/পাউবো/০১

তারিখ : ১১/০৬/২০১৭ খ্রিঃ

মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড  
ঢাকা।

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| তারিখ: ১১/০৬/২০১৭                      | তারিখ: ১১/০৬/২০১৭ |
| ★ জা.স.স. (সদস্য/মহাপরিচালক সার্কেল)   | ★ অতি প্রতীক/অতি  |
| ★ এ. প্রকৌশল (পরিচালক)                 | ★ অসহকারী/অসহকারী |
| ★ সি. প্রকৌশল                          | ★ অসহকারী/অসহকারী |
| ★ সি. প্রকৌশল (পরিচালক/উপ-বিঃ প্রকৌশল) | ★ অসহকারী/অসহকারী |
| ★ উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক            | ★ অসহকারী/অসহকারী |
| ★ প্রকৌশল                              | ★ অসহকারী/অসহকারী |

বিষয়ঃ- শিবপুর উপজেলার ঝাউয়াকান্দি মৌজার ভূজুনী বিলের প্রান্তিক কৃষকদের ব্যক্তি মালিকানাধীন ফসলি জমির উপর দিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ড, নরসিংদী বিভাগ কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতীত খাল খনন কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য।

প্রিয় মহোদয়,

উপরোল্লিখিত বিষয়ের আলোকে আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ০৩/০৬/২০১৭ ইং তারিখ আমি বর্ণিত এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক জানতে পারলাম যে, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নরসিংদী বিভাগীয় অফিস ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতীত ঝাউয়াকান্দি মৌজার ভূজুনী বিলের প্রান্তিক কৃষকদের ব্যক্তি মালিকানা ফসলি জমির উপর দিয়া প্রায় ৫০ ফুট প্রস্থ ও প্রায় ১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য খাল খনন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। যাহা এলাকার জনগনকে পূর্বহতে অবগত করা হয়নি এখনও খাল খনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হলে একধিকে ফসলি জমি নষ্ট হবে অপর দিকে সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক কৃষকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমনকি অনেকে ফসলি জমি হারা হয়ে নিশ্চঃ হয়ে যাবে। জনস্বার্থে এই খাল খনন কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হলো।

অবশ্য বর্তমানে নকশা অনুযায়ী বিদ্যমান খালটি খননে জনগনের কোন আপত্তি নেই।

ধন্যবাদান্তে,

আপনার একান্ত

(মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা)

সংসদ সদস্য

২০১- নরসিংদী-৩

- ১। অমপ (পূর্ব/পশ্চিম/পরি/প্রশাসন/অর্থ)/ প্রধান (পরি/যনি)
- ২।
- ★ অনুমতি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।
  - ★ বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিম্ন।
  - ★ পত্রের মর্মানুসারে প্রতিবেদন পেশ করুন।
  - ★ পরীক্ষা করে পেশ করুন।
  - ★ তদন্ত করে যথাযত সহ প্রতিবেদন দিন।
  - ★ সভায় যোগদান করুন এবং কার্যবিবরণী অস্বীকার করুন।
  - ★ আলাপ করুন।

অনুলিপি: ১। প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, পাউবো, ঢাকা।

২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পওর সার্কেল, পাউবো, ঢাকা।

৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, নরসিংদী পওর বিভাগ, পাউবো, নরসিংদী।

৪। সোলায়মান মোল্লা, ঝাউয়াকান্দি, শিবপুর, নরসিংদী।

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| তারিখ: ১১/০৬/২০১৭                               | তারিখ: ১১/০৬/২০১৭ |
| ★ প্রধান প্রকৌশলী (সার্কেল/উপ-বিঃ প্রকৌশল/সিটে) | ★ অতি প্রতীক/অতি  |
| ★ কবিবা/ ডিআইন/মনিটরিং/ পরিচালনা                | ★ অসহকারী         |
| ★ সিটি প্রকৌশল/উপ-বিঃ প্রকৌশল/অতি/প্রকৌশল       | ★ অসহকারী/অসহকারী |
| ★ উপ-সচিব (পূর্ব/পশ্চিম)                        | ★ অসহকারী/অসহকারী |
| ★ উপ-সচিব প্রশাসন                               | ★ অসহকারী/অসহকারী |
| ★ অতিপ্রতীক/অতি                                 | ★ অসহকারী/অসহকারী |

১৯৭১-৭২ / ১৯৭১-৭২

১৯৭১-৭২ / ১৯৭১-৭২

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| ডায়েরী নং ১৯৭১-৭২ তারিখ ১৯/০৬/৭১ |                              |
| নিঃ প্রঃ ঢাকা-১/ঢাকা-২/           | আলাপ করুন                    |
| মহানগরী পরিচালক (প্রঃ)            | জাতি জরুরী/জরুরী             |
| সহকারী প্রকৌশলী                   | মতামত দিন/প্রতিবেদন দিন      |
| উপ-সহকারী প্রকৌশলী                | প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন     |
| উচ্চমান সহকারী                    | পূর্ব সূত্রসহ নথিতে পেশ করুন |
| উচ্চমান সহকারী                    | নথিতে রাখুন/তদারকি দিন       |
| উচ্চমান সহকারী                    | তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী       |

১৯৭১/৭২

ডায়েরী নং ১৯৭১-৭২ তারিখ ১৯/০৬/৭১

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| উপঃ নিঃ প্রঃ ঢাকা-১/ঢাকা-২/ | জরুরী         |
| মহানগরী পরিচালক (প্রঃ)      | প্রতিবেদন দিন |
| সহকারী প্রকৌশলী             | আলাপ করুন     |
| উপ-সহকারী প্রকৌশলী          | মতামত দিন     |
| উচ্চমান সহকারী              | ব্যবস্থা নিন  |
| উচ্চমান সহকারী              | নথিতে দিন     |
| উচ্চমান সহকারী              | নথিতে রাখুন   |

১৯৭১-৭২



ফর্ম: ২৭৬/১৮৮৪

তারিখ: ১১/০৬/১৯

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| ডায়েরী নং: ৭২৮ তারিখ: ১১/০৬/১৯ |                              |
| নিঃ প্রঃ সাক্ষী: ১/মাক্স-২/     | আলাপ করুন                    |
| সহকারী পরিচালক (এ১)             | অতিথি কর্তৃক জরুরী           |
| সহকারী প্রকৌশলী                 | প্রতিবেদন দিন/প্রতিবেদন দিন  |
| উপ-সহকারী প্রকৌশলী              | প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন     |
| উচ্চমান সহকারী                  | পূর্ব সূত্রসহ নথিতে পেশ করুন |
| উচ্চতর হিসাব সহকারী             | নথিতে রাখুন/সমাপনা দিন       |
| উপ-সহকারী প্রকৌশলী              |                              |
| উপ-সহকারী প্রকৌশলী              | অন্যান্য প্রকৌশলী            |

ডায়েরী নং: ১২৭৬ তারিখ: ০৮/০৮/১৯

উপঃ প্রঃ সাক্ষী: ১/মাক্স-২/ জরুরী  
সহকারী প্রকৌশলী প্রতিবেদন দিন  
প্রকৌশলী আলাপ করুন  
সহকারী প্রকৌশলী নথি দিন  
সহকারী প্রকৌশলী ব্যবস্থা নিন  
উচ্চমান সহকারী নথিতে দিন  
ক্যান্সার নথিতে রাখুন  
রাজস্ব সার্ভিসার

নির্বাহী প্রকৌশলী  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
০৮/০৮/১৯



বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ  
Bangladesh Parliament

সংসদ সদস্য-৩  
জাহিরুল হক ভূঞা মোহন  
সংসদ সদস্য  
২০১ নরসিংদী-৩  
সদস্য, সরকারী হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি  
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ডিও নং-বাজাসস/নর-০৩/২০১৯-২৮

তারিখঃ ২৭.০৩.২০১৯ইং

বিষয় : “নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প” এর অধীনে নরসিংদী পওর বিভাগ, বাপাউবো, নরসিংদী কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ২০টি পাইপ আউটলেট এর মধ্যে ০৫টি পাইপ আউটলেট এর নির্মাণ কাজ চলমান রেখে বাকী ১৫টি আউটলেট এর নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন না করা প্রসঙ্গে।

জন্মাব,

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বর্ণিত প্রকল্পের অধীনে নরসিংদী পওর বিভাগ, বাপাউবো, নরসিংদী কর্তৃক বএচ তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় পানি নিষ্কাশনের নিমিত্তে উল্লেখিত প্রকল্পের আওতায় ২০টি পাইপ আউটলেট নির্মাণ কাজের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই ২০টি পাইপ আউটলেটের মধ্যে ০৫টি পাইপ আউটলেটের নির্মাণ কাজ চলমান আছে এবং মাঠ পর্যায়ের নিষ্কাশন ব্যবস্থা সচল রাখার স্বার্থে উক্ত ০৫টি পাইপ আউটলেট নির্মাণ প্রয়োজন। কিন্তু অবশিষ্ট ১৫টি পাইপ আউটলেট নির্মাণের বিষয়ে জনগনের ঘোর আপত্তি আছে এবং উক্ত ১৫টি পাইপ আউটলেট নির্মাণের মাধ্যমে কোন নিষ্কাশন সুবিধা আসবে না। এমতাবস্থায় বর্তমানে মাঠ পর্যায়ের কথা বিবেচনায় রেখে এবং জনগনের আপত্তির প্রেক্ষিতে ১৫টি পাইপ আউটলেট এর নির্মাণ না করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।


প্রতি,

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ঢাকা।

ধন্যবাদান্তে,

  
জাহিরুল হক ভূঞা মোহন  
সংসদ সদস্য  
২০১ নরসিংদী-৩  
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

অনুলিপি :-

১. প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা।
২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা পওর সার্কেল, বাপাউবো, ঢাকা।
৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, নরসিংদী পওর বিভাগ, বাপাউবো, নরসিংদী।

মোবাইল: ০১৭১১৫২৬৭৭৪, ফোন: ০২-৪৭২১০৮০৮ (বাসা)

E-mail: mpnarsingchi3@gmail.com, md@bbrthersgroup.net, Web: www.bbrthersgroup.net



M-42853-(10)

6622 02/02/2017

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH  
HIGH COURT DIVISION  
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)  
WRIT PETITION NO. 833 of 2017

The 25<sup>th</sup> day of January, in the year of two thousand Seventeen.

Present:

Ms. Justice Naima Haider.

And

Mr. Justice Abu Taher Md. Saifur Rahman.

IN THE MATTER OF:

Md. Halimuzzaman son of Afsar Uddin Bhuiyan of Village- Ghasirdia Police Station- Shibpur and District- Narsingdi and others.....Petitioners.

Versus-

Government of Bangladesh represented by the Secretary, Ministry of Water Resources, Secretariat Building, Shahbagh, Dhaka-1000 and others.

.....Respondents.

To

1. Government of Bangladesh represented by the Secretary, Ministry of Water Resources, Secretariat Building, Shahbagh, Dhaka-1000.
2. Director General, Bangladesh Water Development Board (BWDB), Wapda Bhaban (2<sup>nd</sup> Floor), Motijheel C/A, Dhaka-1000.
3. The Chief Engineer, Central Zone, Bangladesh Water Development Board (BWDB), BWDB Elite House, 54, Motijheel C/A, Dhaka-1000.
4. The Deputy Commissioner, Narsingdi, Collectorate Building, Narsingdi.
5. The Assistant Deputy Commissioner (Revenue), Narsingdi, Collectorate Building, Narsingdi.
6. The Executive Engineer, Narsingdi O & M Division, Bangladesh Water Development Board (BWDB), Narsingdi.
7. The Assistant Engineer, Bangladesh Water Development Board (BWDB), Narsingdi.
8. Upazilla Nirbahi Officer, Shibpur Police Station- Shibpur, District- Narsingdi.
9. Upazilla Engineer, Shibpur, Bangladesh Water Development Board (BWDB), Police Station- Shibpur, District- Narsingdi.

Whereas the petition abovementioned has been preferred by the petitioner above named to this Court against: An illegal attempt of the Respondents for evicting the petitioners from their own agricultural land as scheduled herein below in Schedule Nos. 1-1522, without any due process of law as well as without giving him any prior notice, just on the plea of embankment of the "Paharia river", Shibpur, Narsingdi and Enforcement of the fundamental rights guaranteed under Articles 27, 31 and 42(1) of the Constitution of Bangladesh.

Now upon hearing Mr. A.K.M. Jagul Haider Afrie, Advocate, For the Petitioner and Mr. Md. Mokleshur Rahman, D.A.G. with Mr. Samarendra Nath Biswas, AAG Ms. Farida Yeasmin, AAG for the Respondents and upon consideration of the said petition this Court doth order and do issue a Rule Nisi calling upon you the aforesaid respondents to show cause on or before the 22<sup>nd</sup> February, 2017 as to why the impugned illegal attempt of the Respondents for evicting the petitioners from own agricultural land as described in Schedule Nos. 1-11, without any due process of law as well as without giving him any prior notice, just on the plea of embankment of the "Paharia river", Shibpur, Narsingdi should not be declared to have been made illegally, mala fide and without lawful authority and is of no legal effect and why they should not be directed not to evict the petitioner from the scheduled case-land without due process of law and/or pass such other or further order or orders as to this Court may seem fit and proper.

Pending hearing of the Rule, respondents are restrained by an order of injunction from evicting the petitioners from their own agricultural land as described in Schedule Nos. 1-11, by excavating the same without due process of law.

The petitioner is directed to put in requisites for service of notice upon the respondents through registered post and in usual course.

Witness Mr. Justice Surendra Kumar Sinha, the Hon'ble Chief Justice of Bangladesh at on the 25<sup>th</sup> day of January, two thousand Seventeen.

Superintendent

Assistant Registrar

Type by: A. Amin: 13.02.2017.

Read by:

Exm. by:

Readied by:

13.2.17



IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH  
HIGH COURT DIVISION  
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)  
WRIT PETITION NO. 538 of 2017.

The 17<sup>th</sup> day of January, in the year of two thousand Seventeen.

Present:

Ms. Justice Natma Haider.

And

Mr. Justice Abu Taher Md. Saifur Rahman.

IN THE MATTER OF

Musleh-Uddin son of late Abdul Zabbar Afrad of Village- Banderdia Police Station- Shibpur and District- Narsingdi and others.

Petitioners

Versus

Government of Bangladesh represented by the Secretary, Ministry of Water Resources, Secretariat Building, Shahbagh, Dhaka-1000 and others.

Respondents.

1. Government of Bangladesh represented by the Secretary, Ministry of Water Resources, Secretariat Building, Shahbagh, Dhaka-1000.
2. Director General, Bangladesh Water Development Board (BWDB), Wapda Bhaban (2<sup>nd</sup> Floor), Motijheel C/A, Dhaka-1000.
3. The Chief Engineer, Central Zone, Bangladesh Water Development Board (BWDB), BWDB Elite House, 54, Motijheel C/A, Dhaka-1000.
4. The Deputy Commissioner, Narsingdi, Collectorat Building, Narsingdi.
5. The Assistant Deputy Commissioner (Revenue), Narsingdi, Collectorat Building, Narsingdi.
6. The Executive Engineer, Narsingdi O & M Division, Bangladesh Water Development Board (BWDB), Narsingdi.
7. The Assistant Engineer, Bangladesh Water Development Board (BWDB), Narsingdi.
8. Upazilla Nababi Officer, Shibpur Police Station- Shibpur, District- Narsingdi.
9. Upazilla Engineer, Shibpur, Bangladesh Water Development Board (BWDB), Police Station- Shibpur, District- Narsingdi.

Whereas the petition abovementioned has been preferred by the petitioner above named to this Court against: An illegal attempt of the Respondents for evicting the petitioners from their own agricultural land as scheduled herein below in Schedule Nos. 1-11, without any due process of law as well as without giving him any prior notice, just on the plea of embankment of the "Paharia river", Shibpur, Narsingdi and Enforcement of the Fundamental rights guaranteed under Articles 27, 31 and 32(1) of the Constitution of Bangladesh.

Now upon hearing Mr. A.K.M. Jaghut Haider Afrid, Advocate For the Petitioner and Mr. Md. Moklesur Rahman, D.A.G. with Mr. Samarendra Nath Biswas, AAG Ms. Farida Yeasmin, AAG for the Respondents and upon consideration of the said petition this Court doth order and do issue a Rule Not calling upon you the aforesaid respondents to show cause within 7(seven) days from the date of the received notices as to why the impugned illegal attempt of the Respondents for evicting the petitioners from own agricultural land as described in Schedule Nos. 1-11, without any due process of law as well as without giving him any prior notice, just on the plea of embankment of the "Paharia river", Shibpur, Narsingdi should not be declared to have been made illegally, malafide and without legal authority and is of no legal effect and why they should not be directed not to evict the petitioner from the scheduled case land without due process of law and/or pass such other or further order or orders as to this Court may seem fit and proper.

Pending hearing of the Rule, the parties are directed to maintain status-quo in respect of possession and position for a period of 6 (six) months from date.

In the meantime, the respondents are further directed not to evict the petitioners from their own agricultural land without due process of law.

The petitioner is directed to put in requisites for service of notice upon the respondents through registered post and in usual course.

Witness Mr. Justice Surendra Kumar Sinha, the Hon'ble Chief Justice of Bangladesh at on the day of January, two thousand Seventeen.

Superintendent

13.2.17

Assistant Registrar

13.2.17

13.02.2017



IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH  
HIGH COURT DIVISION  
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)  
WRIT PETITION NO. 538 of 2017

The 17<sup>th</sup> day of January, in the year of two thousand Seventeen.

Present:

Mr. Justice Naima Haider.

And

Mr. Justice Abu Taher Md. Saifur Rahman.

IN THE MATTER OF

Musleh Uddin son of late Abdul Zabbar Afrad of Village- Banderdia Police Station- Shibpur and District- Narsingdi and others.

Petitioners.

Versus-

Government of Bangladesh represented by the Secretary, Ministry of Water Resources, Secretariat Building, Shahbagh, Dhaka-1000 and others.

Respondents.

1. Government of Bangladesh represented by the Secretary, Ministry of Water Resources, Secretariat Building, Shahbagh, Dhaka-1000.
2. Director General, Bangladesh Water Development Board (BWDB), Wapda Bhaban (2<sup>nd</sup> Floor), Motijheel C/A, Dhaka-1000.
3. The Chief Engineer, Central Zone, Bangladesh Water Development Board (BWDB), BWDB Elite House, 54, Motijheel C/A, Dhaka-1000.
4. The Deputy Commissioner, Narsingdi, Collectoret Building, Narsingdi.
5. The Assistant Deputy Commissioner (Revenue), Narsingdi, Collectoret Building, Narsingdi.
6. The Executive Engineer, Narsingdi O & M Division, Bangladesh Water Development Board (BWDB), Narsingdi.
7. The Assistant Engineer, Bangladesh Water Development Board (BWDB), Narsingdi.
8. Upazilla Nirbahi Officer, Shibpur Police Station- Shibpur, District- Narsingdi.
9. Upazilla Engineer, Shibpur, Bangladesh Water Development Board (BWDB), Police Station- Shibpur, District- Narsingdi.

Whereas the petition abovementioned has been preferred by the petitioner above named to this Court against: An illegal attempt of the Respondents for evicting the petitioners from their own agricultural land as scheduled herein below in: Schedule Nos. 1-11, without any due process of law as well as without giving him any prior notice, just on the plea of embankment of the "Paharia river", Shibpur, Narsingdi and Enforcement of the fundamental rights guaranteed under Articles 27, 31 and 32(1) of the Constitution of Bangladesh.

Now upon hearing Mr. A.K.M. Jaglal Haider Afrid, Advocate for the Petitioner and Mr. Md. Moklesur Rahman, D.A.G. with Mr. Samarendra Nath Biswas, AAG Ms. Farida Yeasmin, AAG for the Respondents and upon consideration of the said petition this Court doth order and do issue a Rule X calling upon you the aforesaid respondents to show cause within 7(seven) days from the date of the received notices as to why the impugned illegal attempt of the Respondents for evicting the petitioners from their own agricultural land as described in Schedule Nos. 1-11, without any due process of law as well as without giving him any prior notice, just on the plea of embankment of the "Paharia river", Shibpur, Narsingdi should not be declared to have been made illegally, mala fide and without legal authority and is of no legal effect and why they should not be directed not to evict the petitioner from the scheduled case land without due process of law and/or pass such other or further order or orders as to this Court may seem fit and proper.

Pending hearing of the Rule, the parties are directed to maintain status-quo in respect of possession and position for a period of 6 (six) months from date.

In the meantime, the respondents are further directed not to evict the petitioners from their own agricultural land without due process of law.

The petitioner is directed to put in requisites for service of notice upon the respondents through registered post and in usual course.

Witness Mr. Justice Surendra Kumar Sinha, the Hon'ble Chief Justice of Bangladesh at on the 17<sup>th</sup> day of January, two thousand Sixteen.

Superintendent

13.2.17

Assistant Registrar

13.2.17

13.02.2017



IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH  
HIGH COURT DIVISION  
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)

WRIT PETITION NO. 115 OF 2018

The 25<sup>th</sup> day of September, in the year of two thousand eighteen.

Present:

Mr. Justice Md. Nazrul Islam Talukder.

And

Mr. Justice K. M. Hafizul Alam.

AND

IN THE MATTER OF:

Md. Fazlul Haque Mridha son of Late Md. Ayes Ali Mridha village- Brahmondi Uta, Post Office- Borokanda- 7620, Police Station- Shibpur, Narsingdi and others.

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| ★ জজ (সহ/অতিরিক্ত আদালত) | ★ জজ (সহ/অতিরিক্ত আদালত) |
| ★ জজ (সহ/অতিরিক্ত আদালত) | ★ জজ (সহ/অতিরিক্ত আদালত) |
| ★ জজ (সহ/অতিরিক্ত আদালত) | ★ জজ (সহ/অতিরিক্ত আদালত) |
| ★ জজ (সহ/অতিরিক্ত আদালত) | ★ জজ (সহ/অতিরিক্ত আদালত) |
| ★ জজ (সহ/অতিরিক্ত আদালত) | ★ জজ (সহ/অতিরিক্ত আদালত) |
| ★ জজ (সহ/অতিরিক্ত আদালত) | ★ জজ (সহ/অতিরিক্ত আদালত) |
| ★ জজ (সহ/অতিরিক্ত আদালত) | ★ জজ (সহ/অতিরিক্ত আদালত) |
| ★ জজ (সহ/অতিরিক্ত আদালত) | ★ জজ (সহ/অতিরিক্ত আদালত) |
| ★ জজ (সহ/অতিরিক্ত আদালত) | ★ জজ (সহ/অতিরিক্ত আদালত) |
| ★ জজ (সহ/অতিরিক্ত আদালত) | ★ জজ (সহ/অতিরিক্ত আদালত) |

Petitioners

VERSUS-

Government of Bangladesh represented by the Secretary, Ministry of Water Resources, Secretariat Building, Shabagh, Dhaka- 1000 and others.

Respondents

Government of Bangladesh represented by the Secretary, Ministry of Water Resources, Secretariat Building, Shabagh, Dhaka- 1000.

Director General, Bangladesh Water Development Board (BWDB), Wapda Bhabari (2<sup>nd</sup> Floor), Motijheel C/A, Dhaka- 1000

The Chief Engineer, Central Zone, Bangladesh Water Development Board (BWDB), BWDB Elite House 84, Motijheel C/A, Dhaka- 1000

The Deputy Commissioner, Narsingdi, Collectorat Building, Narsingdi.

The Assistant Deputy Commissioner (Revenue), Narsingdi, Collectorat Building, Narsingdi.

The Executive Engineer, Narsingdi O & M Division, Bangladesh Water Development Board (BWDB), Narsingdi.

The Assistant Engineer, Bangladesh Water Development Board (BWDB), Narsingdi.

Upazilla Nirbahi Officer, Shibpur, Police Station- Shibpur, District- Narsingdi.

Upazilla Engineer, Shibpur, Bangladesh Water Development Board (BWDB) Police Station- Shibpur, District- Narsingdi.

Whereas the petition above mentioned has been preferred by the petitioner above named to this court against an illegal attempt of the Respondents for evicting the petitioners from their own agricultural land as scheduled herein below in Schedule Nos. i-xiv without any due process of law as well as without giving them any prior notice, just on the plea of embankment of the "Paharia river", Shibpur, Narsingdi. AND Enforcement of the Fundamental rights guaranteed under Articles 27, 31, and 42(1) of the Constitution of Bangladesh.

Now upon hearing, Mr. A.K.M. Jagul Haider Afro, Advocate For the petitioners and Mr. Md. Al-Amin Haider, D.A.G. with Mr. Titus Hillel Rema, A.A.G. with Mr. Md. Mizanur Rahman, A.A.G. and Mrs. Farida Masnin, A.A.G. for the respondents and upon consideration of the said petition this Court doth order and do make a Rule Nisi calling upon you the aforesaid respondents to show cause on or before the 23<sup>rd</sup> day of October, 2018 as to why the impugned illegal attempt of the respondents for evicting the petitioners from their own agricultural lands as described in Schedule Nos. i-xiv without any due process of law as well as without giving them any prior notice, just on the plea of embankment of Paharia River Shibpur, Narsingdi should not be declared to have been made illegal mala fide and without any lawful authority and is of no legal effect and either as to why they should not be directed not to evict the petitioners from the scheduled case land without the process of law and/or pass such other or further order or orders as to this Court may seem fit and proper.

Subject to disposal of the Rule Nisi, the respondents are directed to maintain status-quo respect of the agricultural lands in question as described in schedule Nos. i-xiv, for a period of 06(six) months from date.

The petitioners are directed to put in requisites for service of notices upon the respondents by registered post as well as through usual process within 3(three) working days, failing which the Rule shall stand discharged.

Witnesses: Mr. Justice Syed Mahmud Hossain, the Hon'ble Chief Justice of Bangladesh on this the 25<sup>th</sup> day of September, in the year of two thousand eighteen.

Superintendent  
06-11-18

Assistant Registrar  
06-11-18

by: 06-11-2018

by: 06-11-18

06-11-18



IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH  
HIGH COURT DIVISION  
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)  
WRIT PETITION NO. 7184 of 2018

IN THE MATTER OF:

An application under Article 102 of the Constitution of the People's Republic of Bangladesh.

AND

IN THE MATTER OF:

Abdul Mannan Mridha son of late Abjol Mridha of village – Bhramondi Post Office – Borokanda-1620,  
Police Station – Shibpur, District – Narsingdi and others.

.....Petitioners.

-Versus-

Government of Bangladesh represented by the Secretary, Ministry of Water Resources, Secretariat  
Building, Shabagh, Dhaka-1000 and Others.

.....Respondents.

AND

IN THE MATTER OF:

An illegal attempt of the Respondents for evicting the petitioners from their own agricultural land as  
scheduled herein below in Schedule Nos. i-xiii without any due process of law as well as without giving  
them any prior notice, just on the plea of embankment of the "Paharia river", Shibpur, Narsingdi.

AND

IN THE MATTER OF:

Enforcement of the Fundamental rights guaranteed under Articles 27, 31 and 42(1) of the Constitution of  
the Bangladesh.

Present:

Mr. Justice J. B. M. Hassan.

-And-

Mr. Justice Md. Khairul Alam.

The 19<sup>th</sup> day of November, 2018.

Mr. A.K.M. Jaglul Haider Afie, Advocate

.....For the Petitioner

Let the order of injunction granted earlier by this Court be extended for a further period of 06(six)  
months from the date of expiry.

J. B. M. Hassan.

Md. Khairul Alam.

Copy forwarded to:

1. Government of Bangladesh represented by the Secretary, Ministry of Water Resources,  
Secretariat Building, Shabagh, Dhaka-1000.
  2. Director General, Bangladesh Water Development Board (BWDB), Wapda Bhaban (2<sup>nd</sup> Floor),  
Motijheel C/A, Dhaka-1000.
  3. The Chief Engineer, Central Zone, Bangladesh Water Development Board (BWDB), BWDB  
Elite House, 54, Motijheel C/A, Dhaka-1000.
  4. The Deputy Commissioner, Narsingdi, Collector Building, Narsingdi.
  5. The Assistant Deputy Commissioner (Revenue), Narsingdi, Collectorat Building, Narsingdi.
  6. The Executive Engineer, Narsingdi O & M Division, Bangladesh Water Development Board  
(BWDB), Narsingdi.
  7. The Assistant Engineer, Bangladesh Water Development Board (BWDB), Narsingdi.
  8. Upazilla Nirbahi Officer, Shibpur, Police Station – Shibpur, District – Narsingdi.
  9. Upazilla Engineer, Shibpur, Bangladesh Water Development Board (BWDB), Police Station –  
Shibpur, District – Narsingdi.
- For information and necessary action.

By Order

25

Assistant Registrar

20.1.19

Typed by: Jahir: 20.01.2019

Read by:

Exam by:

Readied by:

Superintendent

20.1.19

20.1.19

2022 09/06/22  
SPIN  
09/06/22



IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH  
HIGH COURT DIVISION  
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)  
WRIT PETITION NO. 9447 OF 2017.

The 24<sup>th</sup> day of July, in the year of two thousand seventeen.

Present:

Ms. Justice Naima Haider

And

Mr. Justice Abu-Taher Md. Saifur Rahman.

IN THE MATTER OF:

\* Abdul Awal Sarker son of Akhtaruzzaman Sarker of village-Bajnah, Bandarcha, Post office- Purnamda,  
1620, Police Station- Shibpur, District Narsingdi and others.

-Versus-

Government of Bangladesh represented by the Secretary, Ministry of Water Resources, Secretariate  
Building, Shabagh, Dhaka-1000 and others.

To,

1. Government of Bangladesh represented by the Secretary, Ministry of Water Resources, Secretariate Building, Shabagh, Dhaka-1000.
2. Director General, Bangladesh Water Development Board (BWDB), Wapda Bhawan (2<sup>nd</sup> Floor), Motijheel C/A, Dhaka-1000.
3. The Chief Engineer, Central Zone, Bangladesh Water Development Board (BWDB), BWDB Elite House, 54, Motijheel C/A, Dhaka -1000.
4. The Deputy Commissioner, Narsingdi, Collectoret Building, Narsingdi.
5. The Additional Deputy Commissioner (Revenue), Narsingdi, Collectoret Building, Narsingdi.
6. The Executive Engineer, Narsingdi O & M Division, Bangladesh Water Development Board (BWDB), Narsingdi.
7. The Assistant Engineer, Bangladesh Water Development Board (BWDB), Narsinadi.
8. Upazilla nirbahi officer, Shibpur, Police Station- Shibpur, district- Narsingdi.
9. Upazilla Engineer, Shibpur, Bangladesh Water Development Board (BWDB) Police Station- Shibpur, District- Narsingdi.

Whereas the petition above mentioned has been preferred by the petitioner above named to this court against an illegal attempt of the Respondents for evicting the petitioners from their own agricultural land as schedule herein below in Schedule Nos. 1 to 16, without any due process of law as well as without giving them any prior notice just on the plea of embankment of the "Paharia river", Shibpur, Narsingdi And Enforcement of the Fundamental rights guaranteed under Articles 27, 31 and 42(1) of the Constitution of Bangladesh.

Now upon hearing Mr. A.K.M. Jagul Haider Afrie, Advocate, for the petitioners and Mr. Md. Mokleshur Rahman, D.A.G with Mr. Samarendra Nath Biswas, AAG with Ms. Farida Yeasmin, AAG, for the respondents and upon consideration of the said petition this Court doth order and do issue a Rule Nisi calling upon you the aforesaid respondents to show cause within 7(seven) days from the date of the received notices, as to why the impugned illegal attempt of the Respondents for evicting the petitioners from their own agricultural land as described in Schedule Nos. 1 to 16 without any due process of law as well as without giving them any prior notice just on the plea of embankment of Paharia River Shibpur, Narsingdi should not be declared to have been made illegally mala fide and without any lawful authority and is of no legal effect and why they should not be directed not to evict the petitioners from the scheduled case land without due process of law and/or pass such other or further order or orders as to this Court may seem fit and proper.

Pending hearing of the Rule, the respondents are restrained by an order of injunction from evicting the petitioners from their own agricultural lands as described in schedule Nos. 1 to 16 by excavating the same for a period of six (six) months from date.

The petitioner is directed to put in requisites for service of notice upon the respondents through registered post and in usual course.

Witnesses: Mr. Justice Surendra Kumar Sinha, the Hon'ble Chief Justice of Bangladesh on this the 24<sup>th</sup> day of July, in the year of two thousand seventeen.

Superintendent



**Rebecca Singha**

L.L.B (Hon's) LL.M

Advocate

Bangladesh Supreme Court

**Court Chamber:**

No. # 306, Supreme Court Bar

Association Building Ramna,

Dhaka-1000

Mobile: 01712751445

Ref:

Date: 09.05.2019

**NOTICE FOR CONTEMPT OF COURT**

**From :**

Rebecca Singha

Advocate

Room No. 306

Supreme Court Bar Association,

Shantagh Dhaka-1000

**FOR AND ON BEHALF OF:**

1. Abdul Aval Sarkar son of Akh aruzzaman Sarkar of village-Bajanb, Bandardia, Post Office- Purandia-1620 Police station- Shibpur, District-Narsingdi;
2. Asad Mulla son of Ali Uddin Mulla of village-Bajanb, Bandardia, Post Office- Purandia-1620 Police station- Shibpur, District-Narsingdi;
3. Md. Faraz Uddin Sarkar son of Late Sahaj Uddin Sarkar of village-Bajanb, Bandardia, Post Office- Purandia-1620 Police station- Shibpur, District-Narsingdi;
4. Nurul Amin Sarkar son of Mohammad Ali of village-Bajanb, Bandardia, Post Office- Purandia-1620 Police station- Shibpur, District-Narsingdi;
5. Md. Faraque Sarkar son of Md. Shajahan Sarkar of village-Bajanb, Bandardia, Post Office- Purandia-1620 Police station- Shibpur, District-Narsingdi;
6. Md. Akram Hossain son of Abdul Aziz of village-Bajanb, Bandardia, Post Office- Purandia-1620 Police station- Shibpur, District-Narsingdi;
7. Md. Faj Uddin son of late Abu Taher of village-Bajanb, Bandardia, Post Office- Purandia-1620 Police station- Shibpur, District-Narsingdi;

*Singha*



**Rebecca Singha**

LL.B (Hons) LL.M

Advocate

Bangladesh Supreme Court

**Court Chamber:**

No. #306, Supreme Court Bar

Association Building, Ramna,

Dhaka-1000

Mobile: 01712761465

Re:

Date: 29.05.2019

8. Safia Begum wife of Md. Mostafa Sarkar of village Bajanb, Bandardia, Post Office- Purandia-1620 Police station- Shibpur, District-Narsingdi;
9. Md. Benjir Ahmed son of Md. Abed Ali of village-Bajanb, Bandardia, Post Office- Purandia-1620 Police station- Shibpur, District-Narsingdi;
10. Md. Rezaul Karim son of Sultan Uddin of village-Bajanb, Bandardia, Post Office- Purandia-1620 Police station- Shibpur, District-Narsingdi;
11. Abdul Gaffar Afrad son of late Azom Ali Afrad of village-Bajanb, Bandardia, Post Office- Purandia-1620 Police station- Shibpur, District-Narsingdi;
12. Md. Asafa Sarkar son of Md. Suruj Ali Sarkar of village-Bajanb, Bandardia, Post Office- Purandia-1620 Police station- Shibpur, District-Narsingdi;
13. Md. Mostafa Sarkar son of Md. Suruj Ali Sarkar of village-Bajanb, Bandardia, Post Office- Purandia-1620 Police station- Shibpur, District-Narsingdi;
14. Md. Lutfar Rahman Sarkar son of Md. Suruj Ali Sarkar of village-Bajanb, Bandardia, Post Office- Purandia-1620 Police station- Shibpur, District-Narsingdi;
15. Shekh Mohammad Solaiman son of late Shekh Md. Sabed Ali of village-Bajanb, Bandardia, Post Office- Purandia-1620 Police station- Shibpur, District-Narsingdi;
16. Anwara wife of Md. Helal Uddin Khan of village-Bajanb, Bandardia, Post Office- Purandia-1620 Police station- Shibpur, District-Narsingdi;

*Singha*



**Rebecca Singha**

LL.B (Hons) LL.M

Advocate

Bangladesh Supreme Court

**Case Number:**

**Case Name:** **Shibpur Water Development Board vs. The State**

**Case No.:** **1214/2017**

**Date:** **12/12/2017**

**Page:** **1**

For

**Case No.:** **1214/2017**

To

1. Farhana Kawnayen, Deputy Commissioner, Narsingdi, Office of the Deputy Commissioner, Narsingdi;
- ✓ 2. Bijoy Indro Chakraborty, Executive Engineer, Water Development Board, Narsingdi;
3. Moonmoon Jahan Liza, Upazila Land Officer, Shibpur, Narsingdi;
4. Humayun Kabir, Upazilla Nirbahi Officer, Upazilla- Shibpur, office of the Upazilla Nirbahi Officer, Narsingdi;
5. Lieutenant Colonel Kismat Hayat, Project Director, Narsingdi Nodi Puno Khanan Project, 24 Engineer Construction Brigade, Dhaka Cantonment;
6. ~~Engr. Md. Akteruzzaman Khan~~, Managing Director, ACURA, Project, 24 Engineer Construction Brigade, Dhaka Cantonment;
7. Engr. Md. Akteruzzaman Khan, Managing Director, ACURA, 231/1 (Ground Floor), south Pirerbag, Kallayanpur, Dhaka-1216

Under the instructions of my above-named clients I am addressing and saying as follows:

1. That my above-named clients have filed a Writ Petition bearing Writ Petition No. 9447/2017 before the Hon'ble High Court Division for restraining the govt. from evicting the petitioners from their own agricultural lands without any due process of law as well as without giving them any prior notice, just on the plea of embankment of the "Paharia River" Shibpur, Narsingdi.

*Singha*



Rebecca Singha  
LL.B Hons LL.M  
Advocate  
Bangladesh Supreme Court

Court Chamber  
No. 404, Supreme Court Bldg  
Rajshahi Bazar, Dhaka  
Dhaka-1000  
Mobile: 01717611339

Date: 04.05.2019

2. That a Division Bench of the Hon'ble High Court Division created to issue a Rule Nisi on 24.07.2017 as follows:

"Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why the impugned illegal attempt of the Respondents for evicting the petitioners from their own agricultural land as described in schedule No. 1 to 16 without any due process of law as well as without giving them any prior notice just on the plea of embankment of the Paharia river, Shibpur should not be declared to have been made illegally mala fide and without any lawful authority and is of no legal effect and why they should not be directed not to evict the petitioners from the scheduled case land without due process of law and/or pass such other or further orders as to this Court may seem fit and proper."

Pending hearing of the Rule, the respondents are restrained by an order of injunction from evicting the petitioners from their own agricultural lands as described in the schedule Nos. 1-16 by excavating the same for a period of 6 (six) months from date.

1. That you have been duly served with the said order of injunction of the Hon'ble High Court Division regarding the case land but unfortunately the Notice Receiver No. 7 along with his employees and machineries most illegally and deliberately trespasses into my client's agricultural land on 27.04.2019 and started work for embankment of Paharia river by cutting the petitioners' agricultural land and dropping the blocks upon the said land violating the order of injunction passed by the Hon'ble High Court Division. My client showed the Notice Receiver No. 7

Singha



**Rebecca Singha**  
LLB (Hon's) LL.M  
Advocate  
Bangladesh Supreme Court

**Court Chamber**  
No. 309, Supreme Court Bar  
Lawrence Building, Dhaka  
Bangladesh  
Phone: 811274143

Date: 09.05.2019

Per:

the Hon'ble High Court's order but it did not show any regards to the said order of injunction, rather told them "আমাদের কাজ হলো

হাইকোর্টের আদেশে কাজ বন্ধ করা যাবে না।"

3. That my clients having news of the said contemptuous acts rushed there and show the injunction order of the Hon'ble High Court Division, the Notice Receiver No. 6 threatens them by saying "সরকারী কাজে বাধা দিলে চাঁদাবাজি, মার্ডার কেইস এর আশামী করব। আমরা সরকারী লোক, তাদের যেন আশে পাশে না দেখি।। আদালতের আদেশ আমাদের কাছে কচু পাতার পানি।"

4. That in that position my clients rushed to you the Notice Receiver No. 5 and 6 to show the Hon'ble High Court's order of injunction but unfortunately you have hurt my clients by saying that "হাইকোর্টের এ সবকিছু আদেশ রেখে দেন, এ সবকিছু আমরা নিয়ে কিছু হবে না, আমরা আমাদের কাজ করব।"

5. That, thereafter my clients went to you the Notice Receivers 1 and 4 requesting them in writing to stop the violation of the Hon'ble court's order of injunction but to no avail as yet rather recently you have deployed Bangladesh Army under control and supervision of the Notice Receiver 5 and 6 under whose supervision the Hon'ble court's order has been being continuously violated by digging aforesaid agricultural Land as well as by destroying the paddy and vegetables crops and dropping Blocks, thereupon and furthermore signboard containing order of

Singha



**Rebecca Singha**

LL.B (Hon's) LL.M

Advocate

Bangladesh Supreme Court

**Court Chamber:**

No. # 396, Supreme Court Bar

Association Building, Ramna

Dhaka-1000

Mobile: 01712761475

Date: 09.08.2019

injunction of the Hon'ble High Court Division has been removed by the Notice Receivers from the case land.

6. That you have most illegally and collusively continuously violating and frustrating the Hon'ble Court's order of injunction by willfully and deliberately showing disregarded and disrespect to the same which tant amounts to the gross contempt of court as well as direct interfere with the administrative Justice by the Hon'ble High Court Division.


In the premises I hereby call upon you to be refrained from violating the Hon'ble Court's aforesaid order of injunction dated 24.07.2017 within 7 days from the date of receipt of this notice failing which I have instructions to take steps to prosecute you for committing contempt of court.


*Singha*

(Rebecca Singha)

Advocate

Supreme Court of Bangladesh



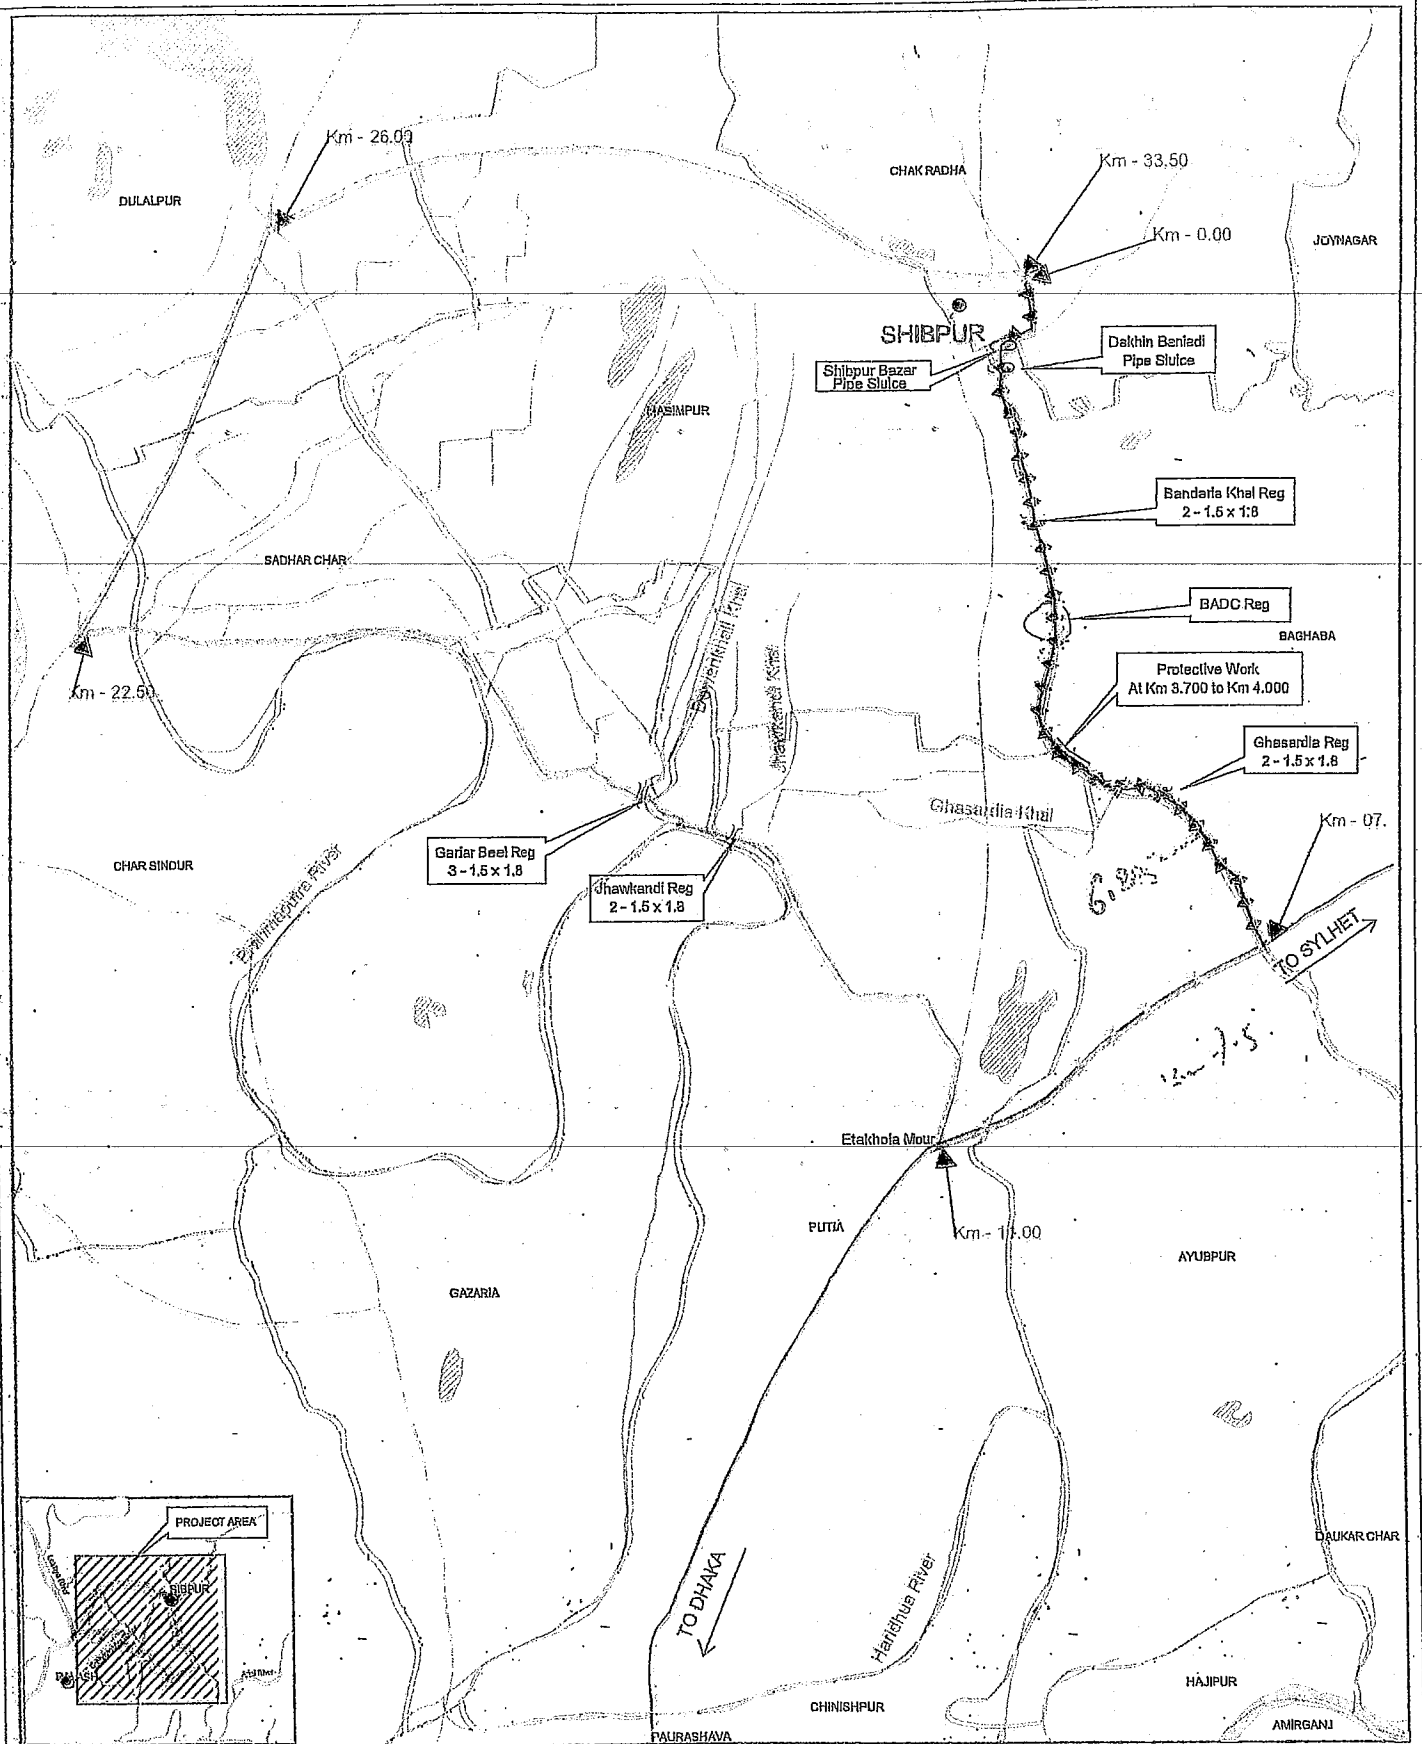

**Legend**

|  |                 |  |                  |
|--|-----------------|--|------------------|
|  | Regulator       |  | Project Boundary |
|  | Existing        |  | Embankment.shp   |
|  | Proposed        |  | Roads            |
|  | Culvert         |  | National Highway |
|  | Pipe Sluice     |  | Regional Highway |
|  | Protective Work |  | Beels            |
|  | River/khal      |  |                  |
|  | Union Boundary  |  |                  |

**Shibpur Flood Control Drainage and Irrigation Project**  
under Shibpur Upazila in Narshingdi District









বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ  
Bangladesh Parliament

জহিরুল হক

সদস্য, সরকারী হিসাব সঞ্চয়  
বাংলা

৫০০

৫০০-২  
হন  
দস্য  
১-৩  
মিটি  
সেদ

ডিও নং-বাজাসস/নর-০৩/২০১৯-২৮

তারিখঃ ২৭.০৭

বিষয়ঃ “নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প” এর অধীনে নরসিংদী পওর বিভাগ, বাপাউবো, নরসিংদী কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য ২০টি পাইপ আউটলেট এর মধ্যে ০৫টি পাইপ আউটলেট এর নির্মাণ কাজ চলমান রেখে বাকী ১৫টি আউটলেট এর নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন না করা প্রসঙ্গে।

জনাব,

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বর্ণিত প্রকল্পের অধীনে নরসিংদী পওর বিভাগ, বাপাউবো, নরসিংদী কর্তৃক বএচ তে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় পানি নিষ্কাশনের নিমিত্তে উল্লেখিত প্রকল্পের আওতায় ২০টি পাইপ আউটলেট নির্মাণ কাজের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এই ২০টি পাইপ আউটলেটের মধ্যে ০৫টি পাইপ আউটলেটের নির্মাণ কাজ চলমান আছে এবং মাঠ পর্যায়ের নিষ্কাশন ব্যবস্থা সচল রাখার স্বার্থে উক্ত ০৫টি পাইপ আউটলেট নির্মাণ প্রয়োজন। কিন্তু অবশিষ্ট ১৫টি পাইপ আউটলেট নির্মাণের বিষয়ে জনগণের ঘোর আপত্তি আছে এবং উক্ত ১৫টি পাইপ আউটলেট নির্মাণের মাধ্যমে কোন নিষ্কাশন সুবিধা আসবে না। এমতাবস্থায় বর্তমানে মাঠ পর্যায়ের কথা বিবেচনায় রেখে এবং জনগণের আপত্তির প্রেক্ষিতে ১৫টি পাইপ আউটলেট এর নির্মাণ না করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

প্রতি,

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ঢাকা।

ধন্যবাদান্তে,

জহিরুল হক ভূঞা মোহন  
সংসদ-সদস্য  
২০১ নরসিংদী-৩  
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

অনুলিপি :-

১. প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা।

২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা পওর সার্কেল, বাপাউবো, ঢাকা।

৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, নরসিংদী পওর বিভাগ, বাপাউবো, নরসিংদী।

ডায়েরী নং ৫২২৮/৩ তারিখ ০৮/০৮/১৯  
উপঃ বিঃ প্রকৌশলী, নরসিংদী, রূপগঞ্জ জরুরী  
সহকারী প্রকৌশলী প্রতিবেদন, দিন  
প্রাঙ্গণনিক আলোপ করণ  
সহঃ রাজস্ব কর্মকর্তা মন্তব্য দিন  
সহকারী হিসাব রক্ষক ব্যবস্থাপ নিম  
উচ্চমান সহকারী নথিতে দিন  
ক্যাশিয়ার নথিতে রাখুন  
রাজস্ব সার্ভেয়ার

মোবাইল: ০১৭১১৫২৬৭৭৪, ফোন: ০২-৪৭২১০৮০৮ (বাসা)

E-mail: mpnarsingdhi.3@gmail.com, md@bbrothersgroup.net, Web: www.bbrothersgroup.net

নির্বাহী প্রকৌশলী

নরসিংদী পওর বিভাগ

বাপাউবো, নরসিংদী।





মোঃ সি

Enclosure

১০০  
লাম মোল্লা  
সংসদ সদস্য  
দী-৩ (শিবপুর)  
স্থায়ী কমিটি

সদস্য, রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্প

ডিও নং : জ.স.স.২০১/নর-৩/পাউবো/০১

তারিখ : ১১/০৬/২০

মহাপরিচালক

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ঢাকা।

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ডায়েরী নং- ৪৬২৮                                                                                                                                                                                                                          | তারিখ- ১৪/৬/২০                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>★ ডাঃ (সকল/ময়মনসিংহ সার্কেল)</li> <li>★ এঃ পরিচালক (পিএমও)</li> <li>★ সিঃ প্রকৌঃ</li> <li>★ সিঃ এঃ (পূঃ)/উপ-বিঃ প্রঃ/সহঃ প্রকৌঃ</li> <li>★ উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক</li> <li>★ প্রকৌঃ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ অতি জরুরী/জরুরী</li> <li>★ অসোচ্চ কক্ষ/সহকারী</li> <li>★ প্রতিবেদন দিন</li> <li>★ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দিন</li> <li>★ পুনঃনির্বাচন করে পেশ করুন</li> <li>★ অতিরিক্ত/অতিরিক্ত দিন</li> </ul> |

বিষয়ঃ- শিবপুর উপজেলার ঝাউয়াকান্দি মৌজার ভূজুনী বিলের প্রান্তিক কৃষকদের ব্যক্তি মালিকানাধীন ফসলি জমির উপর দিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ড, নরসিংদী বিভাগ কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতীত খাল খনন কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য।

প্রিয় মহোদয়,

উপরোল্লিখিত বিষয়ের আলোকে আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ০৩/০৬/২০১৭ ইং তারিখ আমি বর্ণিত এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক জানতে পারলাম যে, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নরসিংদী বিভাগীয় অফিস ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতীত ঝাউয়াকান্দি মৌজার ভূজুনী বিলের প্রান্তিক কৃষকদের ব্যক্তি মালিকানাধীন ফসলি জমির উপর দিয়া প্রায় ৫০ ফুট প্রস্থ ও প্রায় ১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য খাল খনন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। যাহা এলাকার জনগনকে পূর্বহতে অবগত করা হয়নি এহনও খাল খনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হলে একধিকে ফসলি জমি নষ্ট হবে অপর দিকে সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক কৃষকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এমনকি অনেকে ফসলি জমি হারা হয়ে নিঃস্বঃ হয়ে যাবে। জনস্বার্থে এই খাল খনন কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হলো।

অবশ্য বর্তমানে নকশা অনুযায়ী বিদ্যমান খালটি খননে জনগনের কোন আপত্তি নেই।

ধন্যবাদান্তে,

আপনার একান্ত

(মোঃ সিরাজুল ইসলাম মোল্লা)

সংসদ সদস্য

২০১- নরসিংদী-৩

...../মপ তারিখঃ.....  
১। অমপ (পূঃ/পাট/পরি/প্রশাসন/অর্থ)/ প্রধান (পরি/অর্থ)

২। .....  
★ অনুমতি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।

★ বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিন।

★ পত্রের মর্মানুসারে প্রতিবেদন পেশ করুন।

★ পরীক্ষা করে পেশ করুন।

★ তদন্ত করে যাকামত সহ প্রতিবেদন দিন।

★ সভায় যোগদান করুন এবং কার্যবিবরণী অস্বীকৃত করুন

★ আলাপ করুন।

অনুলিপি: ১। প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, পাউবো, ঢাকা।

২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পওর সার্কেল, পাউবো, ঢাকা।

৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, নরসিংদী পওর বিভাগ, পাউবো, নরসিংদী।

৪। সোলায়মান মোল্লা, ঝাউয়াকান্দি, শিবপুর, নরসিংদী।

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ডায়েরী নং- ৪৬২৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | তারিখ- ১৪/৬/২০                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>★ প্রধান প্রকৌশলী (ঢাকা/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/সিট)</li> <li>★ কাবিখা/ ডিজাইন/ মনিটরিং/ পরিকল্পনা</li> <li>★ সিডি এসপি-৪/ওয়ারিং/হাওর/গওর/যাহির/জামা</li> <li>★ সচিব, পাউবো, ঢাকা</li> <li>★ পরিচালক (ভূগোলা)/কার্যক্রম/ পওর</li> <li>★ উপ-সচিব (পূঃ/বিঃ)</li> <li>★ উপ-সচিব প্রশাসন</li> <li>★ ব্যক্তিগত সহকারী</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>★ অতি জরুরী</li> <li>★ জরুরী</li> <li>★ আলাপ করুন</li> <li>★ সহকারী</li> <li>★ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দিন</li> <li>★ পূর্বের মত পেশ করুন</li> <li>★ নথিতে রাখুন</li> <li>★ জগায়া দিন</li> </ul> |

অতিঃ মহাপরিচালক (পূঃ/বিঃ)

১৪৩৬/১৪৩৭  
তার ২২/০৬/১৭

| তারিখ নং                 | তারিখ :                      |
|--------------------------|------------------------------|
| নিম্ন প্রঃ প্রঃ-১/৩৩৩-২/ | আগাম করণ                     |
| মহাসচিব/আমিরগঞ্জ/আমির    | অতি অগ্রসর/অগ্রসর            |
| সহকারী পরিচালক (প্রঃ)    | মতামত দিন/প্রতিবেদন দিন      |
| সহকারী প্রকৌশলী          | প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দিন     |
| উপসহকারী প্রকৌশলী        | পূর্ণ বৃত্তান্ত নথিতে পেশ কর |
| উচ্চমান সহকারী           | নথিতে প্রাপ্ত/অগ্রসর দিন     |
| উপসচিব হিসাব সহকারী      | আগাম দিন                     |
| প্রকৌশলী মার্কেটার       |                              |
| মার্কিট সহকারী/প্রকৌশলী  |                              |
| মিলিটারি কমান্ড          | প্রকৌশলী                     |

তারিখ নং ২০৭৫ ২৬/০৭/০৭

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| উপঃ বিঃ প্রকৌশলী, মুরসিংদা, রূপগঞ্জ | অগ্রসর        |
| সহকারী প্রকৌশলী                     | প্রতিবেদন দিন |
| প্রকৌশলী                            | আগাম করণ      |
| সহকারী হিসাব রক্ষক                  | মতামত দিন     |
| উচ্চমান সহকারী                      | ব্যবস্থা দিন  |
| ক্যাশিয়ার                          | নথিতে দিন     |
| রাজঃ সার্ভেয়ার                     | নথিতে রাখুন   |

মির্জা প্রকৌশলী  
মুরসিংদা পত্তন বিভাগ  
পাউবো, মুরসিংদা।  
২৬/০৭/০৭



বাংলাদেশ জাতীয় স  
Bangladesh Parlia

জহিরুল হক ভূঞা মোহন  
সংসদ সদস্য  
২০১ নরসিংদী-৩  
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

সূত্র নংঃ- ডিওনং-বাজাসস/নর-৩/২০১৯-১৫

তারিখঃ ২৩-০২-২০১৯ ইং

বিষয়ঃ “নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প” এর অধীনে শিবপুর উপজেলার অর্ন্তগত খইরা মৌজা এর আওতায় গড়িয়ারবিল ব্রীজ এর নিকটে দেওয়ানখালী হতে আতরহাটি বিল পর্যন্ত ফুলতলা খালের প্রান্তিক কৃষক/ব্যক্তি মালিকধীন ফসলী জমির উপর দিয়া নরসিংদী পওর বিভাগ, বাপাউবো, নরসিংদী কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণকৃত ব্যতিত খাল খনন কার্যক্রম বন্ধ করণ প্রসঙ্গে।

জনাব,

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৫-০২-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ আমি বর্ণিত এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক জানতে পারলাম যে, বর্ণিত প্রকল্পের অধীনে নরসিংদী পওর বিভাগ, বাপাউবো, নরসিংদী কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতিত খইরা মৌজা এর আওতায় গড়িয়ারবিল ব্রীজ এর নিকটে দেওয়ানখালী হতে আতরহাটি বিল পর্যন্ত প্রান্তিক কৃষকদের ব্যক্তিমালিকানা ফসলী জমির উপর দিয়া প্রায় ১০.০০মিঃ প্রস্থ ও প্রায় ৩.৫০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ফুলতলা খাল খনন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যা এলাকার জনগনকে পূর্ব হতে অবগত করা হয়নি। উল্লেখিত ফুলতলা খাল খনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হলে একদিকে ফসলী জমি নষ্ট হবে অপর দিকে সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক কৃষকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এমনকি অনেকে ফসলী জমি হারা হয়ে নিঃস্ব হয়ে যাবে। জনস্বার্থে এই খাল খনন কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

প্রতি,  
মহা পরিচালক  
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড  
ঢাকা।

- ১। অমপ (পূর্ব/পশ্চি/পরি/প্রশাসন/অর্থ)/ প্রধান (পরি/মনি)  
২।  
\* অনুশিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।  
\* বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিন।  
\* পত্রের মর্মার্থসমূহ প্রতিবেদন পেশ করুন।  
\* পরীক্ষা করে পেশ করুন।  
\* তদন্ত করে যথাযথ সুস্থ প্রতিবেদন দিন।  
\* সড়ক যোগাযোগ প্রকল্প প্রকল্প কার্যক্রমের উপর প্রভাবিত করুন।  
\* প্রাপ্তিঃ ১৯/০২/১৯

ধন্যবাদান্তে,

জহিরুল হক ভূঞা মোহন  
সংসদ-সদস্য  
২০১ নরসিংদী-৩  
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

অনুলিপি :-

১. প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা।
২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা পওর সার্কেল, বাপাউবো, ঢাকা।
৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, নরসিংদী পওর সার্কেল, বাপাউবো, নরসিংদী।

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| * ডি. প্রঃ (ঢাকা/সারসংক্ষেপ/সংকেল)    | * উক্তি জরুরী / জরুরী         |
| * এঃ পরিচালক (পেএমও)                  | * আপোচনা করন / প্রাপ্তি দিন   |
| * নিঃ প্রকৌ.....                      | * প্রতিবেদন দিন               |
| * নিঃ প্রঃ (পূঃ)/উঃ বিঃ প্রঃ/সঃ প্রকৌ | * প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন    |
| * উপ-পরিচালক / সহকারী পরিচালক         | * পূর্বসূত্রসহ নথিতে পেশ করুন |
| * প্রাক্কলনিক                         | * নথিতে রাখুন / জমা দিন       |
| * মিলিত কার্য                         | * প্রধান প্রকৌশলী/ প্রঃ প্রঃ  |

|                                                              |                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ১. প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা।         | ২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা পওর সার্কেল, বাপাউবো, ঢাকা। |
| ৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, নরসিংদী পওর সার্কেল, বাপাউবো, নরসিংদী। | ৪. উপ-পরিচালক / সহকারী পরিচালক, বাপাউবো, নরসিংদী।           |
| ৫. প্রকৌশলী, নরসিংদী পওর সার্কেল, বাপাউবো, নরসিংদী।          | ৬. প্রকৌশলী, নরসিংদী পওর সার্কেল, বাপাউবো, নরসিংদী।         |
| ৭. প্রকৌশলী, নরসিংদী পওর সার্কেল, বাপাউবো, নরসিংদী।          | ৮. প্রকৌশলী, নরসিংদী পওর সার্কেল, বাপাউবো, নরসিংদী।         |
| ৯. প্রকৌশলী, নরসিংদী পওর সার্কেল, বাপাউবো, নরসিংদী।          | ১০. প্রকৌশলী, নরসিংদী পওর সার্কেল, বাপাউবো, নরসিংদী।        |

৬২৭.২৭৬ / ১৭৭২৪

২৭৭  
১৯/১০/১৯৭১

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| জারেরী নং ১২৬৮ তারিখ ১৯/১০/৭১ |                              |
| নিঃ প্রঃ নং-১/১০১৯-২/         | আমোগ করণ                     |
| নরসিংদী/মাদারিগঞ্জ/মাজিরা     | অতি জরুরী/জরুরী              |
| সহকারী পরিচালক (প্রঃ)         | মতামত দিন/প্রতিবেদন দিন      |
| সহকারী প্রকৌশলী               | প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন     |
| উপ-সহকারী প্রকৌশলী            | পূর্ব সূত্রসহ নথিতে পেশ করুন |
| উচ্চমান সহকারী                | নথিতে রাখুন/তদাদি দিন        |
| উচ্চমান হিসাব সহকারী          |                              |
| নির্বাহী প্রকৌশলী             |                              |
| ১৯/১০/৭১                      | তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী       |

১৯/১০/৭১

জারেরী নং ১২২২ তারিখ ০৮/০৮/৭১

উপঃ বিঃ প্রঃ নং-১/১০১৯-২/ জরুরী  
সহকারী প্রকৌশলী প্রতিবেদন দিন  
প্রকৌশলী আমোগ করণ  
সহকারী প্রকৌশলী মতামত দিন  
সহকারী হিসাব প্রকৌশলী ব্যবস্থা নিন  
উচ্চমান সহকারী নথিতে দিন  
কার্যনির্বাহী নথিতে রাখুন  
রাজস্ব সচিবালয়

নির্বাহী প্রকৌশলী

নরসিংদী পত্তর বিভাগ

পাউন্স, নরসিংদী।

০৮/০৮/৭১

হিরুল হক ভূঞা মোহন  
সংসদ সদস্য  
২০১ নরসিংদী- ৩  
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

সূত্র নংঃ- ডিওনং-বাজাসস/নর-৩/২০১৯-১৬

তারিখঃ ২৩-০২-২০১৯ ইং

বিষয়ঃ “নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প” এর অধীনে শিবপুর উপজেলার অন্তর্গত শেরপুর ও পুটিয়া মৌজা এর আওতায় মদিনা জুট মিল হতে পাটুয়ারপাড় শেরপুর হাড়িদোয়া নদী পর্যন্ত খালের প্রান্তিক কৃষক/ব্যক্তি মালিকাদ্বীন ফসলী জমির উপর দিয়া নরসিংদী পওর বিভাগ, বাপাউবো, নরসিংদী কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণকৃত ব্যতিত খাল খনন কার্যক্রম বন্ধ করণ প্রসঙ্গে।

জনাব,

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে আপনার অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ১৫-০২-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ আমি বর্ণিত এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন পূর্বক জানতে পারলাম যে, বর্ণিত প্রকল্পের অধীনে নরসিংদী পওর বিভাগ, বাপাউবো, নরসিংদী কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতীত শেরপুর ও পুটিয়া মৌজা এর আওতায় মদিনা জুট মিল হতে পাটুয়ারপাড় শেরপুর হাড়িদোয়া নদী পর্যন্ত প্রান্তিক কৃষকদের ব্যক্তিমালিকানা ফসলী জমির উপর দিয়া প্রায় ১০.০০মিঃ প্রস্থ ও প্রায় ২.১০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের খাল খনন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যা এলাকার জনগনকে পূর্ব হতে অবগত করা হয়নি। উল্লেখিত খাল খনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হলে একদিকে ফসলী জমি নষ্ট হবে অপর দিকে সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক কৃষকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এমনকি অনেকে ফসলী জমি হারা হয়ে নিঃশ্ব হয়ে যাবে। জনস্বার্থে এই খাল খনন কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

প্রতি,

মহা পরিচালক

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন

ঢাকা।

১। অমপ (পূর্ব/পশ্চি/পরি/প্রশাসন/অর্থ)/ প্রধান (পরি/মানি)

২১. ....  
 \* অনুশিপি অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলো।

★ বিধি মোজাহাবক ব্যবস্থা নিম্ন।

★ পত্রোপ শ্রমীমুসাত্তা আভিবেদন পেশ ককুন।

★ পরীক্ষা করে দেখুন।

★ তদন্ত করে আত্মশিক্ত সহ প্রতিবেদন দিন।

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

ধন্যবাদান্তে,

জহিরুল হকের কল্যাণ গ্রন্থ

संज्ञा-संज्ञा

২০১ নবরসিংদী-৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

অনুলিপি :-

১. প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাপাউবো, ঢাকা।

২. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা পওর সার্কেল, বাপাউবো, ঢাকা।

৩. নিবাহী প্রকৌশলী, নরসিংদী প্তর বিভাগ, বাপাউবো, নরসিংদী।

ইতিমধ্যে ২০৭৮ তারিখ: ২২ জুন

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| ★ ডঃ প্রঃ (টাকা) মাহমুদুল হক সার্বজনীন    | ★ স্বাধীনতা দিবস             |
| ★ প্রঃ পরিচালক (পিএমও)                    | ★ আশুপাশা কলন / সত্যমত দিন   |
| ★ নিঃ প্রঃ                                | ★ প্রতিবেদন দিন              |
| ★ নিঃ প্রঃ (কৃষ্ণ) উপ-বিঃ প্রঃ/সত্য প্রকৌ | ★ প্রকৌশলী/ব্যবস্থাপনা       |
| ★ উপ-পরিচালক / সহকারী পরিচালক             | ★ পূর্বব্রহ্ম নথিতে পেশ করুন |
| ★ প্রকৌশলী                                | ★ নথিতে রাখুন / তাগাদা দিন   |
| ★ রিসিভ কার্ড                             | ★ প্রধান প্রকৌশলী/কেঃ অঃ     |

[illegible]

ক্রমা: ২৭৬/১৮৮৪

তারিখ: ১১/০৬/১৯

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| ডায়েরী নং ৭২৭ তারিখ: ১১/০৬/১৯ |                                 |
| নিম্ন প্রঃ নং: ২/নংক-২/        | আলাপ করুন                       |
| নরসিংদী/মানিকগঞ্জ/খালিক        | প্রতি কর্তব্যী/কর্তব্যী         |
| সহকারী পরিচালক (প্রঃ)          | মৃত্যু/প্রতিবেদন দিন            |
| সহকারী প্রকৌশলী                | প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দিন        |
| উপ-সহকারী প্রকৌশলী             | পূর্ব মৃত্যু/প্রতিবেদন পেশ করুন |
| উচ্চমান সহকারী                 | নথিতে রাখুন/প্রতিবেদন দিন       |
| উচ্চমান হিসাব সহকারী           |                                 |
| উচ্চমান প্রকৌশলী/প্রঃ          |                                 |
| উচ্চমান প্রকৌশলী               | জবাবদিয় প্রকৌশলী               |

ডায়েরী নং ৫২০৬ তারিখ: ০৮/০৮/১৯

উপঃ বিঃ প্রকৌশলী, নরসিংদী, রূপগঞ্জ কর্তব্যী  
সহকারী প্রকৌশলী প্রতিবেদন দিন  
প্রকৌশলী আলাপ করুন  
সহঃ প্রকৌশলী মৃত্যু দিন  
সহঃ প্রকৌশলী ব্যবস্থা দিন  
উচ্চমান সহকারী নথিতে দিন  
কমান্ডার নথিতে রাখুন  
রাজস্ব সার্ভেয়ার

নির্বাহী প্রকৌশলী  
নরসিংদী পতর বিভাগ  
শাউবো, নরসিংদী।  
০৮/০৮/১৯

sgy/g-1 Enc

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH  
HIGH COURT DIVISION  
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)

CONTEMPT PETITION NO. 366 OF 2019

(ARISING OUT OF WRIT PETITION No. 833 of 2017)

The 08<sup>th</sup> day of July in the year of two thousand nineteen.

Present:

Mr. Justice Mamnoon Rahman.

And

Mr. Justice Ashish Ranjan Das.

AND

IN THE MATTER OF:

1. Md. Halimuzzaman son of late Afsar Uddin Bhuiyan of village- Ghasirdia, Police Station- Shibpur, District- Narsingdi and others,

-Versus-

.....-Petitioners.

Farhana Kawnayen, Deputy Commissioner, Narsingdi, Office of the Deputy Commissioner, Narsingdi and others.

.....-Contemnor-Respondents.

To,

1. Farhana Kawnayen, Deputy Commissioner, Narsingdi, Office of the Deputy Commissioner, Narsingdi.
- ✓ 2. Bijoy Indro chakraborty, Executive Engineer, Water Development Board, Narsingdi.
3. Moonmoon Jahan Liza. Upazila Land Officer, Shibpur, Narsingdi.
4. Humayun Kabir, Upazilla Nirbahi Officer, Upazilla- Shibpur, Office of the Upazilla Nirbahi Officer, Narsingdi.
5. Lieutenant Cornel Kismat Hayat, Project Director, Narsingdi Nodi Puno Khanan Project, 24 Engineer Construction Brigade, Dhaka Cantonment.
6. Azad, Master Warrent Officer Narsingdi Nodi Puno Khanan Project, 24 Engineer Construction Brigade, Dhaka Cantonment.
7. Engineer Md. Akteruzzaman Khan, Managing Director, ACURA, 231/1 (Ground Floor) South Pirerbagh, Kallayanpur, Mirpur- 1216.

Whereas the petition abovementioned has been preferred by the petitioner above named to this Court against, An application for drawing proceeding for contempt of Court AND Disobeying and violating the order dated 25.01.2017 passed by the Hon'ble High Court Division in Writ Petition No. 833 of 2017.

Now upon hearing Mr. A.K.M. Jaglul Haider Afric, Advocate For the Petitioner and upon consideration of the said petition this Court doth order and do issue a Rule Nisi calling upon you the aforesaid respondents to show cause on or before the 22<sup>nd</sup> July, 2013 as to why a rule should not be issued calling upon the respondent-contemnors as to why they should not be punished for committing contempt of Court for non-compliance, of the order dated 25.01.2017 passed by the High Court Division in Writ Petition No. 833 of 2017 and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper.

Let the notice be served upon the respondents by usual course as well as registered post with acknowledgment due at the cost of the petitioners.

The petitioners are directed to put in the requisite within 72 (seventy tow) hours for service of notice upon the respondents.

Let the matter be appeared in the list on 20.08.2019 for order.

Witnesses Mr. Justice Syed Mahmud Hossain, the Hon'ble Chief Justice of Bangladesh on this the 08<sup>th</sup> day of July in the year of two thousand nineteen.

Typed by: A. Razi: 04.08.2019.

Read by: 06-08-19

Exam.by: 04-8-19

Readied by: 04-8-19

Superintendent

07 AUG 2019

Assistant Registrar

07 AUG 2019

07 AUG 2019

AB



|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| ১. প্রসঙ্গ (Case No.)               | ২. প্রসঙ্গের বিবরণ (Description of Case) |
| ৩. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case)  | ৪. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)      |
| ৫. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case)  | ৬. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)      |
| ৭. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case)  | ৮. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)      |
| ৯. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case)  | ১০. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ১১. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ১২. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ১৩. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ১৪. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ১৫. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ১৬. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ১৭. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ১৮. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ১৯. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ২০. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ২১. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ২২. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ২৩. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ২৪. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ২৫. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ২৬. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ২৭. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ২৮. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ২৯. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৩০. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৩১. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৩২. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৩৩. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৩৪. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৩৫. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৩৬. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৩৭. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৩৮. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৩৯. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৪০. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৪১. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৪২. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৪৩. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৪৪. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৪৫. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৪৬. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৪৭. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৪৮. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৪৯. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৫০. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৫১. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৫২. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৫৩. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৫৪. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৫৫. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৫৬. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৫৭. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৫৮. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৫৯. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৬০. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৬১. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৬২. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৬৩. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৬৪. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৬৫. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৬৬. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৬৭. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৬৮. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৬৯. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৭০. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৭১. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৭২. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৭৩. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৭৪. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৭৫. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৭৬. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৭৭. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৭৮. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৭৯. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৮০. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৮১. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৮২. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৮৩. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৮৪. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৮৫. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৮৬. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৮৭. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৮৮. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৮৯. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৯০. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৯১. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৯২. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৯৩. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৯৪. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৯৫. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৯৬. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৯৭. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ৯৮. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)     |
| ৯৯. প্রসঙ্গের প্রকার (Type of Case) | ১০০. প্রসঙ্গের মূল বিষয় (Main Issue)    |

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH  
HIGH COURT DIVISION  
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)  
WRIT PETITION NO. 833 OF 2017

Filed on 25th day of January, in the year of two thousand Seventeen.

Present:  
Ms. Justice Naima Haider.

And  
Justice Abu Taher Md. Saifur Rahman.

IN THE MATTER OF:

Md. Halimuzzaman son of Afsar Uddin Bhuiyan of Village- Ghasirdia Police Station- Shibpur and District- Narsingdi and others.....Petitioners.

-Versus-

Government of Bangladesh represented by the Secretary, Ministry of Water Resources, Secretariat Building, Shahbagh, Dhaka-1000 and others.  
.....Respondents.

- To
1. Government of Bangladesh represented by the Secretary, Ministry of Water Resources, Secretariat Building, Shahbagh, Dhaka-1000.
  2. Director General, Bangladesh Water Development Board (BWDB), Wapda Bhaban (2<sup>nd</sup> Floor), Motijheel C/A, Dhaka-1000.
  3. The Chief Engineer, Central Zone, Bangladesh Water Development Board (BWDB), BWDB Elite House, 54, Motijheel C/A, Dhaka-1000.
  4. The Deputy Commissioner, Narsingdi, Collectorate Building, Narsingdi.
  5. The Assistant Deputy Commissioner (Revenue), Narsingdi, Collectorat Building, Narsingdi.
  6. The Executive Engineer, Narsingdi O & M Division, Bangladesh Water Development Board (BWDB), Narsingdi.
  7. The Assistant Engineer, Bangladesh Water Development Board (BWDB), Narsingdi.
  8. Upazilla Nirbahi officer, Shipur Police Station- Shibpur, District- Narsingdi.
  9. Upazilla Engineer, Shibpur, Bangladesh Water Development Board (BWDB), Police Station- Shibpur, District- Narsingdi.

Whereas the petition abovementioned has been preferred by the petitioner above named to this Court against, An illegal attempt of the Respondents for evicting the petitioners from their own agricultural land as scheduled herein below in Schedule Nos. 1-1522, without any due process of law as well as without giving him any prior notice, just on the plea of embankment of the "Paharia river", Shibpur, Narsingdi and Enforcement of the fundamental rights guaranteed under Articles 27, 31 and 42(1) of the Constitution of Bangladesh.

Now upon hearing Mr. A.K.M. Jaglul Haider Afric, Advocate For the Petitioner and Mr. Md. Mokleshur Rahman, D.A.G. with Mr. Samarendra Nath Biswas, AAG Ms. Farida Yeasmin, AAG for the Respondents and upon consideration of the said petition this Court doth order and do issue a Rule Nisi calling upon you the aforesaid respondents to show cause on or before the 22<sup>nd</sup> February, 2017 as to why the impugned illegal attempt of the Respondents for evicting the petitioners from own agricultural land as described in Schedule Nos. 1-11, without any due process of law as well as without giving him any prior notice, just on the plea of embankment of the "Paharia river", Shibpur, Narsingdi should not be declared to have been made illegally, mala fide and without lawful authority and is of no legal effect and why they should not be directed not to evict the petitioner from the scheduled case-land without due process of law and/or pass such other or further order or orders as to this Court may seem fit and proper.

Pending hearing of the Rule, respondents are restrained by an order of injunction from evicting the petitioners from their own agricultural land as described in Schedule Nos. 1-11, by excavating the same without due process of law.

The petitioner is directed to put in requisites for service of notice upon the respondents through registered post and in usual course.

Witness Mr. Justice Surendra Kumar Sinha, the Hon'ble Chief Justice of Bangladesh at on the 25<sup>th</sup> day of January, two thousand Seventeen.

Type by: A. Protin: 13.02.2017..

Read by:

Exm. by:


Readied by:

Superintendent

13.2.17

Assistant Registrar

13.2.17



- 28 -

**Rebecca Singha**  
LL.B (Hon's) LL.M  
Advocate  
Bangladesh Supreme Court

Annexure - " 3 "

Court Chamber:  
No. # 306, Supreme Court Bar  
Association Building, Ramna,  
Dhaka-1000  
Mobile: 01712761435

Date: 02.05.2019

Ref:

**NOTICE FOR CONTEMPT OF COURT**

FROM : Rebecca Singha  
Advocate  
Room No.306,  
Supreme Court Bar Association,  
Shahbagh, Dhaka-1000.

**FOR AND ON BEHALF OF:**

1. Md. Halimuzzaman son of Afasr Uddin Bhuiyan of Village:  
Ghasirdia, Police Station- Shibpur, District -Narsingdi
2. Alamgir Bhuiyan son of Abdul Awal of village- Ghasirdia,  
Police Station -Shibpur, District-Narsingdi
3. Md. Shiraj Uddin Bhuiyan son of Abdul Aziz Bhuiyan of  
village- Ghasirdia, Police Station- Shibpur, District- Narsingdi
4. Sariful Islam son of late Saiful Islam Bhuiyan of village-  
Ghasirdia, Police -Station, District -Narsingdi
5. Masum Bhuiyan son of Late Saiful Islam Bhuiyan of village-  
Ghasirdia, Police Station-Shibpur and District - Narsingdi
6. Delwar Hossain son of Late Md. Abdul Goni Bhuiyan of  
Village- Ghasirdia, police Station- Shibpur, District-Narsingdi
7. Mohammad Zakaria son of late Abdul Goni Bhuiyan of  
village- Ghasirdia, Police Station- Shibpur, District-  
Narsingdi
8. Md. Abdul Kabir Bhuiyan son of late Rahiz Uddin Bhuiyan of  
village- Ghasirdia, Police Station : Shibpur, District-  
Narsingdi
9. Shahajuddin son of late Md. Shanish of village- Ghasirdia,  
Police Station- Shibpur, District- Narsingdi
10. Ramizuddin son of late Ayet Ali Bhuiyan of



- 27 -

**Rebecca Singha**  
LL.B (Hon's) LL.M  
Advocate  
Bangladesh Supreme Court

**Court Chamber:**  
No. # 306, Supreme Court Bar  
Association Building, Ramna,  
Dhaka-1000  
Mobile: 01712761435

Date: 02.05.2019


Ref:

- village - Noadia, Police Station- Shibpur, District-Narsingdi
11. Azizul Haque Khandker son of late Habibullah Khandker of village- Ghasirdia, Police Satation- Shibpur, District- Narsingdi;
  12. Mustafa Kamal Bhuiyan son of late Abul Kalam Bhuitan of village- Ghasirdia, Police Satation- Shibpur, District- Narsingdi
  13. Mulseh Uddin son of late Abul Kader @ Abdul kader Munshi of village- Ghasirdia, Police Satation- Shibpur, District- Narsingdi;
  14. Abu taher so of Delwan Ali of village- Ghasirdia, Police Satation- Shibpur, District- Narsingdi
  15. Md. Sanaullah Bhuiyan son of late Solaiman Bhuiyan of village- Ghasirdia, Police Satation- Shibpur, District- Narsingdi

To,

1. Farhana Kawnayen, Deputy Commissioner, Narsingdi, office of the Deputy Commissioner, Narsingdi;
2. Bijoy Indro Chakraborty, Executive Engineer, Water Development Board, Narsingdi;
3. Moonmoon Jahan Liza, Upazila Land Officer, Shibpur, Narsingdi;
4. Humaun Kabir, Upazilla Nirbahi Officer, Upazilla- Shibpur, office of the Upazilla Nirbahi Officer, Narsingdi

*Bingha*



Ref:

Date: 02.05.2019

5. Lieutenant Cornel Kismat Hayat, Project Director,  
Narsingdi Nodi Puno Khanan Project, 24 Engineer  
Construction Brigade, Dhaka Cantonment;
6. Azad, Officer, Master Warrant officer, Narsingdi Nodi  
Puno Khanan Project, 24 Engineer Construction  
Brigade, Dhaka Cantonment;
7. Engr. Md. Akteruzzaman Khan, Managing Director,  
ACURA, 231/1 (Ground Floor), South Pirerbag,  
Kallaynpur, Dhaka - 1216

Under the instructions of my above-named clients I am  
addressing and saying as follows:

1. That my above-named clients have filed a Writ Petition  
bearing Writ Petition No. 333/2017 before the Hon'ble High  
Court Division for restraining the authority from evicting the  
petitioners from their own agricultural lands without any due  
process of law as well as without giving them any prior  
notice, just on the plea of embankments of the "Paharia  
River" Shibpur, Narsingdi.
2. That a Division Bench of the Hon'ble High Court Division  
pleased to issue a Rule and order of injunction on 25.01.  
2017 which are as follows-

"Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to  
show cause as to why the impugned illegal attempt of the  
Respondents for evicting the petitioners from their own  
agricultural land as described in schedule No. 1-11 without

*Singha*



**Rebecca Singha**  
LL.B (Hon's) LL.M  
Advocate  
Bangladesh Supreme Court

**Court Chamber:**  
No. # 306, Supreme Court Bar  
Association Building, Ramna,  
Dhaka-1000  
Mobile: 01712761435

Ref:

Date: 02.05.2019

any due process of law as well as without giving them any prior notice just on the plea of embankment of the Paharia river, Shibpur should not be declared to have been made illegally malafide and without any lawful authority and is of no legal effect and why they should not be directed not to evict the petitioners from the scheduled case land without due process of law and/or pass such other or further order or orders as to this court may seem fit and proper.

Pending hearing of the Rule, the respondents are restrained by an order of injunction from evicting the petitioners from their own agricultural lands as describe in Schedule Nos. 1-11 by excavating the same without due process of law.

3. That you have been duly served with the said order of injunction of the Hon'ble High Court Division regarding the case land but unfortunately on 16.04.2019 the Notice Receiver No. 7 along with their employee and machineries most illegally and deliberately trespasses into my client agricultural land and started work for embankment of Paharia river by damaging my client's agricultural crops, digging agricultural land and dropping the blocks upon the said land which are the case land here and violating the injunction order passed by the Hon'ble High Court Division.

*Bingha*



**Rebecca Singha**  
LL.B (Hon's) LL.M  
Advocate  
Bangladesh Supreme Court

**Court Chamber:**  
No. # 306, Supreme Court Bar  
Association Building, Ramna,  
Dhaka-1000  
Mobile: 01712761435

Ref:

Date: 02.05.2019


4. That my clients having news of the said contemptuous acts rushed there and did show the order of the Hon'ble High Court Division, but unfortunately the Notice Receiver No. 6 threatened them by saying “সরকারী কাজে বাধা দিলে দেশ ছাড়া কমব, বেশী

বাড়াবাড়ি করলে চাঁদাবাজি, মার্তার কেইস এর আসামী করব। আমার কাজে বাধা দিলে আমি অনেক লোক উপরে পাঠাইছি, তোদেরকে ও উপরে পাঠাই দিব। হাইকোর্টের এ সমস্ত আদেশ রেখে দেন, এ সমস্ত আদেশ দিয়ে কিছু হবে না, আমরা আমাদের কাজ করব”

5. That, thereafter my clients went to you the Notice Receivers 1 to 4 requesting them in writing to stop the violation of the Hon'ble court's aforesaid order but to no avail as yet. But under the command and control of Notice Receiver No. 5 continued to digging the earth from the case land and continuously violated the Hon'ble Courts order by digging my client's aforesaid agricultural Land, by destroying paddy and vegetables crops and dropping Blocks thereupon and also destroying the signboard affixed on the case land containing the Hon'ble Court's order.

*Rebecca Singha*

6. That the news of aforesaid illegal and contemptuous acts have been published in the daily news paper “Doynik Shadin Sangbad” on 03.02.2019.



**Rebecca Singha**  
LL.B (Hon's) LL.M  
Advocate  
Bangladesh Supreme Court

**Court Chamber:**  
No. # 306, Supreme Court Bar  
Association Building, Ramna,  
Dhaka-1000  
Mobile: 01712761435

Ref:

Date: 02.05.2019

7. That you have not showing least regard to Hon'ble Court's order rather in collusion with each other to the gross disobedience to and violation of the same committing contempt of court willfully and deliberately as aforesaid.

In the premises, I hereby call upon you to be refrained from violating the Hon'ble Court's aforesaid order dated 25.01.2017 within 7 days from the date of receipt of this notice failing which I have instructions to take steps to prosecute you for committing contempt of court.

  
(Rebecca Singha)  
Advocate  
Supreme Court of Bangladesh



|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ১০৮ | ১০৯ | ১১০ | ১১১ | ১১২ | ১১৩ | ১১৪ | ১১৫ | ১১৬ | ১১৭ | ১১৮ | ১১৯ | ১২০ | ১২১ | ১২২ | ১২৩ | ১২৪ | ১২৫ | ১২৬ | ১২৭ | ১২৮ | ১২৯ | ১৩০ | ১৩১ | ১৩২ | ১৩৩ | ১৩৪ | ১৩৫ | ১৩৬ | ১৩৭ | ১৩৮ | ১৩৯ | ১৪০ | ১৪১ | ১৪২ | ১৪৩ | ১৪৪ | ১৪৫ | ১৪৬ | ১৪৭ | ১৪৮ | ১৪৯ | ১৫০ | ১৫১ | ১৫২ | ১৫৩ | ১৫৪ | ১৫৫ | ১৫৬ | ১৫৭ | ১৫৮ | ১৫৯ | ১৬০ | ১৬১ | ১৬২ | ১৬৩ | ১৬৪ | ১৬৫ | ১৬৬ | ১৬৭ | ১৬৮ | ১৬৯ | ১৭০ | ১৭১ | ১৭২ | ১৭৩ | ১৭৪ | ১৭৫ | ১৭৬ | ১৭৭ | ১৭৮ | ১৭৯ | ১৮০ | ১৮১ | ১৮২ | ১৮৩ | ১৮৪ | ১৮৫ | ১৮৬ | ১৮৭ | ১৮৮ | ১৮৯ | ১৯০ | ১৯১ | ১৯২ | ১৯৩ | ১৯৪ | ১৯৫ | ১৯৬ | ১৯৭ | ১৯৮ | ১৯৯ | ২০০ |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

ঢাঃ সাঃ ২৭৭/২৮  
তারিখঃ ২৮/০৬/৮৮

|                                                      |                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| ডায়েরী নং ২২০০ তারিখ ২৮/০৬/৮৮                       |                              |
| নিঃ প্রঃ ঢাকা-১/ঢাকা-২/<br>নরসিংদী/মানিকগঞ্জ/যাত্রিক | মাল্যপ করুন                  |
| সহকারী পরিচালক (প্রঃ)                                | প্রতি জরুরী/জরুরী            |
| সহকারী প্রকৌশলী                                      | মতামত দিন/প্রতিবেদন দিন      |
| উপ-সহকারী প্রকৌশলী                                   | প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন     |
| উচ্চমান সহকারী                                       | পূর্ব সূত্রসহ নথিতে পেশ করুন |
| উচ্চতম হিসাব সহকারী                                  | নথিতে রাখুন/প্রাপ্যাদা দিন   |
| স্টেনোগ্রাফার/পিএ                                    |                              |
| রিসিভার                                              | ভূতাবধায়ক প্রকৌশলী          |

ডায়েরী নং ৬৮৬ তারিখ ২০/০৬/৮৮

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| উঃ বিঃ প্রকৌশলী, নরসিংদী, রূপগঞ্জ জরুরী | প্রতিবেদন দিন  |
| সহকারী প্রকৌশলী                         | আলাপ করুন      |
| প্রকৌশলিক                               | মতামত দিন      |
| সহঃ রাজস্ব কর্মকর্তা                    | ব্যবস্থা প নিন |
| সহকারী হিসাব রক্ষক                      | নথিতে দিন      |
| উচ্চমান সহকারী                          | নথিতে রাখুন    |
| ক্যাশিয়ার                              |                |
| রাজস্ব সার্ভিসার                        |                |

নির্বাহী প্রকৌশলী  
নরসিংদী পত্তর বিভাগ  
গাউবো, নরসিংদী।

২০/০৬/৮৮

২৮/০৬/৮৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রকল্প পরিবীক্ষণ ছক

পরিদর্শনের তারিখ: ৩১/১০/২০১৭ খ্রিঃ

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম: লসমী চাকমা পদবী : সহকারী পরিচালক সেক্টর: পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য:

১. প্রকল্পের নাম: নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প।
২. প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা/সমীক্ষা): বিনিয়োগ প্রকল্প
৩. অর্থায়নের উৎস (জিওবি/ প্রকল্প সাহায্য/জেডিসিএফ/স্ব অর্থায়ন/অন্যান্য): জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন।
- ৩.১ উন্নয়ন সহযোগী: প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন।
- ৩.২ উন্নয়ন সহযোগী: প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন।
৪. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ৪.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ৪.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৫. প্রকল্প এলাকা:

| বিভাগ | জেলা    | সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/উপজেলা |
|-------|---------|-------------------------------|
| ঢাকা  | নরসিংদী | শিবপুর                        |

৬. প্রকল্প অনুমোদন:

|            | অনুমোদনের তারিখ | অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ  |
|------------|-----------------|------------------------|
| মূল        | ২৯/১০/২০১৫      | একনেক                  |
| ১ম সংশোধিত | ২৮/০১/২০১৮      | পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় |

৭. ব্যয়:

| প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকা) | মোট     | জিওবি | প্রকল্প সাহায্য | হ্রাস/বৃদ্ধির হার (কোটি টাকা) |
|------------------------------|---------|-------|-----------------|-------------------------------|
| মূল                          | ৪৪৪১.৭৫ | জিওবি | -               | -                             |
| ১ম সংশোধিত                   | ৫০৮৫.২৩ | জিওবি | -               | ৬৪৩.৪৮ (১৩%)                  |

৮. বাস্তবায়নকাল:

| ডিপিপি               | বাস্তবায়নকাল             | হ্রাস/ বৃদ্ধির হার |
|----------------------|---------------------------|--------------------|
| মূল                  | এপ্রিল ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮ | -                  |
| ১ম সংশোধিত (সর্বশেষ) | এপ্রিল ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮ | অপরিবর্তিত         |

৯. প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

- ☐ বীধ নির্মাণ করে ৩৯৫০ হেক্টর এলাকাঃ ঢাকালে পাহাড়িয়া নদীর পানি প্রবেশ রোধ করণ।
- ☐ ১৬০০ হেক্টর এলাকায় পানি জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন।
- ☐ সেচ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে শুল্ক মৌসুমে ডু-পারিস্থ পানি ব্যবহার করে অতিরিক্ত ৪০০ হেক্টর চাষের আওতায় আনা।
- ☐ পালপাড়া বাজার এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধ করা।

প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যঃ

১০। অঙ্গভিত্তিক অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক<br>নং           | অঙ্গের নাম                                                           | একক             | ডিপিপি/টিপিপি<br>অনুযায়ী প্রাক্কলন |        | গত অর্থ বছর পর্যন্ত<br>ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি                                               |        | ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি<br>ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত |        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
|                        |                                                                      |                 | বাস্তব                              | আর্থিক | বাস্তব<br>(%)                                                                            | আর্থিক | বাস্তব<br>(%)                                 | আর্থিক |
| (ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ      |                                                                      |                 |                                     |        |                                                                                          |        |                                               |        |
|                        | সরবরাহ ও সেবাঃ                                                       |                 |                                     |        |                                                                                          |        |                                               |        |
| ১                      | পেট্রোল ও পুত্রিক্যান্ট                                              | থোক             | ১০০%                                | ৫.০০   | ৭৫                                                                                       | ৩.৭৫   | -                                             | -      |
| ২                      | মুদ্রন ও প্রকাশনা                                                    | থোক             | ১০০%                                | ৫.০০   | ৭৯.২০%                                                                                   | ৩.৯৬   | -                                             | -      |
| ৩                      | EIA ও SIA স্টাডি                                                     | থোক             | ১০০%                                | ২০.০০  | ৯৬.১৫%                                                                                   | ১৯.২৩  | -                                             | -      |
| ৪                      | সম্মানী/ভাতা/ক্ষতিপূরণ                                               | থোক             | ১০০%                                | ৪.০০   | ৫০.৫০%                                                                                   | ২.০২   | -                                             | -      |
| ৫                      | জরীপ ও অনুসন্ধান                                                     | থোক             | ১০০%                                | ১৫.০০  | ৯২.১০%                                                                                   | ১৩.৮১  | -                                             | -      |
| ৬                      | বিদ্যমান যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (জীপ ২টি,<br>মোটর সাইকেল ৩টি) | ৫টি             | ১০০%                                | ৫.০০   | ৭৯.৪০%                                                                                   | ৩.৯৭   | -                                             | -      |
|                        | (ক) রাজস্ব খাতের উপমোট-                                              |                 |                                     | ৫৪.০০  | ৮৬.৫৬%                                                                                   | ৪৬.৭৪  |                                               |        |
| (খ) মূলধনঃ             |                                                                      |                 |                                     |        |                                                                                          |        |                                               |        |
|                        | সম্পদ অধিগ্রহণঃ                                                      |                 |                                     |        |                                                                                          |        |                                               |        |
| ৭                      | জীপ ৩৫০০ সিসি (প্রগতির তৈরী) -১টি                                    | ১টি             | ১০০%                                | ৭৫.০০  | -                                                                                        | -      | -                                             | -      |
| ৮                      | মোটর সাইকেল -২টি                                                     | ২টি             | ১০০%                                | ৩.৯০   | ১০০%                                                                                     | ৩.৯০   | -                                             | -      |
| ৯                      | ফটোকপিয়ার মেশিন -১টি                                                | ১টি             | ১০০%                                | ১.৫০   | ১০০%                                                                                     | ১.৫০   | -                                             | -      |
| ১০                     | স্ট্যান্ডসহ লেভেলিং ইন্সট্রুমেন্ট -২টি                               | ২টি             | ১০০%                                | ১.০০   | ১০০%                                                                                     | ১.০০   | -                                             | -      |
| ১১                     | হ্যান্ড জিপ্সেস -১টি                                                 | ১টি             | ১০০%                                | ০.৯০   | ১০০%                                                                                     | ০.৯০   | -                                             | -      |
| ১২                     | লেজার প্রিন্টারসহ ব্যাল্ড কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক<br>-২টি              | ২টি             | ১০০%                                | ২.০০   | ১০০%                                                                                     | ২.০০   | -                                             | -      |
| ১৩                     | ভূমি অধিগ্রহণ ২.২৭১ হেক্টর                                           | ২.২৭১<br>হেক্টর | ১০০%                                | ৬৫০.০০ | ৫৭.৩০%                                                                                   | ৩৭২.৪২ | -                                             | -      |
| নির্মাণ কাজঃ রেগুলেটরঃ |                                                                      |                 |                                     |        |                                                                                          |        |                                               |        |
| ১৪                     | বান্দেরদিয়া রেগুলেটর (২-ডেন্ট ১.৫ X ১.৮ মিঃ)<br>নির্মাণ -১টি        | ১টি             | ১০০%                                | ১৯৩.২৯ | ৬৪.৬৭%                                                                                   | ১২৫.০০ | ১৩.০১                                         | ৯৮.০০% |
| ১৫                     | বাজনাবো রেগুলেটর (২-ডেন্ট ১.৫ X ১.৮ মিঃ) নির্মাণ<br>-১টি             | ১টি             | ১০০%                                | ১৯৩.২৯ | বিএডিসি কর্তৃক উক্ত স্থানে রেগুলেটর নির্মাণ<br>করায় বাজনাবো রেগুলেটর নির্মাণের প্রয়োজন |        |                                               |        |
| ১৬                     | ঘাসেরদিয়া রেগুলেটর (২-ডেন্ট ১.৫ X ১.৮ মিঃ)<br>নির্মাণ -১টি          | ১টি             | ১০০%                                | ১৯৩.২৯ | ৬০.৫৩%                                                                                   | ১১৭.০০ | ১৩.০১                                         | ৯৮.০০% |

|                               |                                                                                                                               |             |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|
| ১৭                            | কুমারদি রেগুলেটর (১-ভেন্ট ১.৫ X ১.৮ মিঃ) নির্মান - ১টি                                                                        | ১টি         | ১০০% | ১১৯.১৯ | কুমারদি রেগুলেটর এর উজানে জমির মালিকগণ কর্তৃক ঘরবাড়ি - পুকুর-রাসআ করা হয়েছে বিধায় রেগুলেটরের স্থানে উজান ও ভাটিতে পানি আসার কোন খাল বিদ্যমান নাই। কুমারদি রেগুলেটর রেগুলেটর নির্মানের পরোক্ষ নয়।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                       |
| ১৮                            | ঝাউকান্দি রেগুলেটর (২-ভেন্ট ১.৫ X ১.৮ মিঃ) নির্মান - ১টি                                                                      | ১টি         | ১০০% | ১৯৩.২৯ | ৬০.৫৩%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ১১৭.০০ | -      | ৯৮.০০%                |
| ১৯                            | ঘড়িয়ার বিল রেগুলেটর (৩-ভেন্ট ১.৫ X ১.৮ মিঃ) নির্মান - ১টি                                                                   | ১টি         | ১০০% | ২৩৮.৮৯ | ৫৮.৬০%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ১৪০.০০ | -      | ৯৮.০০%                |
| পাইপ স্ফুইচ ও আউটলেট নির্মাণঃ |                                                                                                                               |             |      |        | দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                       |
| ২০                            | দক্ষিণ বানিয়াদি পাইপ স্ফুইচ (১.০-০.৯০মিঃ ডায়া) - ১টি                                                                        | ১টি         | ১০০% | ৫০.৪৫  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                       |
| ২১                            | শিবপুর বাজার পাইপ স্ফুইচ (১.০-০.৯০মিঃ ডায়া) - ১টি                                                                            | ১টি         | ১০০% | ৫০.৪৫  | সাধারণ পাইপ স্ফুইচ (১ ভেন্ট ০.৯০ মি. ব্যাস) এর দেশকূলে ও নদীকূলে স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক ঘরবাড়ি নির্মাণ করায় উক্ত স্থানে পাইপ স্ফুইচ নির্মাণ করলে তা নিষ্কাশন ব্যবস্থায় কোন কার্যকর ভূমিকা রাখবে না বিধায় তার পরিবর্তে শিবপুর বাজার পাইপ স্ফুইচ (১ ভেন্ট ০.৯০ মি. ডায়া) নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। উক্ত স্থানে পাইপ স্ফুইচ নির্মাণ করলে তা নিষ্কাশন ব্যবস্থায় কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                       |
| ২২                            | কালভার্ট ও গেইট নির্মাণ - ৫টি                                                                                                 | ৫টি         | ১০০% | ১২৬.৫০ | উক্ত প্রকল্পের পূর্ব দিকের সীমানা বরাবর অবস্থিত ঢাকা-সিলেট হাইওয়ে রোডের উপর ৫টি কালভার্ট বিদ্যমান আছে। উক্ত কালভার্টগুলো সড়ক ও জনপথ কর্তৃক নির্মিত। প্রকল্প এলাকায় পানি প্রবেশ রোধকল্পে উক্ত কালভার্টগুলোতে গেট নির্মাণ করার জন্য অনুমোদিত ডিপিপিতে সংস্থান আছে। বর্তমানে কালভার্ট গুলোর সম্মুখে স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক বাড়িঘর, শিল্প-কারখানা ইত্যাদি নির্মাণ করায় উক্ত কালভার্ট গুলোতে পানি প্রবাহ নেই। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মাননীয় সংসদ সদস্য ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সহিত আলোচনা হয়েছে। তাদের পরামর্শ মোতাবেক গেট নির্মাণ অঙ্গটি প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপি হতে বাদ দেয়া হয়েছে। |        |        |                       |
| ২৩                            | পাইপ আউটলেট - ২০টি                                                                                                            | ২০টি        | ১০০% | ১৮১.৫০ | দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                       |
| ২৪                            | নদী তীর সংরক্ষণ (৩.৭০ কিঃমিঃ হতে ৪.০০ কিঃমিঃ পালপাড়া বাজার পর্যন্ত) - ৩০০মিটার                                               | ৩০০ মিটার   | ১০০% | ৩২৮.৬২ | ৯.১৩%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ৩০.০০  | ১৫০.১৩ | ৯৭.০০ %<br>৩০০.০০ মি. |
| ২৫                            | দেওয়ানখালী পুনখাল খনন প্রকল্প (০.০০ কিঃমিঃ হতে ৮.০০ কিঃমিঃ পালপাড়া বাজার পর্যন্ত) (মাটির পরিমাণ ২৮৪৮৮০.০০ ঘঃমিঃ) - ৮ কিঃমিঃ | ৮.০০ কিঃমিঃ | ১০০% | ৪৪১.৪৩ | ৫.৬৬%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ২৫.০০  | -      | ৭%                    |
| ২৬                            | ঘাসেরদিয়া পুনখাল খনন প্রকল্প (০.০০ কিঃমিঃ হতে ৩.০০ কিঃমিঃ পালপাড়া বাজার পর্যন্ত) (মাটির পরিমাণ ৬০২৭০.০০ ঘঃমিঃ) - ৩ কিঃমিঃ   | ৩.০০ কিঃমিঃ | ১০০% | ৯৭.৩৫  | ৫.১৪%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ৫.০০   | -      | ৪৮%                   |

|    |                                                                                                                            |                    |      |         |        |         |         |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|---------|--------|---------|---------|--------|
| ২৭ | ঝাউকান্দি পুনখাল খনন প্রকল্প (০.০০ কিঃমিঃ হতে ৫.০০ কিঃমিঃ পালপাড়া বাজার পর্যন্ত) (মাটির পরিমাণ ৮৮৫০০.০০ ঘঃমিঃ) -৫ কিঃমিঃ  | ৫.০০<br>কিঃ<br>মিঃ | ১০০% | ১৩৬.৪৭  | ৭.৩৩%  | ১০.০০   | -       | ৪৮%    |
| ২৮ | বীধ নির্মাণ (শিবপুর বাজার ০.০০ কিঃমিঃ হতে খোরাগাবারা ব্রিজ ৭.৫০ কিঃমিঃ পর্যন্ত) (মাটির পরিমাণ ৮৮৫০০.০০ ঘঃমিঃ) -৭.৫০ কিঃমিঃ | ৭.৫০<br>কিঃ<br>মিঃ | -    | ৯৮০.০৮  | ৪৩.৩৬% | ৪২৫.০০  | -       | ৪৮%    |
|    | (খ) মূলধনের খাতের উপমোটঃ                                                                                                   |                    |      | ৪২৫৮.৩৯ | ৪৭.০০% | ১৩৭৫.৭২ | ১৬৩৭.৭২ | ৫৭.০০% |
|    | মোট = (ক+খ)                                                                                                                |                    |      | ৪৩১২.৩৯ | ৪৮.০০% | ১৪২২.৮৬ | ১৬৮৪.৮৬ | ৫৮.০০% |
| গ. | ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি                                                                                                     |                    |      | ৪৩.১২   | -      | -       | -       | -      |
| ঘ. | প্রাইজ কন্টিনজেন্সি                                                                                                        |                    |      | ৮৬.২৪   | -      | -       | -       | -      |
|    | সর্বমোট = (ক+খ+গ+ঘ)                                                                                                        |                    |      | ৪৪৪১.৭৫ | ৪৮.০০% | ১৪২২.৮৬ | ১৬৮৪.৮৬ | ৬১.০০% |

১১. অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রকল্প পরিচালকের মতামত (ইতিবাচক/নেতিবাচক): প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল এপ্রিল ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮। তবে একনেক ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাক্রমে ২৯/১০/২০১৫ ও ১৫/১১/২০১৫ তারিখে জিও জারী করা হয় বিধায় ২০১৪-১৫ সালে অগ্রগতি ০%। জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের আওতায় ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৮৪০.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬৬.০০%। প্রকল্পটি নির্ধারিত সময় অর্থাৎ জুন, ২০১৮ তে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে।

১২. পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য: প্রকল্পের কার্যক্রম মোট ১০টি প্যাকেজের আওতায় সম্পাদন করা হচ্ছে। এ কাজে প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ক্রয় কার্যক্রমে পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি প্যাকেজের তথ্য উল্লেখ করা হলো।

(ক) প্যাকেজ নং-e: NAR-SFCIDI-W-03/2015-16: আলোচ্য প্যাকেজের আওতায় পাহাড়িয়া নদীর ডান তীরে কি:মি: ৫.৩০০ হতে কি:মি: ৭.৫০০=২.২০০ কি:মি: বীধ নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী এর প্রাক্কলিত মূল্য ছিল ৩১৪.২৬ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে ২৮২.৮৩ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে কাজটি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান নোনা ট্রেডার্স, ১৫৪, মতিঝিল মসজিদ মার্কেট, মতিঝিল বা/এ টাকা-১০০০ কে দেওয়া হয়। গত ০৬/০৯/২০১৬ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ ২০/০৯/২০১৬ ও ১৬/০৬/২০১৭। কাজটি সমাপ্ত হয়নি। বর্তমানে এ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৩৫%।

(খ) প্যাকেজ নং-e: NAR-SFCIDI-W-05/2016-17: আলোচ্য প্যাকেজের আওতায় গড়িয়ার বিল নামক স্থানে ১টি ৩ ভেন্ট রেগুলেটর (১৫০ মি: x ১৮০ মি:) এবং ঝাউয়াকান্দি নামক স্থানে ১টি ২ ভেন্ট রেগুলেটর (১৫০ মি: x ১৮০ মি:) নির্মাণ সম্পাদন করা হচ্ছে। ডিপিপিতে এর সংস্থান ছিল ৩৭২.৯৩ লক্ষ টাকা। টেন্ডার মূল্যায়নের পর ৩৪৬.০৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কাজটি এসি মারবো (জেডি) ১৮ নং গগনবাড়ি রোড, খুলনা কে দেওয়া হয়। গত ১৩/১২/২০১৬ তারিখে এর কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরু এবং সমাপ্তির তারিখ যথাক্রমে ১৫/১২/২০১৬ এবং ১৬/০৩/০১৮ তারিখ। অক্টোবর ২০১৭ পর্যন্ত এ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৯৫%।

(গ) প্যাকেজ নং-e: NAR-SFCIDI-W-08/2016-17: আলোচ্য প্যাকেজের আওতায় পালবাজার নামক স্থানে পাহাড়িয়া নদীর ডানতীরে কি:মি: ৩.৭০০ হতে কি:মি: ৪.০০০=০.৩০০ কি:মি: প্রতিরক্ষামূলক কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে। ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী এ কাজের প্রাক্কলিত মূল্য ১৮৪.০৯ লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে টেন্ডার মূল্যায়ন করে ১৬৬.০৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মারকো ইন্টারন্যাশনাল ১৪৪/৬ শবমেহের টাওয়ার, ভেলা নগর নরসিংদীকে কাজ প্রদান করা

হয়। এ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয় ০৮/০৪/২০১৭ তারিখে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ শুরু ও সমাপ্তির তারিখ ২৬/০৪/২০১৭ ও ১৫/০৪/২০১৮ তারিখ। অক্টোবর, ২০১৭ অনুযায়ী এ কাজের বাস্তব অগ্রগতি ৯৫%। নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ ১৫ এপ্রিল ২০১৮ এর মধ্যে কাজটি সম্পাদন করা হবে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান।

**১৩. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত):**

| প্রকল্প পরিচালকের নাম                                      | মূল দপ্তর ও পদবী                                                                                                                                                                                                                                                                   | দায়িত্ব কাল                            | দায়িত্বের ধরণ (অতিরিক্ত/মূল) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| মো: আব্দুল মতিন সরকার                                      | তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী<br>ঢাকা পওর সার্কেল<br>বাপাউবো, ঢাকা।                                                                                                                                                                                                                       | ০১ ফেব্রুয়ারি,<br>২০১৬ হতে<br>অদ্যাবধি | অতিরিক্ত                      |
| প্রকল্প পরিচালক একাধিক দায়িত্বে থাকলে সে সব প্রকল্পের নাম | (১) পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।<br>(২) ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন আওরঙ্গাবাদ হতে ব্রাহা বাজার ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।<br>(৩) ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন পশ্চিম নারিশা বাজার এবং মেঘুলা বাজার সংলগ্ন পদ্মা নদীর বাম তীর প্রতিরক্ষামূলক প্রকল্প। |                                         |                               |

**১৪. ভূমি অধিগ্রহণ, Resettlement, Utility সংযোগ (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস) সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য (যদি থাকে):**

ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

| ক্রঃ<br>নং | প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের<br>নাম                                                                | প্রকল্প ছক অনুসারে<br>প্রকৃত |        | জুন, ১৭ পর্যন্ত কাজের<br>অগ্রগতি |        | ডিসির<br>নিকট<br>প্রস্তাব পেশ<br>(হেঃ) | ডিএলএসি<br>কর্তৃক<br>অনুমোদিত<br>(হেঃ) | সিএলইসি<br>কর্তৃক<br>অনুমোদিত<br>(হেঃ) | প্রাক্কলন<br>প্রাপ্ত<br>(হেঃ) ও<br>(মূল্য) | মন্তব্য                                                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|----------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|            |                                                                                            | পরিমাণ<br>(হেঃ)              | মূল্য  | পরিমাণ<br>(হেঃ)                  | মূল্য  |                                        |                                        |                                        |                                            |                                                         |
| ১          | ২                                                                                          | ৩                            | ৪      | ৫                                | ৬      | ৭                                      | ৮                                      | ৯                                      | ১০                                         | ১১                                                      |
| ১।         | নরসিংদী জেলার<br>শিবপুর উপজেলাধীন<br>শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ,<br>নিষ্কাশন ও সেচ<br>প্রকল্প | ২.২৭১                        | ৬৫০.০০ | ১.০০<br>(আংশিক)                  | ৩৭২.৪২ | ১.৪৮                                   | ১.০০                                   | ১.০০                                   | ১.০০ ও<br>৩৭২.৪২                           | ১.০০<br>হেক্টর<br>ভূমি<br>অধিগ্রহণ<br>সমাপ্ত<br>হয়েছে। |

**১৫. স্টিয়ারিং/পিআইসি সভা সংক্রান্ত:**

| সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | সিদ্ধান্ত প্রতিপালন                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১ম স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত প্রতিপালন:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |
| প্রকল্পের ডিপিপি ৩৫০০ সিসি জিপ গাড়ি (প্রগতির তৈরি) ক্রয়ের সংস্থান ছিল। বর্তমানে প্রগতি ৩৫০০ সিসি জিপ গাড়ি তৈরি না করায় ২৪৭৭ সিসি জিপ গাড়ি (প্রগতির তৈরি) ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। পরবর্তীতে ডিপিপি সংশোধন/রিকার্ড এর সময় ৩৫০০ সিসি জিপ গাড়ির (প্রগতির তৈরি) স্থলে ২৪৭৭ সিসি জিপ গাড়ি (প্রগতির তৈরি) ক্রয়ের সংস্থান করতে হবে। | সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩৫০০ সিসি জিপ গাড়ির পরিবর্তে ২৪৭৭ সিসি জিপ গাড়ি ক্রয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| বাধী নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণ সংস্থান না থাকায় কৃষক/ব্যক্তিমালিকানা ভূমির উপর দিয়ে বাধী নির্মাণ করা হবে এবং এতে যেন ন্যূনতম কৃষি জমি ব্যবহৃত হয় এ বিষয়টি লক্ষ্য রেখে ডিপিপি-তে বাধীর এলাইনমেন্ট নদীর পাড় বরাবর নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর সাথে আলোচনাক্রমে তার সদয় সম্মতি নিয়ে কাজ করতে হবে; | বাধী নির্মাণে যেন ন্যূনতম কৃষি জমি ব্যবহৃত হয় এর বিষয়টি বিবেচনা রেখে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষক, জমির মালিকদের সহিত আলোচনা মোতাবেক নদীর পাড় বরাবর বাধীর এলাইনমেন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। |
| প্রকল্পের ডিপিপি-তে প্রস্তাবিত কুমারদি রেগুলেটরটির সাথে কোন প্রকার নিক্ষেপন সংযোগ না থাকায় এবং ইতোমধ্যে প্রসারিত রেগুলেটরটির সম্মুখে বসতবাড়ি নির্মিত হওয়ায় বর্ণিত রেগুলেটরটি বাদ দেওয়া যেতে পারে।                                                                                                                                                                       | সিদ্ধান্ত মোতাবেক কুমারদি রেগুলেটর বাদ দেওয়া হয়েছে।                                                                                                                                                                                   |
| প্রকল্পের ডিপিপি-তে প্রস্তাবিত বাজানবো রেগুলেটরটির স্থানে ইতোমধ্যে বিএডিসি কর্তৃক একটি রেগুলেটর নির্মিত হওয়ায় বাজানবো রেগুলেটরটি বাদ দেওয়া যেতে পারে।                                                                                                                                                                                                                     | সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাজানবো রেগুলেটর বাদ দেওয়া হয়েছে।                                                                                                                                                                                   |
| নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সচেষ্ট থাকতে হবে।                                                                                                                                                                                                                                                                         | নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করার লক্ষ্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।                                                                                                                                                          |
| ২য় স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত প্রতিপালন:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| প্রস্তাবিত সাদার চর পাইপ স্লুইচ এর সাথে কোন প্রকার নিক্ষেপন সংযোগ না থাকায় এবং ইতোমধ্যে পাইপ স্লুইচটির সম্মুখে বসত বাড়ি নির্মিত হওয়া পাইপ স্লুইচটি সাদার চরের পরিবর্তে শিবপুর বাজার নামক স্থানে নির্মাণ করা যেতে পারে।                                                                                                                                                    | সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।                                                                                                                                                                                               |
| বাধী নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণ সংস্থান না থাকায় স্থানীয় কৃষক/ভূমির মালিকদের সাথে আলোচনা করে উদ্ধৃদ্ধকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাধী নির্মাণ করতে হবে। এতে যেন ন্যূনতম কৃষি জমি ব্যবহৃত হয় এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে।                                                                                                                                                            | বাধী নির্মাণে যেন ন্যূনতম কৃষি জমি ব্যবহৃত হয় এর বিষয়টি বিবেচনা রেখে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, কৃষক, জমির মালিকদের সহিত আলোচনা মোতাবেক নদীর পাড় বরাবর বাধীর এলাইনমেন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। |
| নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সচেষ্ট থাকতে হবে।                                                                                                                                                                                                                                                                         | নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করার লক্ষ্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।                                                                                                                                                          |
| ৩য় স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্ত প্রতিপালন:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
| প্রকল্পটির নির্ধারিত সময় জুন, ২০১৮ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | “নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিক্ষেপন ও সেচ প্রকল্প” শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০১৮ এর মধ্যে সমাপ্ত করা হবে।                                                                                                    |
| ডিপিপি সংশোধন প্রস্তাবে নতুন জমি অধিগ্রহণ অমস্বর্ত্তকরণ পরিহার করতে হবে।                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ডিপিপি সংশোধন প্রস্তাবে নতুন জমি অধিগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত যথাসম্ভব পরিহার করা হয়েছে। জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ১.০০ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে। বাকি ১.২৭১ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের জন্য আনুপাতিক হারে সম্ভাব্য মূল্য ধরা হয়েছে।              |
| স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সুপারিশ সমূহ যথাসম্ভব বিবেচনায় রেখে ডিপিপি সংশোধন প্রস্তাব প্রণয়ন করতে হবে।                                                                                                                                                                                                                                                                        | স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সুপারিশ সমূহ যথাসম্ভব বিবেচনায় রেখে ডিপিপি সংশোধন প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে।                                                                                                                                 |
| প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্তির জন্য অতিসত্ত্বর সংশোধিত ডিপিপি দাখিল করার ব্যবস্থা নিতে হবে।                                                                                                                                                                                                                                                                       | প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্তির জন্য অতিসত্ত্বর সংশোধিত ডিপিপি দাখিল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।                                                                                                                          |

১৬. পিসি সভার সংখ্যা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রতিপালনঃ

| সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| বীধ নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয় এবং মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয়ের সাথে আলোচনা মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়ার অনুমোদিত ডিপিপিতে সংস্থানকৃত জমির পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে ২টি পাইপ স্লুইচ ও ২০টি পাইপ আউটলেট নির্মাণ কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | বীধ নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয় এবং মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয়ের সাথে আলোচনা মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অনুমোদিত ডিপিপিতে সংস্থানকৃত জমির পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে ২টি পাইপ স্লুইচ ও ২০টি পাইপ আউটলেট নির্মাণ কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। |
| ৭.৫০ কিলোমিটার বীধ নির্মাণ কাজটি পাহাড়িয়া নদীর পাড় বরাবর-বিধায়-ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ চিহ্নিত করে তীর সংরক্ষণ কাজ সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।                                                                                                                                                                                                     | ৭.৫০ কিলোমিটার বীধ নির্মাণ কাজটি পাহাড়িয়া নদীর পাড় বরাবর-বিধায়-ঝুঁকিপূর্ণ স্থানসমূহ চিহ্নিত করে তীর সংরক্ষণ কাজ সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।                                                                                                                                                                                         |
| স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় খাল পুনঃখনন কাজ সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।                                                                                                                                                                                                                                                                  | স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় খাল পুনঃখনন কাজ সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।                                                                                                                                                                                                                                    |
| সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত ৫টি কালভার্টের সম্মুখে বসতবাড়ি নির্মিত হওয়ায় জনপ্রতিনিধিদের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ৫ টি কালভার্ট এর সম্মুখে গেট নির্মাণ বাদ দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।                                                                                                                                                                                   | সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মিত ৫টি কালভার্টের সম্মুখে বসতবাড়ি নির্মিত হওয়ায় জনপ্রতিনিধিদের সুপারিশের প্রেক্ষিতে ৫ টি কালভার্ট এর সম্মুখে গেট নির্মাণ বাদ দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।                                                                                                                                                                       |
| প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্তির জন্য অতিসত্ত্বর সংশোধিত ডিপিপি দাখিল করার ব্যবস্থা নিতে হবে।                                                                                                                                                                                                                                                                           | প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্তির জন্য অতিসত্ত্বর সংশোধিত ডিপিপি দাখিল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।                                                                                                                                                                                                                                                           |
| পিআইসি/পিএসসি সভায় হালনাগাদ তথ্যের আলোকে বার সিডিউল উপস্থাপন করতে হবে।                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | পিআইসি/পিএসসি সভায় হালনাগাদ তথ্যের আলোকে বার সিডিউল উপস্থাপন করা হবে।                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |


গ. প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ:

১৭। পরিদর্শনকৃত এলাকা: নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলা।

১৮। পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণ: গত ৩১/১০/২০১৭ তারিখে আইএমইডির সহকারী পরিচালক জনাব লসমী চাকমা কর্তৃক প্রকল্পের নরসিংদী জেলার কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে নরসিংদী পওর বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব বিজয় ইন্দ্র শংকর চক্রবর্তী ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।


১৮.১ পরিদর্শনকালে জানা যায়, প্রকল্পের মূল কাজ মূলত ৫টি রেগুলেটর নির্মাণ, পাইপ স্লুইচ ও আউটলেট নির্মাণ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ খাল পুনঃখনন ও বীধ নির্মাণ। প্রকল্পের আওতায় ১টি ১ ভেন্ট রেগুলেটর, ৪টি ২ ভেন্ট রেগুলেটর ও ১টি ৩ ভেন্ট রেগুলেটর অর্থাৎ মোট ৬টি রেগুলেটর নির্মাণের সংস্থান ছিল। এর মধ্যে ১ ভেন্ট কুমারাদি রেগুলেটরের সাথে কোন প্রকার নিষ্কাশন খাল সংযোগ না থাকায় এবং উক্ত রেগুলেটর সম্মুখে বসতবাড়ি নির্মিত হওয়ায় রেগুলেটরটি বাদ দেওয়া হয়। ২ ভেন্ট বাজানাবো রেগুলেটরের স্থানে বিএডিসি কর্তৃক একটি রেগুলেটর নির্মিত হওয়ায় এটিও বাদ দেওয়া হয়। ১ম স্ট্রিয়ারিং কমিটির সভায় আলোচনার ভিত্তিতে উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ নেওয়া হয়। মোট ১৯৩.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে চলমান রয়েছে। আইএমইডি কর্তৃক ২ ভেন্ট ঝাড়িকান্দি রেগুলেটর এবং ৩ ভেন্ট ঘড়িয়ার বিল রেগুলেটর এর নির্মাণকাজ

পরিদর্শন করা হয়। উক্ত দুটো রেগুলেটরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। রেগুলেটর দুটির নির্মাণ কাজ আপাতদৃষ্টিতে সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে।

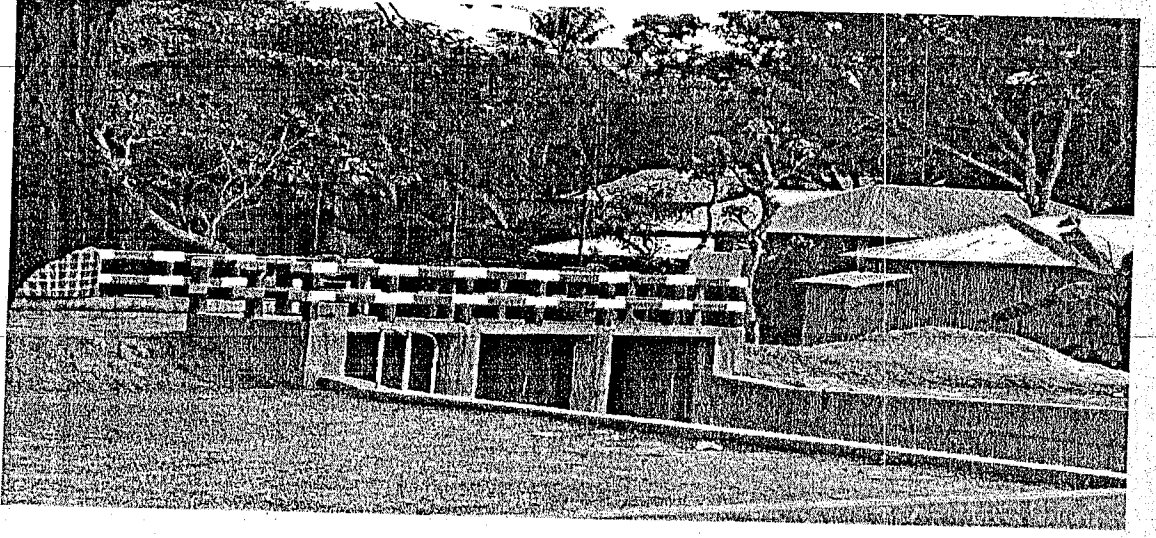

চিত্র-১: নির্মাণকৃত ঘড়িয়ার বিল ও ভেন্ট রেগুলেটর

তবে পরিদর্শনে রেগুলেটরসমূহের লাক্ষিৎ এপ্রোনে এন্ড টারমিনেশন কাজ করা প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। না হলে বর্ষাকালে স্রোতের তোড়ে লাক্ষিৎ এপ্রোনের প্লেসিং ব্লক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে (চিত্র-২)।

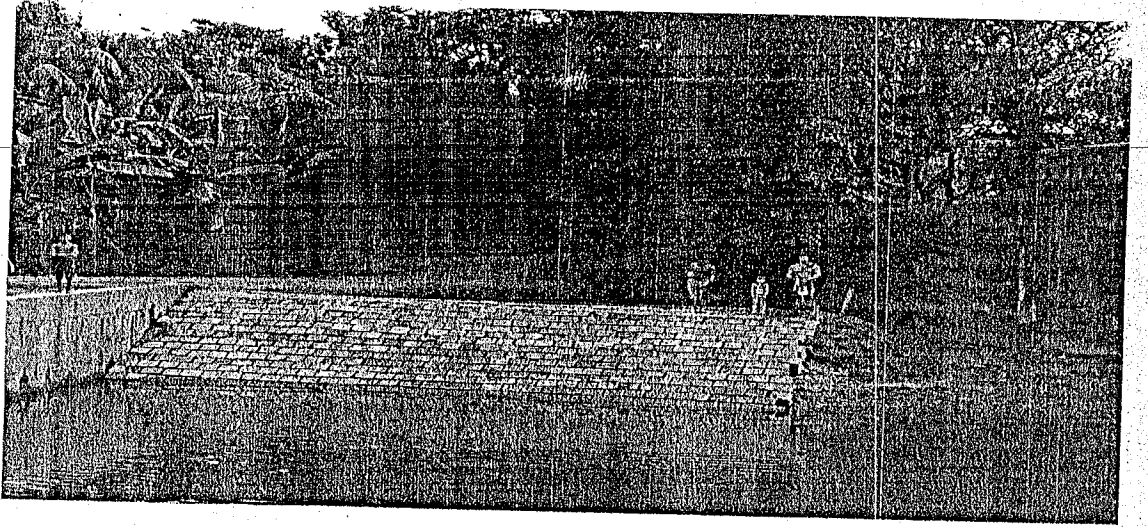


চিত্র-২: ঘড়িয়ার বিল ও ভেন্ট রেগুলেটর-এর লাক্ষিৎ এপ্রোন

১৮.২ প্রকল্পের আওতায় ৩টি পাইপ স্লুইস যথাক্রমে দক্ষিণ বানিয়াদি পাইপ স্লুইস, মাদার চর পাইপ স্লুইস ও শিবপুর বাজার পাইপ স্লুইস এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে ৫টি কালভার্ট ও গেইট নির্মাণ বাদ দেয়া হয়েছে। কালভার্ট গেইট এর সম্মুখ বসতবাড়ি নির্মিত হওয়ায় স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের মতে নির্মাণ কাজ না করার পরামর্শ প্রদান করেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সুপারিশ অনুযায়ী তা ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে

বাদ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে ৪১৯.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০টি পাইপ আউটলেট নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। পাইপ আউটলেট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।


১৮.৩ প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ডিপিপিতে ৩২৮.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পালপাড়া বাজার এ কি:মি: ৩.৭০ হতে কি:মি: পর্যন্ত মোট ৩০০ মি: নদী তীর সংরক্ষণ কাজের সংস্থান ছিল। এর পাশাপাশি ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে কি:মি: ১.১৪৩ হতে ১.৩৮৩ কি:মি: পর্যন্ত ২৪০ মিটার, কি:মি: ৪.৩৮০ হতে কি:মি: ৪.৭৪০ পর্যন্ত ৬৩০ মিটার এবং কি:মি: ৫.৩৪০ হতে কি:মি: ৫.৯২৮ পর্যন্ত ৫৮৮ মিটার নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আইএমইডি কর্তৃক ৩০০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী ৪০x৪০x২০ সাইজের ২৪৮৯৬ টি ৪০x৪০x৪০ সাইজের ৫৭১১টি সিসি ব্লক প্রেসিং করে তীর সংরক্ষণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে তীর সংরক্ষণ কাজ সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে। টাস্কফোর্স কর্তৃক Quality test এবং গণনার পর ব্লক প্রেসিং কাজ করা হয়েছে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান (চিত্র-৩)।

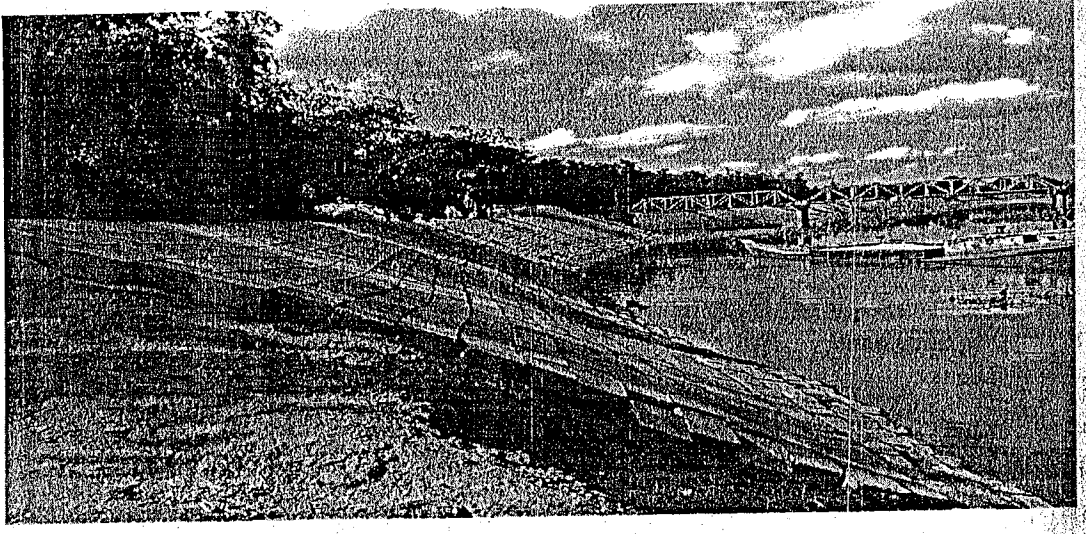


চিত্র ৩: প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত ৩০০মি. নদী তীর সংরক্ষণ কাজ

১৮.৪ প্রকল্পের আরেকটি অন্যতম অঙ্গ খাল পুনঃখনন করা। ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ২৪২.২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৪.৮৯ কি:মি: খাল পুনঃখননের সংস্থান রয়েছে। খাল পুনঃখননের কাজ চলমান রয়েছে। আইএমইডি কর্তৃক ঘাসের দিয়া খাল পুনঃখনন কাজ পরিদর্শন করা হয়। এর বাস্তব অগ্রগতি ৪৫% এবং জুন ২০১৮ এর মধ্যে সকল পুনঃখনন কাজ সম্পাদন করা হবে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান।

১৮.৫ মূল অনুমোদিত ডিপিপিতে ৯৮০.০৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শিবপুর বাজার ০.০০ কি:মি: হতে খোরগমারা ব্রিজ ৭.৫০ কি:মি: পর্যন্ত মোট ৭.৫০ কি:মি: বাঁধ নির্মাণের সংস্থান ছিল। ৩টি প্যাকেজে এ কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে। টেন্ডার আহবানের পর ৮৫৩.১১ লক্ষ টাকায় সর্বনিম্ন রেসপনসিভ দরপত্র দাতা নোনা ট্রেডার্স ১৫৪, মতিঝিল মসজিদ মার্কেট কে কার্যাদেশ দেয়া হয়। ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে তাই এ কাজে প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৮০ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে ৮৫৩.১১ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। নির্মাণকালীন বাধের কাজ পরিদর্শন করা হয় (চিত্র-৪)। পরিমাপে বাধের ক্রেস্ট ৪.৩ মিটার পাওয়া যায়। জানা যায়, ১:২ স্লোপে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, বাধের কিছু অংশ ভেঙ্গে গিয়েছে (চিত্র-৫)। বন্যায় বাধের এসব অংশ এমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান। এ সময় এসব ভাঙ্গা অংশ দ্রুত মেরামত করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

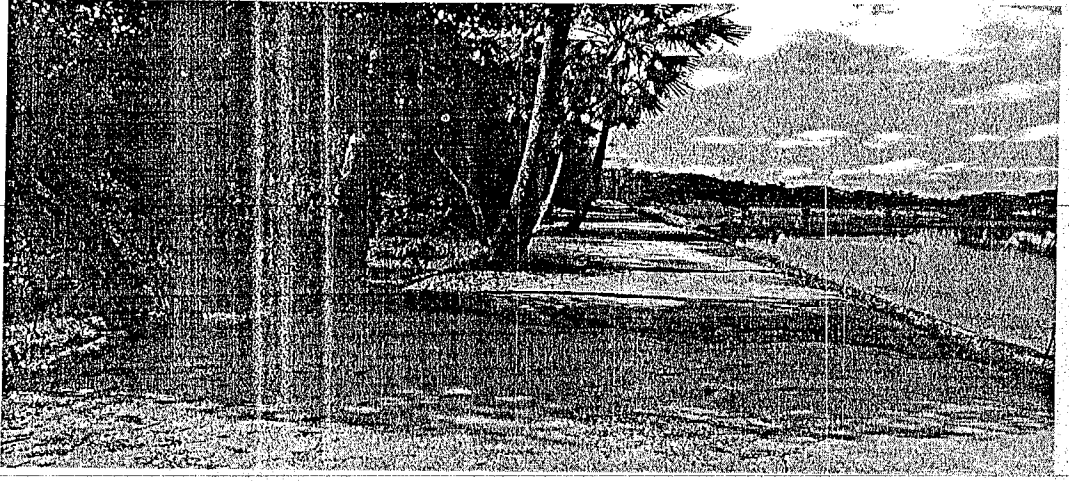

চিত্র-৪: নির্মাণকৃত বাঁধ

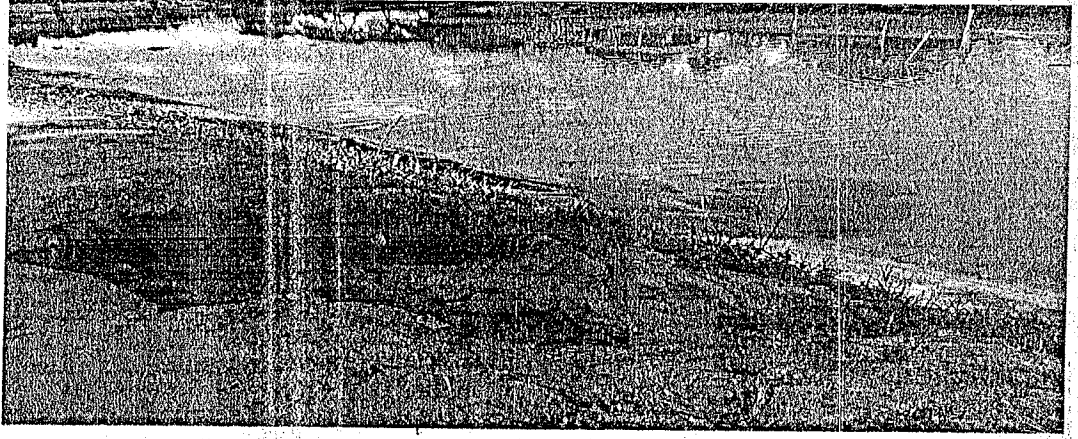

চিত্র-৫: নির্মাণকৃত বাঁধের ভেঙ্গে যাওয়া অংশ

১৯। প্রধান প্রধান অংশের নকশা/ Specification /পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ে প্রচলিত ক্রয় আইন ও বিধির অনুসরণঃ প্রকল্প সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনায় জানা যায়, প্রকল্পের ব্যয় কার্যক্রমে প্রচলিত পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

২০। সাইট বই পর্যালোচনা (ভৌত কাজের ক্ষেত্রে): পরিদর্শনকালে দেখা যায়, সাইট বুক রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এটি নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে বলে জানা যায়।

২১। বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত নতুন ঝুঁকি/ বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে):

প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে কোন সমস্যা নেই বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান। নির্মাণকৃত ৭.৫ কি:মি: বাঁধের ৩০০ মিটার অংশে তীর সংরক্ষণ কাজ করা হয়েছে। তিনি আরো জানান, গত বর্ষীয় নদী তীরের বিভিন্ন অংশে ভাষণ দেখা যায়, যেগুলোর তীর সংরক্ষণ কাজ করা অতীব প্রয়োজন ছিল। বর্তমানে সেগুলো ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে জুন, ২০১৮ তে কাজটি সমাপ্ত করা হবে বলে তিনি আশা বাদ ব্যক্ত করেন।

২২। সুবিধাভোগীর মতামত (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদনাধীন কাজের বিষয়ে স্থানীয় জনগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য স্থানীয় জনগণ তাদের জমি রক্ষার্থে নদীর দিকে বাঁধ নির্মাণে বিনামূল্যে তাদের জমি প্রদান করেন। বাঁধের এলাইনমেন্ট নদীর

অতি সন্নিহিতে। গত বন্যায় বাধের ভাঙ্গন দেখা দিয়েছিল। তারা বীধ রক্ষার্থে স্লোপ প্রোটেকশনের প্রয়োজনীয়তার কথা জানান। প্রকল্পের কাজ গুরোপুরি সমাপ্ত হলে নদীর ভাঙ্গন রোধ, সেচ সুবিধা বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও পানি নিষ্কাশনের প্রকৃত সুফল তারা পাবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।


## ২৩। সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

২৩.১ আলোচ্য প্রকল্পটির জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৮৪০.০০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৬৬%। প্রকল্পটির ৩১৮৩.০০ লক্ষ টাকা এবং ৩৪% বাস্তব কাজ অবশিষ্ট রয়েছে। তবে প্রকল্প সংশ্লিষ্টকাজসমূহ নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ জুন, ২০১৮ তে প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত হবে বলে নিশ্চিত করেন।

২৩.২ জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতায় ২০টি পাইপ আউটলেট এর নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ে শুরু করা যায়নি। মূল অনুমোদিত ডিপিপি ২০টি পাইপ আউটলেট নির্মাণে সংস্থান ছিল ১৮১.৫০ লক্ষ টাকা। ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে এ খাতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৪১৯.৯৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ২৩৮.৪৬ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। নির্ধারিত সময়ে কার্যাদেশ প্রদান করা হলে এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধি এড়ানো সম্ভব হতো।

## ২৪. প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির/ ভিডিও চিত্র ও বর্ণনা:

| চিত্র                                                                                | বর্ণনা                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | আই এম ই ডি প্রতিনিধি কর্তৃক ঘড়িয়ারবিল ৩-ডেন্ট রেগুলেটরের নির্মাণকাজ পরিদর্শন                           |
|  | আই এম ই ডি প্রতিনিধি কর্তৃক চেইনেজ ৩.৭০কি.মি. হতে ৪.০০কি.মি. পর্যন্ত ৩০০মি. নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পরিদর্শন |

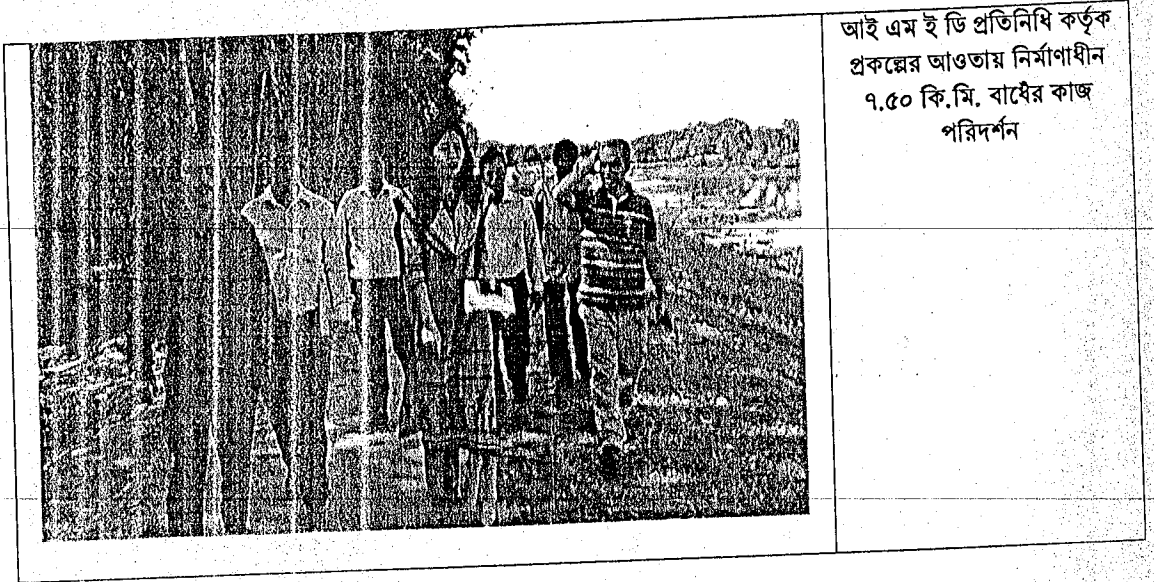

#### ২৪. সুপারিশ/মতামত:

- ২৪.১ আলোচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল এপ্রিল ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮। জানুয়ারি, ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি ১৮৪০.০০ লক্ষ টাকা ও বাস্তব অগ্রগতি ৬৬%। প্রকল্পের অবশিষ্ট ৩৪% বাস্তব কাজ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করতে হবে;
- ২৪.২ ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্পের যেকোন অঙ্গের কাজ নির্ধারিত সময়ে শুরুর বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে যাতে বিলম্বের কারণে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি এড়ানো যায়;
- ২৪.৩ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বাধের ক্ষতিগ্রস্ত ভেঙ্গে যাওয়া অংশসমূহ দ্রুত মেরামত করতে হবে;
- ২৪.৪ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন রেগুলেটরসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ (WMG) গঠন করে তাদের কার্যাদি সম্পর্কে অবহিত করে কাজ সম্পাদনে উৎসাহিত করতে হবে;
- ২৪.৫ নির্মাণকৃত ৭.৫০ কি:মি: বাঁধ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে;
- ২৪.৬ বাধের স্লোপ সংরক্ষণের বিষয়ে স্থানীয় জনগণকে সচেতন করতে হবে এবং
- ২৪.৭ অনুচ্ছেদ-২৪.১ হতে অনুচ্ছেদ-২৪.৬ এর আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা

*(Signature)*  
২৭.০২.২০১৮

(লসমী চাকমা)

সহকারী পরিচালক

ফোনঃ ৯১১০০০৯

७. ११/११/१९७३

[illegible]



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

**ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবে আইএমইডি'র মতামত/সুপারিশ**

|    |                           |   |                                                                                              |
|----|---------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১। | প্রকল্পের নাম             | : | 'নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিকাশন ও সেচ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)'। |
| ২। | বাস্তবায়নকারী সংস্থা     | : | বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।                                                                 |
| ৩। | উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ | : | পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।                                                                      |

| ৪। | অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ও অনুমোদিত বাস্তবায়নকালঃ | : | মেয়াদ                              | ব্যয় (জিওবি) | হাস/ বৃদ্ধি         | মন্তব্য |
|----|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------|
|    | ৪.১) মূল                                               | : | ০১ এপ্রিল, ২০১৫ হতে<br>৩০ জুন, ২০১৮ | ৪৪৪১.৭৫       | -                   |         |
|    | ৪.২) ১ম সংশোধিত                                        | : | ০১ এপ্রিল, ২০১৫ হতে<br>৩০ জুন, ২০১৮ | ৫০৮৫.২৩       | ৬৪৩.৪৮              | ১৪.৪৮%  |
|    | ৪.৩) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (প্রস্তাবিত) | : | ০১ এপ্রিল, ২০১৫ হতে<br>৩০ জুন, ২০১৯ | ৫০৮৫.২৩       | মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি | --      |

৫। প্রকল্পের প্রধান অংশের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রঃ<br>নং | ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অংশের নাম                   | একক    | সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী        |                | ২৮ মার্চ/২০১৮ পর্যন্ত সমগ্র প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------|
|            |                                                                   |        | পরিমাণ                         | অনুমোদিত ব্যয় | বাস্তব (%)                                                | আর্থিক  |
| (১)        | পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট                                           | থোক    | -                              | ৫.৭৫           | ৬৫.২২%                                                    | ৩.৭৫    |
| (২)        | মুদ্রণ ও প্রকাশনা                                                 | থোক    | -                              | ৫.৯৬           | ৬৬.৪৪%                                                    | ৩.৯৬    |
| (৩)        | EIA ও SIA স্টাডি                                                  | থোক    | -                              | ১৯.২৩          | ১০০.০০%                                                   | ১৯.২৩   |
| (৪)        | সন্মানী/ভাতা/ পারিশ্রমিক                                          | থোক    | -                              | ৩.০২           | ৬৬.৮৯%                                                    | ২.০২    |
| (৫)        | জরীপ ও অনুসন্ধান                                                  | থোক    | -                              | ১৫.৮১          | ৮৭.৩৫%                                                    | ১৩.৮১   |
| (৬)        | বিদ্যমান যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (জীপ-২টি, মোটর সাইকেল-৩টি) | সংখ্যা | জীপ-২টি,<br>মোটর<br>সাইকেল-৩টি | ৬.৯৭           | ৫৬.৯৬%                                                    | ৩.৯৭    |
| (৭)        | জীপ ২৪৭৭ সিসি (প্রগতির তৈরী)                                      | সংখ্যা | ১ টি                           | ৯৫.০০          | -                                                         | -       |
| (৮)        | মোটরসাইকেল- ২টি                                                   | সংখ্যা | ২টি                            | ৩.৯০           | ১০০.০০%                                                   | ৩.৯০    |
| (৯)        | ফটোকপিয়ার- ১টি                                                   | সংখ্যা | ১টি                            | ১.৫০           | ১০০.০০%                                                   | ১.৫০    |
| (১০)       | স্ট্যান্ডসহ লেভেলিং ইন্সট্রুমেন্ট- ২টি                            | সংখ্যা | ২টি                            | ১.০০           | ১০০.০০%                                                   | ১.০০    |
| (১১)       | হ্যান্ড জিপিএস- ১টি                                               | সংখ্যা | ১টি                            | ০.৯০           | ১০০.০০%                                                   | ০.৯০    |
| (১২)       | লেজার প্রিন্টারসহ ব্যাল্ড কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক- ২ সেট            | সেট    | ২ সেট                          | ২.০০           | ১০০.০০%                                                   | ২.০০    |
| (১৩)       | ভূমি অধিগ্রহণ- ২.২৭১ হেক্টর                                       | হেক্টর | ২.২৭১                          | ১৩১৯.৬৬        | ১.০০ হেক্টর                                               | ৩৭২.৪২  |
| (১৪)       | ভান্ডেরিয়া রেগুলেটর (২ ভেন্ট ১.৫ X ১.৮ মিঃ)- ১টি                 | সংখ্যা | ১টি                            | ১৭৫.৫৮         | ৯৮.০০%                                                    | ১৬৭.৬৬৫ |
| (১৫)       | ঘাসেরদিয়া রেগুলেটর (২ ভেন্ট ১.৫ X ১.৮ মিঃ)- ১টি                  | সংখ্যা | ১টি                            | ১৭৫.৫৮         | ৯৮.০০%                                                    | ১৬৭.৬৬৫ |
| (১৬)       | ঝাউকান্দি রেগুলেটর (২ ভেন্ট ১.৫ X ১.৮ মিঃ)- ১টি                   | সংখ্যা | ১টি                            | ১৭৩.১৩         | ৯৮.০০%                                                    | ১৮১.২৩  |
| (১৭)       | ঘড়িমারবিল রেগুলেটর (৩ ভেন্ট ১.৫ X ১.৮ মিঃ)- ১টি                  | সংখ্যা | ১টি                            | ১৯৯.৫৫         | ৯৮.০০%                                                    | ১৮১.২৩  |
| (১৮)       | দক্ষিণ বানিয়াদি পাইপ সমুইস (১ ভেন্ট ০.৯০ মিঃ ডায়া)- ১টি         | সংখ্যা | ১টি                            | ৫৩.২৭          | ৫.০০%                                                     | ০.০০    |

| ক্রঃ<br>নং | ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প কাজের বিভিন্ন অংশের নাম                                                       | একক    | সংশোধিত ডিপিপি<br>অনুযায়ী |                   | ২৮ মার্চ/২০১৮ পর্যন্ত সমগ্র<br>প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |                                                                                                       |        | পরিমাণ                     | অনুমোদিত<br>ব্যয় | বাস্তব<br>(%)                                                | আর্থিক              |
| (১৯)       | শিবপুর বাজার পাইপ স্লুইস (১ ভেন্ট ০.৯০ মিঃ ডায়া)-<br>১টি                                             | সংখ্যা | ১টি                        | ৫৩.২৭             | ৫.০০%                                                        | ০.০০                |
| (২০)       | পাইপ আউটলেট- ২০টি                                                                                     | সংখ্যা | ২০টি                       | ৪১৯.৯৬            | ৪.০০%                                                        | ০.০০                |
| (২১)       | পালপাড়া বাজার এ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (কিঃমিঃ<br>৩.৭০ হতে কিঃমিঃ ৪.০০ পর্যন্ত)- ৩০০মিঃ                 | মিটার  | ৩০০                        | ১৬৬.০৯            | ৯৭.০০%                                                       | ১৫১.৫৮              |
| (২২)       | নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (১.১৪৩কিঃমিঃ হতে<br>১.৩৮৩কিঃমিঃ পর্যন্ত)- ২৪০মিঃ                                  | মিটার  | ২৪০                        | ১৮২.৩৯            | ২.০০%                                                        | ০.০০                |
| (২৩)       | নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (৪.৩৮০কিঃমিঃ হতে<br>৪.৭৪০কিঃমিঃ পর্যন্ত)- ৬৩০মিঃ                                  | মিটার  | ৬৩০                        | ৪৭০.৭০            | ১০.০০%                                                       | ০.০০                |
| (২৪)       | নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (৫.৩৪০কিঃমিঃ হতে<br>৫.৯২৮কিঃমিঃ পর্যন্ত)- ৫৮৮মিঃ                                  | মিটার  | ৫৮৮                        | ৪৩৯.৬৯            | ৮.০০%                                                        | ০.০০                |
| (২৫)       | দেওয়ানখালী খাল পুনঃখনন (দৈর্ঘ্য ৭.০৬ কিঃমিঃ,<br>মাটির পরিমাণ ২৩৩৬৮.০০ ঘনমিঃ)                         | কিঃমিঃ | ৭.০৬                       | ৬৯.৮৩             | ৩০.০০%                                                       | ৩৩.৮৩               |
| (২৬)       | খাসেরদিয়া খাল পুনঃখনন (দৈর্ঘ্য ১.০৩ কিঃমিঃ,<br>মাটির পরিমাণ ১৪৪২৮.৬১ ঘনমিঃ)                          | কিঃমিঃ | ১.০৩                       | ২৪.২২             | ৪৮.০০%                                                       | ১১.২২               |
| (২৭)       | ঝাউকান্দি খাল পুনঃখনন (দৈর্ঘ্য ১.২০০ কিঃমিঃ,<br>মাটির পরিমাণ ২০৭৮৩.৪৪ ঘনমিঃ)                          | কিঃমিঃ | ১.২০০                      | ২৮.০১             | ৪৮.০০%                                                       | ১০.০০               |
| (২৮)       | ফুলতলা খাল পুনঃখনন (দৈর্ঘ্য ৩.৫০০ কিঃমিঃ, মাটির<br>পরিমাণ ৩৭৯২৭.৫৬ ঘনমিঃ)                             | কিঃমিঃ | ৩.৫০০                      | ৭৯.১৩             | ১৫.০০%                                                       | ০.০০                |
| (২৯)       | হারিদোয়া নদী হতে মদিনা জুট মিল খাল পুনঃখনন<br>(দৈর্ঘ্য ২.১০০কিঃমিঃ, মাটির পরিমাণ ২০৩৫৭.৩১১<br>ঘনমিঃ) | কিঃমিঃ | ২.১০০                      | ৪১.০২             | ৩.০০%                                                        | ০.০০                |
| (৩০)       | বীধ কাম রোড নির্মাণ (দৈর্ঘ্য ৭.৫০কিঃমিঃ, মাটির<br>পরিমাণ ৩৪৩১৫০.৮০ ঘনমিঃ)                             | কিঃমিঃ | ৭.৫০০                      | ৮৫৩.১১            | ৫০.০০%                                                       | ৩৫১.৫৮              |
|            | সর্বমোট :                                                                                             |        |                            | ৫০৮৫.২৩           | ৭০.০০%                                                       | ১৬৮৪.৪৬<br>(৩৩.১২%) |

৬। প্রস্তাবিত বর্ধিত মেয়াদে যে সকল অংশের কাজ বাস্তবায়িত হবে এবং যে সকল অংশের জন্য অর্থ ব্যয় হবে তার বর্ণনা:

| অংশের নাম                                                        | এ কাজ কখন শুরু<br>হয়েছে বা হবে এবং<br>এ কাজ কখন শেষ<br>হবে? | ডিপিপি<br>অনুযায়ী<br>প্রাক্কলিত ব্যয়<br>এবং ইতোমধ্যে<br>ব্যয়িত অর্থ | ভবিষ্যতে<br>সম্পাদনযোগ্য বাস্তবিক<br>কাজের পরিমাণ এবং<br>এ জন্য ব্যয়যোগ্য অর্থ | শুরু করতে বা শেষ হতে বিলম্ব<br>কেন তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১                                                                | ২                                                            | ৩                                                                      | ৪                                                                               | ৫                                                                                                                                                                                                                                          |
| ভূমি অধিগ্রহণ- ২.২৭১ হেক্টর                                      | ০১/০৪/২০১৫ ইং<br>(৩০/০৬/২০১৯)                                | ১৩১৯.৬৬<br>(৩৭২.৪২)                                                    | ১.১৭১ হেক্টর<br>(৫০০.০০)                                                        | ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম জেলা<br>প্রশাসন, নরসিংদী কার্যালয়ে শেষ<br>পর্যায়ে রয়েছে। এখনো পজেশন<br>সার্টিফিকেট দেয়নি।                                                                                                                      |
| দক্ষিণ বানিয়াদি পাইপ স্লুইস<br>(১ ভেন্ট ০.৯০ মিঃ ডায়া)-<br>১টি | ০২/০১/২০১৮ ইং<br>(৩০/০৬/২০১৯)                                | ৫৩.২৭<br>(-)                                                           | থোক<br>(২৫.০০)                                                                  | পাইপ স্লুইচ ও পাইপ আউটলেট<br>নির্মাণের জন্য ১.২৭১ হেক্টর ভূমি<br>অধিগ্রহণের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক,<br>নরসিংদীর কার্যালয়ে শেষ পর্যায়ে<br>রয়েছে। জমি অধিগ্রহণ নিয়ে<br>বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে<br>নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। |
| শিবপুর বাজার পাইপ স্লুইস (১<br>ভেন্ট ০.৯০ মিঃ ডায়া)- ১টি        | ০২/০১/২০১৮ ইং<br>(৩০/০৬/২০১৯)                                | ৫৩.২৭<br>(-)                                                           | থোক<br>(২৫.০০)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
| পাইপ আউটলেট- ২০টি                                                | ০৬/০২/২০১৮ ইং<br>(৩০/০৬/২০১৯)                                | ৪১৯.৯৬<br>(-)                                                          | থোক<br>(২০০.০০)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                          |                               |                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                               |                     |                 | শীঘ্রই নিষ্পত্তি হবে বলে প্রকল্প পরিচালক জানান। তাই জুন/২০১৮ এর মধ্যে এই ৩টি অংশের কাজ শেষ করা সম্ভব হচ্ছে না।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| নদী তীর সংরক্ষণ কাজ<br>(১.১৪৩কিঃমিঃ হতে<br>১.৩৮৩কিঃমিঃ পর্যন্ত)-<br>২৪০মিঃ                               | ২৬/০২/২০১৮ ইং<br>(৩০/০৬/২০১৯) | ১৮২.৩৯<br>(-)       | থোক<br>(১০০.০০) | প্রকল্পটিতে রেগুলেটর নির্মাণ, পাইপ<br>সুইচ নির্মাণ এবং পাইপ আউটলেট<br>নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণ আছে। কিন্তু<br>বীধ নির্মাণ কাজে কোন ভূমি<br>অধিগ্রহণ নেই। ইতোমধ্যে ১.০০<br>হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণপূর্বক ০৪টি<br>রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়েছে।<br>রেগুলেটরের ঠিক পাশেই বীধ<br>নির্মাণ কাজ চলমান থাকা অবস্থায়                                                                                                                                                                                                                                                        |
| নদী তীর সংরক্ষণ কাজ<br>(৪.৩৮০কিঃমিঃ হতে<br>৪.৭৪০কিঃমিঃ পর্যন্ত)-<br>৬৩০মিঃ                               | ১৬/০২/২০১৮ ইং<br>(৩০/০৬/২০১৯) | ৪৭০.৭০<br>(-)       | থোক<br>(২০০.০০) | স্থানীয় জনগণ কাজে বীধা দেন<br>এবং ভূমি অধিগ্রহণ করে বীধ<br>নির্মাণ করতে বলেন। কিছু সংখ্যক<br>জমির মালিক ইতোমধ্যে তাঁদের<br>জমিতে বীধ নির্মাণ না করার জন্য<br>আদালতের সারনাপন্ন হয়েছেন।<br>বীধের কাজের অগ্রগতি ৫০%।<br>অবশিষ্ট ৫০% বীধ নির্মাণ করার<br>পর উক্ত বীধে ব্লক দ্বারা স্থায়ী<br>নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ করা<br>হবে। জমি অধিগ্রহণ নিয়ে বিরোধ<br>নিষ্পত্তির চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে<br>মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান তাই<br>এই সময়ে কাজ করা যাচ্ছে না<br>বিধায় কাজটি সম্পূর্ণরূপে শেষ<br>করার জন্য প্রকল্পের মেয়াদ<br>এক বছর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। |
| নদী তীর সংরক্ষণ কাজ<br>(৫.৩৪০কিঃমিঃ হতে<br>৫.৯২৮কিঃমিঃ পর্যন্ত)-<br>৫৮৮মিঃ                               | ১৬/০২/২০১৮ ইং<br>(৩০/০৬/২০১৯) | ৪৩৯.৬৮<br>(-)       | থোক<br>(২০০.০০) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ফুলতলা খাল পুনঃখনন (দৈর্ঘ্য<br>৩.৫০০ কিঃমিঃ, মাটির<br>পরিমাণ ৩৭৯২৭.৫৬ ঘনমিঃ)                             | ১৬/০২/২০১৮ ইং<br>(৩০/০৬/২০১৯) | ৭৯.১৩<br>(-)        | থোক<br>(৪০.০০)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| হারিদোয়া নদী হতে মদিনা<br>জুট মিল খাল পুনঃখনন<br>(দৈর্ঘ্য ২.১০০কিঃমিঃ, মাটির<br>পরিমাণ ২০৩৫৭.৩১১ ঘনমিঃ) | ১৬/০২/২০১৮ ইং<br>(৩০/০৬/২০১৯) | ৪১.০২<br>(-)        | থোক<br>(২০.০০)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| বীধ কাম রোড নির্মাণ (দৈর্ঘ্য<br>৭.৫০কিঃমিঃ, মাটির পরিমাণ<br>৩৪৩১৫০.৮০ ঘনমিঃ)                             | ২০/০৯/২০১৬ ইং<br>(৩০/০৬/২০১৯) | ৮৫৩.১১<br>(৪২৫.০০)  | থোক<br>(৩০০.০০) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| সর্বমোট:                                                                                                 |                               | ৪০৪৪.৭০<br>(৮২৪.৯৩) | (১৭১০.০০)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

৭। প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সরবরাহকৃত অবশিষ্ট কাজের কর্মপরিকল্পনা:

| ক্র: নং | কাজের ধরন                                                                                          | আরম্ভ            | সমাপ্তি          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| (১)     | বীধ কাম রোড নির্মাণ (দৈর্ঘ্য ৭.৫০কিঃমিঃ, মাটির পরিমাণ<br>৩৪৩১৫০.৮০ ঘনমিঃ)                          | ২০/০৯/২০১৬ খ্রিঃ | ৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ |
| (২)     | দক্ষিণ বানিয়াদি পাইপ সুইস (১ ডেন্ট ০.৯০ মিঃ ডায়া)- ১টি                                           | ০২/০১/২০১৮ খ্রিঃ | ৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ |
| (৩)     | শিবপুর বাজার পাইপ সুইস (১ ডেন্ট ০.৯০ মিঃ ডায়া)- ১টি                                               | ০২/০১/২০১৮ খ্রিঃ | ৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ |
| (৪)     | পাইপ আউটলেট- ২০টি                                                                                  | ০৬/০২/২০১৮ খ্রিঃ | ৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ |
| (৫)     | নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (১.১৪৩কিঃমিঃ হতে ১.৩৮৩কিঃমিঃ<br>পর্যন্ত)- ২৪০মিঃ                               | ২৬/০২/২০১৮ খ্রিঃ | ৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ |
| (৬)     | নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (৪.৩৮০কিঃমিঃ হতে ৪.৭৪০কিঃমিঃ<br>পর্যন্ত)- ৬৩০মিঃ                               | ১৬/০২/২০১৮ খ্রিঃ | ৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ |
| (৭)     | নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (৫.৩৪০কিঃমিঃ হতে ৫.৯২৮কিঃমিঃ<br>পর্যন্ত)- ৫৮৮মিঃ                               | ১৬/০৪/২০১৮ খ্রিঃ | ৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ |
| (৮)     | ফুলতলা খাল পুনঃখনন (দৈর্ঘ্য ৩.৫০০ কিঃমিঃ, মাটির পরিমাণ<br>৩৭৯২৭.৫৬ ঘনমিঃ)                          | ১৬/০৪/২০১৮ খ্রিঃ | ৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ |
| (৯)     | হারিদোয়া নদী হতে মদিনা জুট মিল খাল পুনঃখনন (দৈর্ঘ্য<br>২.১০০কিঃমিঃ, মাটির পরিমাণ ২০৩৫৭.৩১১ ঘনমিঃ) | ১৬/০৪/২০১৮ খ্রিঃ | ৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ |

৮. **প্রকল্প পরিদর্শনঃ** আইএমইডি কর্তৃক ২৮/০৩/২০১৮ তারিখে প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয় (চিত্র: ১-২)। পরিদর্শনকালে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ঢাকা ও প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মতিন সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী নরসিংদী জনাব বিজয় ইন্দ্র শংকর চক্রবর্তী এবং উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী নরসিংদী জনাব দীন ইসলাম সহ বাপাউবো'র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।



চিত্র-১-২: প্রকল্প এলাকা সরে-জমিনে পরিদর্শন

#### ৯। পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণঃ


- ৯.১। পরিদর্শনকালে দেখা যা তীর সংরক্ষণ কাজের জন্য ব্লক নির্মাণের কাজ চলছে। প্রয়োজনীয় ৩৪,৬৯৪টি ব্লকের মধ্যে ইতোমধ্যে (৪০X৪০X২০) সে:মি: সাইজের ২১,০১৭টি ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। (৪০X৪০X২০) সে:মি: সাইজের ১৩,০৩৩৬ টি ব্লকের মধ্যে ৩৯৬৯টি ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে;
- ৯.২। ৭.৫০ কি:মি: বাঁধ নির্মাণের মধ্যে ৩.০০ কি:মি: বাঁধ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ১.৫০ কি:মি: বাঁধ নির্মাণ কাজ চলছে। জমি নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ায় ৩০০ কি:মি: বাঁধের কাজ এখনো শুরু করতে পারেনি;
- ৯.৩। ১৭৫৮ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজের মধ্যে ৩০০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। জমি নিয়ে বিরোধের কারণে বাঁধ নির্মাণ ও তীর সংরক্ষণ কাজ এ সময়ে করা যাচ্ছে না;
- ৯.৪। জনপ্রতিনিধি/রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় বিরোধ নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে মর্মে প্রকল্প পরিচালকের নিকট থেকে জানা যায়;
- ৯.৫। বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া চলমান থাকায় ব্লক নির্মাণে মন্থর গতি পরিলক্ষিত হয়েছে;
- ৯.৬। জমি নিয়ে বিরোধের জন্য এসময়ে কাজ করা যাচ্ছে না অন্যদিকে এপ্রিল মাস থেকেই পানির লেভেল বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে তাই কাজের প্রত্যাশিত অগ্রগতি সম্ভব হবে না মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে, অর্থাৎ নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না; এবং
- ৯.৭। প্রকল্পটি ১ (এক) বার সংশোধন করা হলেও (ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে) এ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়নি।
- ৯.৮। প্রকল্পটির ডিপিপি ইতোমধ্যে ১ (এক)বার সংশোধন করা হলেও বাঁধ নির্মাণ কাজের জন্য প্রকল্পটির আওতায় যে পরিমাণ ভূমি অধিগ্রহণ করার দরকার ছিল তা সংযোজন না করেই আরডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে বাঁধ নির্মাণসহ প্রকল্পের গতি মন্থর হয়ে পড়েছে এবং প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয়েছে।

#### ১০। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির যৌক্তিকতা নিম্নরূপঃ

- ১০.১। প্রকল্পটির ডিপিপি/আরডিপিপিতে রেগুলেটর নির্মাণ, পাইপ স্লুইচ নির্মাণ এবং পাইপ আউটলেট নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান আছে। কিন্তু বাঁধ নির্মাণ কাজে কোন ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান নেই। ইতোমধ্যে ১.০০ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণপূর্বক ০৪টি রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়েছে। রেগুলেটরের ঠিক পাশেই বাঁধ নির্মাণ কাজ চলমান থাকা অবস্থায় স্থানীয় জনগণ কাজে বাঁধা দেন এবং ভূমি অধিগ্রহণ করে বাঁধ নির্মাণের দাবী করেন;

*(Signature)*

- ১০.২। কিছু সংখ্যক জমির মালিক ইতোমধ্যে তাঁদের জমিতে বাঁধ নির্মাণ না করার জন্য মহামান্য কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন;
- ১০.৩। বাঁধের কাজের অগ্রগতি ৫০%। অবশিষ্ট ৫০% বাঁধ নির্মাণ করার পর উক্ত বাঁধে ব্লক দ্বারা স্থায়ী নদীতীর প্রতিক্ষামূলক কাজ করা হবে। জমি নিয়ে বিরোধের কারণে এ খাতে কাজ করা যাচ্ছে না। এজন্য কাজটি সম্পূর্ণরূপে শেষ করার জন্য প্রকল্পের মেয়াদ একবছর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন;
- ১০.৪। পাইপ স্লুইচ ও পাইপ আউটলেট নির্মাণের জন্য ১.২৭১ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক, নরসিংদী কার্যালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এখনো দখল বুঝিয়ে দেয়া হয়নি। জমি অধিগ্রহণ পূর্বক কাজগুলি জুন, ২০১৮ এর মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। তবে আদালতের বাইরে জনপ্রতিনিধি/রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিরোধ নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। প্রকল্প পরিচালক জানান শীঘ্রই জমি নিয়ে বিরোধটির একটি সুরাহা করা সম্ভব হবে; এবং
- ১০.৫। প্রকল্পটি এপ্রিল/২০১৫ হতে শুরু হয়ে জুন/২০১৮ পর্যন্ত সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ছিল। মার্চ/২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ৭০% এবং আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ৩৩.১২%। ভূমি অধিগ্রহণের টাকা প্রদান করা হয়নি তাই আর্থিক অগ্রগতি কম হয়েছে।
- ১১। **বাস্তবায়ন সমস্যাঃ** রেগুলেটর নির্মাণ, পাইপ স্লুইচ নির্মাণ এবং পাইপ আউটলেট নির্মাণের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে/প্রক্রিয়াধীন আছে। অথচ সাথেই/পাশেই বাঁধ নির্মাণ কাজের জন্য কোন ভূমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফলে স্থানীয় জনগণ কাজে বাঁধা দেন এবং ভূমি অধিগ্রহণ করে বাঁধ নির্মাণ করতে বলেন।
- ১২। **সুপারিশ/মতামতঃ** পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ (অনুচ্ছেদ-৯) এবং মেয়াদ বৃদ্ধির যৌক্তিকতা (অনুচ্ছেদ-১০) বিবেচনা করে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে প্রকল্পের মেয়াদকাল ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০১(এক) বছর অর্থাৎ (জুন/২০১৯পর্যন্ত) বৃদ্ধি করা যেতে পারেঃ ✓
- ১২.১। প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত কর্মপরিকল্পনা (অনুচ্ছেদ-৭) কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থা বিষয়টি নিশ্চিত করবে;
- ১২.২। মেয়াদ বৃদ্ধির ফলে প্রকল্পের অনুমোদিত অংগ ও অংগভিত্তিক ব্যয়ের কোন পরিবর্তন হবে না;
- ১২.৩। ব্লক নির্মাণ ও তীর সংরক্ষণ কাজের গুণগতমান নিশ্চিত করতে হবে;
- ১২.৪। অনুমোদিত ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী বাঁধ নির্মাণ নিশ্চিত করতে হবে;
- ১২.৫। প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান ডিপিপিতে না রেখে প্রকল্পটি গ্রহণ করা সমীচীন হয়নি। ভবিষ্যৎ-তে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নে ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হলে ডিপিপিতে যথাযথভাবে ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান রেখে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে;
- ১২.৬। ডিপিপি প্রণয়নসহ বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। তাই দায়-দায়িত্ব নিরূপণ করে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- ১২.৭। জমি নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জনপ্রতিনিধি/রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রেখে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে;
- ১২.৮। প্রকল্পের মেয়াদকাল পরবর্তীতে কোনক্রমেই বর্ধিত করা যাবে না; এবং
- ১২.৯। পরিদর্শন পর্যবেক্ষণ এবং সুপারিশে আলোকে গৃহীত ব্যবস্থাগুলির বিষয়ে আইএমইডি'কে দ্রুত অবহিত করতে হবে।

  
 (মোঃ আফজল হোসেন)  
 পরিচালক



ডায়েরী নং: ১৮৮৮ তারিখ: ২২/৭/১৯

মিঃ এঃ চাকা-১/ঢাকা-২/নরসিংদী/মানিকগঞ্জ/বাগ্মিক

সহকারী পরিচালক (প্রঃ)

সহকারী প্রকৌশলী

উপ-সহকারী প্রকৌশলী

উচ্চমান সহকারী

উর্ধ্বতন হিসাব সহকারী

টেনোপ্রায়র/পিএ

বিশেষ প্রকর্ত

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

নং- ১১.০০.০০০০.১২১.১৪.০০৯.১৮-১৩৫

একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪

শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

www.imed.gov.bd

- ১। অমপ (পূর্ব/পশ্চিম/পূর্ব/প্রশাসন/অর্থ)/ প্রধান (পরি/নি)
- ২।
- ★ অনুশীলিত জব্বারিতার জন্য প্রেরণ করা হলো।
  - ★ বিশিষ্ট আওতাধীন দায়িত্ব নিম্ন।
  - ★ প্রকল্পের সমাপ্তি/সমাপ্তি/প্রতিবেদন পেশ করুন।
  - ★ প্রকল্পের কাজে পেশ করুন।
  - ★ প্রকল্পের কাজে প্রকল্পের জন্য প্রতিবেদন দিন।
  - ★ প্রকল্পের সমাপ্তি/সমাপ্তি/প্রতিবেদন পেশ করুন।
  - ★ প্রকল্পের সমাপ্তি/সমাপ্তি/প্রতিবেদন পেশ করুন।

তারিখঃ ০২/০৭/২০১৯ খ্রিঃ

বিষয়ঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিকাশন ও সেচ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রেরণ।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক “নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিকাশন ও সেচ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

গৃহীত চলমান পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে এ বিভাগকে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে

উপস্থাপিত করা হবে।

সংযুক্তিঃ পরিদর্শন প্রতিবেদন ১১ (এগারো) পাতা।

সচিব, নরসিংদী প্রকৌশলী

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (প্রতিবেদনসহ):

- ১। সুদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াশিংটন ডিসি, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক, “নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিকাশন ও সেচ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াশিংটন ডিসি, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ৪। পরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ১৪৯, আনসার বিল্ডিং, মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা।

- ১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। মহাপরিচালক (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

অফিস কপি।

D/Lasmi AD/Report/Inspection Report

তারিখঃ

১।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

৭।

৮।

৯।

১০।

১১।

১২।

১৩।

১৪।

১৫।

১৬।

১৭।

১৮।

১৯।

২০।

২১।

২২।

২৩।

২৪।

২৫।

২৬।

২৭।

২৮।

২৯।

৩০।

৩১।

৩২।

৩৩।

৩৪।

৩৫।

৩৬।

৩৭।

৩৮।

৩৯।

৪০।

৪১।

৪২।

৪৩।

৪৪।

৪৫।

৪৬।

৪৭।

৪৮।

৪৯।

৫০।

৫১।

৫২।

৫৩।

৫৪।

৫৫।

৫৬।

৫৭।

৫৮।

৫৯।

৬০।

৬১।

৬২।

৬৩।

৬৪।

৬৫।

৬৬।

৬৭।

৬৮।

৬৯।

৭০।

৭১।

৭২।

৭৩।

৭৪।

৭৫।

৭৬।

৭৭।

৭৮।

৭৯।

৮০।

৮১।

৮২।

৮৩।

৮৪।

৮৫।

৮৬।

৮৭।

৮৮।

৮৯।

৯০।

৯১।

৯২।

৯৩।

৯৪।

৯৫।


৯৬।

৯৭।

৯৮।

৯৯।

১০০।





গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রকল্প পরিবীক্ষণ ছক

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম: জনাব লসমী চাকমা পদবী: সহকারী পরিচালক সেক্টর: পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪

ক. প্রকল্পের মৌলিক তথ্য:

১. প্রকল্পের নাম: নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিকাশন ও সেচ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
২. প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা/সমীক্ষা): বিনিয়োগ
- ৩.১ অর্থায়নের উৎস (জিওবি/ প্রকল্প সাহায্য/জেডিসিএফ/স্ব অর্থায়ন/অন্যান্য): জিওবি
- ৩.২ উন্নয়ন সহযোগী: প্রযোজ্য নয়।
- ৪.
- ৪.১ ঋণযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ: পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- ৪.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

(লক্ষ টাকা)

৫. (ক) প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন কাল ও অনুমোদন সংক্রান্ত:

| বিষয়                                               | অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় |         |         |          | বাস্তবায়ন কাল                               | অনুমোদনের তারিখ              | *পরিবর্তন (+/-) |            |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|----------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------------|
|                                                     | মোট                       | জিওবি   | প্র:সা: | অন্যান্য |                                              |                              | ব্যয় (%)       | মেয়াদ (%) |
| মূল                                                 | ৪৪৪১.৭৫                   | ৪৪৪১.৭৫ | -       | -        | এপ্রিল/২০১৫<br>হতে জুন/২০১৮                  | ২২ সেপ্টেম্বর<br>২০১৫ খ্রিঃ। |                 |            |
| সংশোধিত (১ম)<br>(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)                 | ৫০৮৫.২৩                   | ৫০৮৫.২৩ | -       | -        | এপ্রিল/২০১৫<br>হতে জুন/২০১৮                  | ২৮ জানুয়ারী<br>২০১৮ খ্রিঃ।  | ১৪.৪৮%          | --         |
| ব্যয় বৃদ্ধি<br>ব্যতিরেকে মেয়াদ<br>বৃদ্ধি (১ম বার) | ৫০৮৫.২৩                   | ৫০৮৫.২৩ | -       | -        | এপ্রিল/২০১৫<br>হতে জুন/২০১৯<br>(১বছর বৃদ্ধি) | ১৫<br>এপ্রিল/২০১৮            | ---             | ৩১%        |

(খ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় বৃদ্ধির হার (%): ১৪.৪৮%।

(গ) মূল প্রাক্কলনের সাথে ক্রমপুঞ্জিত মেয়াদ বৃদ্ধির হার (%): ৩১%।

৬. প্রকল্প এলাকা:

| বিভাগ | জেলা    | উপজেলা |
|-------|---------|--------|
| ঢাকা  | নরসিংদী | শিবপুর |

৭. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- বাঁধ নির্মাণ করে ৩৯৫০ হেক্টর এলাকায় বর্ষাকালে পাহাড়িয়া নদীর পানি প্রবেশ রোধ করণ।
- ১৬০০ হেক্টর এলাকার জলাবদ্ধতা রোধ এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- সেচ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে অতিরিক্ত ৪০০ হেক্টর জমি চাষের আওতায় আনা এবং
- পালপাড়া বাজার এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধ।

খ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য:

(লক্ষ টাকা)

৮. অশাভিত্তিক অগ্রগতি:

| ক্র. নং | অঙ্গের নাম                                                           | একক           | ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | সর্বশেষ ৩০ জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |            | চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা |            | চলতি অর্থবছরের মে/২০১৯ পর্যন্ত অগ্রগতি |            |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|
| ০১      | ০২                                                                   | ০৩            | ০৪                                  | ০৫                                              |            | ০৬                           |            | ০৭                                     |            |
|         |                                                                      |               | বাস্তব (পরিমাণ/সংখ্যা)              | আর্থিক                                          | বাস্তব (%) | আর্থিক (%)                   | বাস্তব (%) | আর্থিক (%)                             | বাস্তব (%) |
|         | আবর্তক ব্যয় :                                                       |               |                                     |                                                 |            |                              |            |                                        |            |
| ১       | পেট্রোল লুব্রিকেন্ট                                                  | দফা           | ১ দফা                               | ৫.৭৫                                            | ৮২.৬১      | ৪.৭৫                         | ১৭.৩৯      | ১.০০                                   | ৯০.৯৬      |
| ২       | যুগ্ম ও প্রচার                                                       | দফা           | ১ দফা                               | ৫.৯৬                                            | ৯৯.৩৩      | ৫.৯২                         |            |                                        | ৫.৯২       |
| ৩       | EIA & SIA স্টাডি                                                     | -             | -                                   | ১৯.২৩                                           | ১০০        | ১৯.২৩                        |            |                                        | ১৯.২৩      |
| ৪       | সম্মানী/ ভাতা/ক্ষতিপূরণ                                              | দফা           | ১ দফা                               | ৩.০২                                            | ৯৫.৭০      | ২.৮৯                         |            |                                        | ২.৮৯       |
| ৫       | জরিপ ও অনুসন্ধান                                                     | দফা           | ১ দফা                               | ১৫.৮১                                           | ৯৯.৭০      | ১৫.৭৬                        |            |                                        | ১৫.৭৬      |
| ৬       | নিদামান যানবাহন মেঝে/মাস্ত ও রক্ষণাবেক্ষণ (জীপ-২টি, মোটর সাইকেল-৩টি) | দফা           | ১ দফা                               | ৬.৯৭                                            | ৭১.১৬      | ৪.৯৬                         | ২৮.৮৩      | ২.০০                                   | ৭৮.৩৩      |
|         | উপ-মোট (আবর্তক ব্যয়)                                                |               |                                     | ৫৬.৭৪                                           | ৯৪.৩১      | ৫৩.৫১                        | ৫.৩০       | ৩.০০                                   | ৫৪.৪৯      |
|         | মূলধনব্যয় :                                                         |               |                                     |                                                 |            |                              |            |                                        |            |
| ৭       | জীপ ২৪৭৭ সিসি (প্রগতির তৈরি) (১টি)                                   | সংখ্যা        | ১ টি                                | ৯৫.০০                                           | -          | -                            | ১০০        | ৯৫.০০                                  | -          |
| ৮       | মোটরসাইকেল (২টি)                                                     | সংখ্যা        | ২ টি                                | ৩.৯০                                            | ১০০        | ৩.৯০                         | -          | -                                      | ১০০        |
| ৯       | ফটোকপিয়ার মেশিন (১টি)                                               | সংখ্যা        | ১ টি                                | ১.৫০                                            | ১০০        | ১.৫০                         | -          | -                                      | ১০০        |
| ১০      | স্ট্যান্ডসহ লেভেলিং ইন্সট্রুমেন্ট (২ সেট)                            | সেট           | ২ সেট                               | ১.০০                                            | ১০০        | ১.০০                         | -          | -                                      | ১০০        |
| ১১      | হ্যান্ডজিপিএস (১টি)                                                  | সংখ্যা        | ১ টি                                | ০.৯০                                            | ১০০        | ০.৯০                         | -          | -                                      | ১০০        |
| ১২      | সেজার প্রিন্টারসহ ব্রান্ড কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (২ সেট)              | সেট           | ২ সেট                               | ২.০০                                            | ১০০        | ২.০০                         | -          | -                                      | ১০০        |
| ১৩      | ভূমি অধিগ্রহণ (২.২৭১ হেক্টর)                                         | ২.২৭ ১ হেক্টর | ২.২৭১ হেক্টর                        | ১৩১৯.৬৬                                         | ৬০.০০      | ৭৭২.৪২                       | ৪০.০০      | ৫৪৭.০০                                 | ৬৩.৪ ৬     |
|         | নির্মাণকাজ :                                                         |               |                                     |                                                 |            |                              |            |                                        |            |
| ১৪      | বাকারদিয়া রেগুলেটর (২- ডেট ১.৫ X ১.৮ মিটার)                         | সংখ্যা        | ১ টি                                | ১৭৫.৫৮                                          | ৯৮.০০      | ১৬৯.২৩৫                      | -          | -                                      | ৯৮.০ ০     |
| ১৫      | ঘাসেরদিয়া রেগুলেটর (২- ডেট ১.৫ X ১.৮ মিটার)                         | সংখ্যা        | ১ টি                                | ১৭৫.৫৮                                          | ৯৮.০০      | ১৬৯.২৩৫                      | -          | -                                      | ৯৮.০ ০     |

|    |                                                                                                                     |            |       |        |       |        |       |        |       |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| ১৬ | ঝাউকান্দি রেগুলেটর<br>(২- ডেক্ট ১.৫ X<br>১.৮ মিটার)                                                                 | সংখ্যা     | ১ টি  | ১৭৩.১৩ | ৯৮.০০ | ১৭০.০০ | -     | -      | ৯৮.০  | ১৭০.০০ |
| ১৭ | খড়িয়ানবিল<br>রেগুলেটর<br>(৩- ডেক্ট ১.৫ X<br>১.৮ মিটার)                                                            | সংখ্যা     | ১ টি  | ১৯৯.৫৫ | ৯৮.০০ | ১৯২.৮৬ | -     | -      | ৯৮.০  | ১৯২.৮৬ |
| ১৮ | দক্ষিণ বানিয়াদি<br>পাইপ লাইচ (১.০-<br>০.৯০ মি. ডায়া)                                                              | সংখ্যা     | ১ টি  | ৫৩.২৭  | ১৫.০০ | ৬.৮৮   | ৮৫.০  | ৮০.০০  | ৭০.০০ | ৬.৮৮   |
| ১৯ | শিবপুর বাজার পাইপ<br>লাইচ (১.০-০.৯০ মি.<br>ডায়া)                                                                   | সংখ্যা     | ১ টি  | ৫৩.২৭  | ৫০.০০ | ২৩.০০  | ৫০.০০ | ২৫.০০  | ৮০.০  | ২৩.০০  |
| ২০ | পাইপ আউটলেট<br>(২০টি)                                                                                               | সংখ্যা     | ২০ টি | ৪১৯.৯৬ | ২০.০০ | ২৩.১৪  | ৮০.   | ২০০.০০ | ৩৫.০  | ২৩.১৪  |
| ২১ | পালপাড়া বাজারে নদী<br>তীর সংরক্ষণ (কিঃমিঃ<br>৩.৭০ হতে কিঃমিঃ<br>৪.০০ পর্যন্ত) (৩০০<br>মিটার)                       | মিটার      | ৩০০   | ১৬৬.০৯ | ৯৭.০০ | ১৫১.৫৮ | -     | -      | ৯৭.০০ | ১৫১.৫৮ |
| ২২ | নদী তীর সংরক্ষণ কাজ<br>(১.১৪৩ কিঃমিঃ হতে<br>১.৩৮৩ কিঃমিঃ পর্যন্ত)-<br>২৪০মিঃ                                        | মিটার      | ২৪০   | ১৮২.৩৯ | ৬২.০০ | ১২২.৩৮ | ৩৮.০  | ৭৫.০০  | ৮০.০  | ১৪০.৮৮ |
| ২৩ | নদী তীর সংরক্ষণ কাজ<br>(৪.৩৮০ কিঃমিঃ হতে<br>৪.৭৪০ কিঃমিঃ পর্যন্ত)-<br>৬৩০মিঃ                                        | মিটার      | ৬৩০   | ৪৭০.৭৪ | ৪২.০০ | ৪২৭.৭৪ | ৪৮.০  | ২৪০.০০ | ৯৯.২০ | ৪৫২.৯৫ |
| ২৪ | নদী তীর সংরক্ষণ কাজ<br>(৫.৩৪০ কিঃমিঃ হতে<br>৫.৯২৮ কিঃমিঃ পর্যন্ত)-<br>৫৮৮মিঃ                                        | মিটার      | ৫৮৮   | ৪৩৯.৬৯ | ৪০.০০ | ১৬২.৯৮ | ৬০.০  | ২৪০.০০ | ৯২.৩  | ৩৯৭.৯৯ |
| ২৫ | দেওয়ানখালী খাল<br>পুনঃখনন (দৈর্ঘ্য<br>৭.০৬ কিঃমিঃ, মাটির<br>পরিমাণ ২৩৩৬৮.০০<br>ঘনমিঃ)                              | কিঃ<br>মিঃ | ৭.০৬০ | ৬৯.৮৩  | ৯৮.০০ | ৫৮.৬৭  | -     | -      | ৯৮.০  | ৫৮.৬৭  |
| ২৬ | ঘাসেরদিয়া খাল<br>পুনঃখনন (দৈর্ঘ্য<br>১.০৩ কিঃমিঃ, মাটির<br>পরিমাণ ১৪৪২৮.৬১<br>ঘনমিঃ)                               | কিঃ<br>মিঃ | ১.০৩০ | ২৪.২২  | ৬৫.০০ | ১১.২২  | -     | -      | ৬৫.০  | ১১.২২  |
| ২৭ | ঝাউকান্দি<br>খালপুনঃখনন (দৈর্ঘ্য<br>১.২০০ কিঃমিঃ,<br>মাটিরপরিমাণ<br>২০৭৮৩.৪৪ ঘনমিঃ)                                 | কিঃ<br>মিঃ | ১.২০০ | ২৮.০১  | ৬৫.০০ | ১০.০০  | -     | -      | ৬৫.০  | ১০.০০  |
| ২৮ | ফুলতলা খাল<br>পুনঃখনন (দৈর্ঘ্য<br>৩.৫০০ কিঃমিঃ,<br>মাটির পরিমাণ<br>৩৭৯২৭.৫৬ ঘনমিঃ)                                  | কিঃ<br>মিঃ | ৩.৫০০ | ৭৯.১৩  | ৩৭.০০ | ১৩.০৫  | ৬৩.০  | ২০.০০  | ৪৭.০০ | ১৩.০৫  |
| ২৯ | হাড়িদোয়া নদী হতে<br>মদিনা জুট মিল খাল<br>পুনঃখনন (দৈর্ঘ্য<br>২.১০০ কিঃমিঃ,<br>মাটির পরিমাণ<br>২০৩৫৭.৩১১<br>ঘনমিঃ) | কিঃ<br>মিঃ | ২.১০০ | ৪১.০২  | ৩৫.০০ | ৭.৪৪   | ৬৫.০  | ১০.০০  | ৪০.০০ | ৭.৪৪   |
| ৩০ | বীধ কাম রোড নির্মাণ<br>(দৈর্ঘ্য ৭.৫০০<br>কিঃমিঃ, মাটির<br>পরিমাণ)                                                   | কিঃ<br>মিঃ | ৭.৫০০ | ৮৫৩.১১ | ৪৮.০০ | ৩২০.৯৩ | ৫২.০০ | ২০৫.০০ | ৬৬.০  | ৩২০.৯৩ |

|                     |  |  |         |       |         |       |         |       |         |
|---------------------|--|--|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|
| ৩৪৩১৫০.৮০<br>ঘনমিঃ) |  |  |         |       |         |       |         |       |         |
|                     |  |  | ৫০৮৫.২৩ | ৫৫.০০ | ২৬৩৫.৭৯ | ৪৫.০০ | ১৭০০.০০ | ৮৭.০০ | ৩২১৯.৮৮ |

৯. অর্থ বছর ভিত্তিক ডিপিপি/টিপিপি'র সংস্থান, বরাদ্দ, অর্থছাড় ও বাস্তবায়ন অবস্থা:

(লক্ষ টাকা)

| অর্থ বছর  | ডিপিপি/টিপিপি সংস্থান | এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| ২০১৪-২০১৫ | ০০০                   | ০.০০                 |
| ২০১৫-২০১৬ | ২০০.০০                | ২০০.০০               |
| ২০১৬-২০১৭ | ১২২২.৮৬               | ১৩০০.০০              |
| ২০১৭-২০১৮ | ৩৬৬২.৭৭               | ১৫০০.০০              |
| ২০১৮-২০১৯ | -                     | ১৬৯৩.০০              |
| মোট       | ৫০৮৫.২৩               | ৪৭০০.০০              |

১০. (ক) ডিপিপি/টিপিপি'তে মোট প্যাকেজ সংখ্যা: ২২ টি

(লক্ষ টাকায়)

(খ) পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

| প্যাকেজ (১,২,৩...)          | দরপত্র আহ্বানের তারিখ ও প্রাকালিত মূল্য | চুক্তির তারিখ ও চুক্তি মূল্য | কাজ সমাপ্তির তারিখ |            | বাস্তবায়নে বিলম্ব হলে তার কারণ |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|
|                             |                                         |                              | চুক্তি অনুযায়ী    | প্রকৃত     |                                 |
| NAR-SFCDI-RFQ/G-01/ 2015-16 | ১-৬-২০১৬<br>৩.৯০                        | ১৩-৬-২০১৬<br>৩.৮৮            | ২০-৬-২০১৬          | ২০-৬-২০১৬  |                                 |
| NAR-SFCDI-RFQ/G-02/ 2015-16 | ১-৬-২০১৬<br>১.৫০                        | ১৩-৬-২০১৬<br>১.৪৯২           | ২০-৬-২০১৬          | ২০-৬-২০১৬  |                                 |
| NAR-SFCDI-RFQ/G-03/ 2015-16 | ১-৬-২০১৬<br>০.৯০                        | ১৩-৬-২০১৬<br>০.৮৯৫           | ২০-৬-২০১৬          | ২০-৬-২০১৬  |                                 |
| NAR-SFCDI-RFQ/G-04/ 2015-16 | ১-৬-২০১৬<br>১.০০                        | ১৩-৬-২০১৬<br>০.৯৯            | ২০-৬-২০১৬          | ২০-৬-২০১৬  |                                 |
| NAR-SFCDI-RFQ/G-05/ 2015-16 | ১-৬-২০১৬<br>২.০০                        | ১৩-৬-২০১৬<br>১.৯৯            | ২০-৬-২০১৬          | ২০-৬-২০১৬  |                                 |
| NAR-SFCDI-RFQ/G-06/ 2017-18 |                                         |                              |                    |            |                                 |
| NAR-SFCDI-W-01/ 2015-16     | ১৫-৬-২০১৬<br>৩১১.৪৪                     | ১৮-৯-২০১৭<br>২৮০.২৯          | ১৬-৬-২০১৭          | ৩১-৫-২০১৯  |                                 |
| NAR-SFCDI-W-02/2015-16      | ১৫-৬-২০১৬<br>৩২২.২১                     | ১৮-৯-২০১৭<br>২৮৯.৯৯          | ১৬-৬-২০১৭          | ৩১-৫-২০১৯  |                                 |
| NAR-SFCDI-W-03/2015-16      | ১৫-৬-২০১৬<br>৩১৪.২৬                     | ১৮-৯-২০১৭<br>২৮২.৮৩          | ১৬-৬-২০১৭          | ৩১-৫-২০১৯  |                                 |
| NAR-SFCDI-W-04/2016-17      | ২১-৯-২০১৬<br>৩৩০.৬৫                     | ১৪-১২-২০১৬<br>৩৫১.১৬         | ১৬-০৩-২০১৮         | ১৬-০৩-২০১৮ |                                 |
| NAR-SFCDI-W-05/2016-17      | ২১-৯-২০১৬<br>৩৭২.৯৩                     | ১৪-১২-২০১৬<br>৩৭২.৬৮         | ১৬-০৩-২০১৮         | ১৬-০৩-২০১৮ |                                 |
| NAR-SFCDI-W-06/2016-17      | ৭-২-২০১৭<br>১৬৯.৬২                      | ৩০-৮-২০১৭<br>৬৯.৮৩           | ১৬-০৩-২০১৮         | ৩০-০৫-২০১৮ |                                 |
| NAR-SFCDI-W-07/2016-17      | ৭-২-২০১৭<br>৫৮.০৩                       | ২৬-৮-২০১৭<br>৫২.২৩           | ২৫-৫-২০১৮          | ২৫-৩-২০১৯  |                                 |
| NAR-SFCDI-W-08/2016-17      | ২৭-২-২০১৭<br>১৮৪.৫৪                     | ২৪-৮-২০১৭<br>১৬৬.০৯          | ১৫-৮-২০১৮          | ১৫-৮-২০১৮  |                                 |
| NAR-SFCDI-W-09/2017-18      | ১৫-১১-২০১৭<br>১০৬.৫৪                    | ২৮-১২-২০১৭<br>৯৫.৮৯          | ৩০-৬-২০১৮          | ২৫-৬-২০১৯  |                                 |
| NAR-SFCDI-W-10/2017-18      | ১০-১০-২০১৭<br>৪১৯.৯৬                    | ৪-২-২০১৮<br>৩৭৭.৯৭           | ৩০-৬-২০১৮          | ২৫-৬-২০১৯  |                                 |
| NAR-SFCDI-W-                | ২০-১২-২০১৭                              | ১৪-২-২০১৮                    | ৩০-৬-২০১৮          | ৩০-৮-২০১৯  |                                 |

|                        |                      |                     |           |           |  |
|------------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------|--|
| 11/2017-18             | 95.50                | 95.25               |           |           |  |
| NAR-SFCDI-W-12/2017-18 | 20-22-2059<br>85.02  | 28-2-2056<br>96.92  | 30-6-2056 | 30-8-2056 |  |
| NAR-SFCDI-W-13/2017-18 | 20-22-2059<br>262.76 | 28-2-2056<br>262.62 | 30-6-2056 | 28-6-2056 |  |
| NAR-SFCDI-W-14/2017-18 | 20-22-2059<br>890.90 | 28-2-2056<br>886.86 | 30-6-2056 | 30-8-2056 |  |
| NAR-SFCDI-W-15/2017-18 | 20-22-2059<br>896.86 | 28-2-2056<br>890.86 | 30-6-2056 | 30-8-2056 |  |
| SFCDIP-S-01            | 26.20                | 26.20               |           |           |  |

| ক্র. নং | প্যাকেজ নং ও প্যাকেজ (ডিপিপি অনুযায়ী) | ক্রয় পরিকল্পনায় প্রাকল্পিত মূল্য কোট (টাকায়) | ক্রয় পরিকল্পনায় দরপত্র আহবানের তারিখ | প্রকৃত দরপত্র আহবানের তারিখ ও টেন্ডার আইডি | ক্রয় পরিকল্পনায় চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ | প্রকৃত চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ ও টেন্ডার আইডি | টিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল  | চুক্তি মূল্য কোট (টাকায়) | কাজ আরম্ভের তারিখ |           | কাজ সমাপ্তির তারিখ |           | ডেরিয়েশন (চুক্তিমূল্য ও সময়, মোট ও শতকরা হার) সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী | কাজের গুণগত মান ও বাস্তবায়ন (অগ্রগতি (আর্থিক ও বাস্তব; শতকরা হারে)) |
|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|         |                                        |                                                 |                                        |                                            |                                           |                                               |                                                  |                           | চুক্তি অনুযায়ী   | প্রকৃত    | চুক্তি অনুযায়ী    | প্রকৃত    |                                                                            |                                                                      |
| ১       | ২                                      | ৩                                               | ৪                                      | ৫                                          | ৬                                         | ৭                                             | ৮                                                | ৯                         | ১০                | ১১        | ১২                 | ১৩        | ১৪                                                                         | ১৫                                                                   |
| ১।      | NAR-SFCDI-RFQ/G-01/2015-16             | ০.০৩৯                                           | ১-৬-২০১৬                               | ১-৬-২০১৬                                   | ১৩-৬-২০১৬                                 | ১৩-৬-২০১৬                                     | নরীন এটারপ্রাইজ শিবপুর নরসিংদী                   | ০.০৩৮৮                    | ১৪-৬-২০১৬         | ১৪-৬-২০১৬ | ২০-৬-২০১৬          | ২০-৬-২০১৬ |                                                                            |                                                                      |
| ২।      | NAR-SFCDI-RFQ/G-02/2015-16             | ০.০১৫                                           | ১-৬-২০১৬                               | ১-৬-২০১৬                                   | ১৩-৬-২০১৬                                 | ১৩-৬-২০১৬                                     | মের্সিস পারডেজ এটারপ্রাইজ ১০৭/৩ তেলানপুর নরসিংদী | ০.০১৪৯                    | ১৪-৬-২০১৬         | ১৪-৬-২০১৬ | ২০-৬-২০১৬          | ২০-৬-২০১৬ |                                                                            |                                                                      |
| ৩।      | NAR-SFCDI-RFQ/G-03/2015-16             | ০.০০৯                                           | ১-৬-২০১৬                               | ১-৬-২০১৬                                   | ১৩-৬-২০১৬                                 | ১৩-৬-২০১৬                                     | মের্সিস এসএইচ এটারপ্রাইজ ১৯৫/৬ বাসাইল নরসিংদী    | ০.০০৯০                    | ১৪-৬-২০১৬         | ১৪-৬-২০১৬ | ২০-৬-২০১৬          | ২০-৬-২০১৬ |                                                                            |                                                                      |
| ৪।      | NAR-SFCDI-RFQ/G-04/2015-16             | ০.০১০                                           | ১-৬-২০১৬                               | ১-৬-২০১৬                                   | ১৩-৬-২০১৬                                 | ১৩-৬-২০১৬                                     | মের্সিস পারডেজ এটারপ্রাইজ ১০৭/৩ তেলানপুর নরসিংদী | ০.০০৯৯                    | ১৪-৬-২০১৬         | ১৪-৬-২০১৬ | ২০-৬-২০১৬          | ২০-৬-২০১৬ |                                                                            |                                                                      |
| ৫।      | NAR-SFCDI-RFQ/G-05/2015-16             | ০.০২০                                           | ১-৬-২০১৬                               | ১-৬-২০১৬                                   | ১৩-৬-২০১৬                                 | ১৩-৬-২০১৬                                     | মের্সিস এসএইচ এটারপ্রাইজ ১৯৫/৬ বাসাইল নরসিংদী    | ০.০১৯৯                    | ১৪-৬-২০১৬         | ১৪-৬-২০১৬ | ২০-৬-২০১৬          | ২০-৬-২০১৬ |                                                                            |                                                                      |
| ৬।      | NAR-SFCDI-RFQ/G-06/2017-18             | ০.৯৫০                                           | ২০-১০-২০১৭                             |                                            | ২৩-১২-২০১৭                                |                                               |                                                  |                           |                   |           |                    |           |                                                                            |                                                                      |
| ৭।      | NAR-SFCDI-W-01/2015-16                 | ২.৮০২৯                                          | ১৫-৬-২০১৬                              | ১৫-৬-২০১৬ ৬০৩৮১                            | ১৮-৯-২০১৬                                 | ১৮-৯-২০১৭ ৬০৩৮১                               | নোনা ট্রেডার্স ১৫৪ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০১        | ২.৮০২৯                    | ২০-৯-২০১৬         |           | ১৬-৬-২০১৭          | ৩১-৫-২০১৯ |                                                                            |                                                                      |
| ৮।      | NAR-SFCDI-W-02/2015-16                 | ২.৮৯৯৯                                          | ১৫-৬-২০১৬                              | ১৫-৬-২০১৬ ৬০৩৮২                            | ১৮-৯-২০১৬                                 | ১৮-৯-২০১৭ ৬০৩৮২                               | নোনা ট্রেডার্স ১৫৪ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০১        | ২.৮৯৯৯                    | ২০-৯-২০১৬         |           | ১৬-৬-২০১৭          | ৩১-৫-২০১৯ |                                                                            |                                                                      |
| ৯।      | NAR-SFCDI-W-03/2015-16                 | ২.৮২৮৩                                          | ১৫-৬-২০১৬                              | ১৫-৬-২০১৬ ৬০৩৮৩                            | ১৮-৯-২০১৬                                 | ১৮-৯-২০১৭ ৬০৩৮৩                               | নোনা ট্রেডার্স ১৫৪ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০১        | ২.৮২৮৩                    | ২০-৯-২০১৬         |           | ১৬-৬-২০১৭          | ৩১-৫-২০১৯ |                                                                            |                                                                      |

|     |                        |        |            |                      |            |                      |                                                                                                     |        |            |  |           |                                            |  |
|-----|------------------------|--------|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--|-----------|--------------------------------------------|--|
| ১০১ | NAR-SFCDI-W-04/2016-17 | ৩.৫১১৬ | ১১-৯-২০১৬  | ১১-৯-২০১৬<br>৬৬৫৬০   | ১৪-১২-২০১৬ |                      | এসি. মারকো (জেডি) ১৮ নং পানবাড়ি রোড খুলনা।                                                         | ৩.০৬১০ | ১৫-১২-২০১৬ |  | ১৬-৩-২০১৮ | ১৬-৩-২০১৮                                  |  |
| ১১১ | NAR-SFCDI-W-05/2016-17 | ৩.৭২৬৮ | ১১-৯-২০১৬  | ১১-৯-২০১৬<br>৬৬৫৬১   | ১৪-১২-২০১৬ | ১৪-১২-২০১৬<br>৬৬৫৬১  | এসি. মারকো (জেডি) ১৮ নং পানবাড়ি রোড খুলনা।                                                         | ৩.৪৬০৮ | ১৫-১২-২০১৬ |  | ১৬-৩-২০১৮ | ১৬-৩-২০১৮                                  |  |
| ১২১ | NAR-SFCDI-W-06/2016-17 | ০.৬৬৮৩ | ৭-২-২০১৭   | ৭-২-২০১৭<br>৮৫৫৪৪    | ৩০-০৮-২০১৭ | ৩০-০৮-২০১৭<br>৮৫৫৪৪  | এসবি. টিশিআই (জেডি) ৫৪ মতিঝিল বা/এ ঢাকা।                                                            | ০.৬৬৮৩ | ৩-৫-২০১৭   |  | ৩০-৫-২০১৮ | ৩০-৫-২০১৮                                  |  |
| ১৩১ | NAR-SFCDI-W-07/2016-17 | ০.৫২২৩ | ৭-২-২০১৭   | ৭-২-২০১৭<br>৮৫৫৪৫    | ২৬-০৮-২০১৭ | ২৬-০৮-২০১৭<br>৮৫৫৪৫  | এসবি. টিশিআই (জেডি) ৫৪ মতিঝিল বা/এ ঢাকা।                                                            | ০.৫২২৩ | ২৮-৮-২০১৭  |  | ২৫-৫-২০১৮ | ২৫-৩-২০১৯                                  |  |
| ১৪১ | NAR-SFCDI-W-08/2016-17 | ১.৬৬০৯ | ২৭-২-২০১৭  | ২৭-২-২০১৭<br>৮৯৩৭৬   | ২৪-০৮-২০১৭ | ২৪-০৮-২০১৭<br>৮৯৩৭৬  | মারকো ইন্টারন্যাশনাল শব্দমেসের টাওয়ার ডেলানগর নরসিংদী।                                             | ১.৬৬০৯ | ২৬-৮-২০১৭  |  | ১৫-৮-২০১৮ | ১৫-৮-২০১৮                                  |  |
| ১৫১ | NAR-SFCDI-W-09/2017-18 | ১০৬.৫৪ | ২১-৮-২০১৭  | ১৫-১১-২০১৭<br>১৩৮২৫১ | ২১-১০-২০১৭ | ২৮-১২-২০১৭<br>১৩৮২৫১ | মোহাম্মদ ইউনুস এন্ড ব্রাদার্স (প্রাইভেট) লিমিটেড এ.এস. টাওয়ার (৯ম তলা) রোড নং ১ পাটলাইশ চট্টগ্রাম। | ০.৯৫৮৯ | ২-১-২০১৮   |  | ৩০-৬-২০১৮ | ২৫-৬-২০১৯ (সময় বদলি তকর ৭ আবেদন অনুযায়ী) |  |
| ১৬১ | NAR-SFCDI-W-10/2017-18 | ৪.১১১৬ | ১০-১০-২০১৭ | ১০-১০-২০১৭<br>১২৬১৮২ | ১০-১২-২০১৭ | ৪-২-২০১৮<br>১২৬১৮২   | মোঃ শামীম আহসান এন্ড মের্সিস সালেহ আহমেদ (জেডি) নিছাম চেয়ার (৩য় তলা) খশোর রোড খুলনা।              | ৩.৭৭৯৭ | ৬-২-২০১৮   |  | ৩০-৬-২০১৮ | ২৫-৬-২০১৯ (সময় বদলি তকর ৭ আবেদন অনুযায়ী) |  |
| ১৭১ | NAR-SFCDI-W-11/2017-18 | ০.৭৯১৩ | ২৩-১০-২০১৭ | ২০-১২-২০১৭<br>১৪৮২৫৩ | ২৩-১২-২০১৭ | ১৪-২-২০১৮<br>১৪৮২৫৩  | মের্সিস হাসান এন্ড ব্রাদার্স কুইন্সম্যান শন (২য় তলা) ৬ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০।                      | ০.৭৯১৩ | ১৬-২-২০১৮  |  | ৩০-৬-২০১৮ | ৩০-৮-২০১৯                                  |  |
| ১৮১ | NAR-SFCDI-W-12/2017-18 | ০.৪১০২ | ২৩-১০-২০১৭ | ২০-১২-২০১৭<br>১৪৮২০৭ | ২৩-১২-২০১৭ | ১৪-২-২০১৮<br>১৪৮২০৭  | মের্সিস হাসান এন্ড ব্রাদার্স কুইন্সম্যান শন (২য় তলা) ৬ মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০।                      | ০.৪১০২ | ১৬-২-২০১৮  |  | ৩০-৬-২০১৮ | ৩০-৮-২০১৯                                  |  |
| ১৯১ | NAR-SFCDI-W-13/2017-18 | ১.৮২৩৯ | ২৩-১০-২০১৭ | ২০-১২-২০১৭<br>১৪৮২১৫ | ২৩-১২-২০১৭ | ২৫-২-২০১৮<br>১৪৮২১৫  | মের্সিস উদয়ন এন্টারপ্রাইজ ১৮১/১                                                                    | ১.৮২৩৯ | ২৬-২-২০১৮  |  | ৩০-৬-২০১৮ | ২৫-৬-২০১৯ (সময়)                           |  |

|     |                                     |        |                |                          |                |                         | নাগরিক<br>নি<br>নরসিংদী।                                                           |            |               |  |               | বদলি<br>তকর<br>প<br>আবে<br>দন<br>অনুযা<br>য়ী) |  |  |
|-----|-------------------------------------|--------|----------------|--------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--|---------------|------------------------------------------------|--|--|
| ২০। | NAR-<br>SFCDI-W-<br>14/ 2017-<br>18 | ৪,৭০৭০ | ২৩-১০-<br>২০১৭ | ২০-১২-<br>২০১৭<br>১৪৮৫১৯ | ২৩-১২-<br>২০১৭ | ১৪-২-<br>২০১৮<br>১৪৮৫১৯ | মারকো-<br>মনির<br>(জ্যেষ্ঠ)<br>নরসিংদী<br>প্রেসক্রাফ<br>নরসিংদী<br>সদর<br>নরসিংদী। | ৪,৫৬৫<br>৮ | ১৬-২-<br>২০১৮ |  | ৩০-৬-<br>২০১৮ | ৩১-<br>৫-<br>২০১৯                              |  |  |
| ২১। | NAR-<br>SFCDI-W-<br>15/ 2017-<br>18 | ৪,৩৯৬৯ | ২৩-১০-<br>২০১৭ | ২০-১২-<br>২০১৭<br>১৪৮৫৬৫ | ২৩-১২-<br>২০১৭ | ১৫-২-<br>২০১৮<br>১৪৮৫৬৫ | মারকো-<br>মনির<br>(জ্যেষ্ঠ)<br>নরসিংদী<br>প্রেসক্রাফ<br>নরসিংদী<br>সদর<br>নরসিংদী। | ৪,৩০৮<br>৯ | ১৬-২-<br>২০১৮ |  | ৩০-৬-<br>২০১৮ | ৩১-<br>৫-<br>২০১৯                              |  |  |
| ২২। | SFCDIP-S-<br>01                     | ০,১১২৩ | ০১-১২-<br>২০১৬ |                          | ১-০২-২০১৭      |                         | সিদ্ধিআইএ<br>স                                                                     | ০,১১২<br>৩ |               |  |               |                                                |  |  |

১১. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (পর্যায়ক্রমে প্রকল্প শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত):

| প্রকল্প পরিচালক-এর আইডি<br>নং | মূল দপ্তর ও পদবি                              | দায়িত্বকাল                           | দায়িত্বের ধরণ<br>(নিয়মিত/অতিরিক্ত) | একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক<br>হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্ত কিনা |                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
|                               |                                               |                                       |                                      | হ্যাঁ/না                                                         | প্রকল্প সংখ্যা |
| জনাব মোহাম্মদ আলী             | ঢাকা পওর সার্কেল<br>তত্ত্বাবধায়ক<br>প্রকৌশলী | মে/ ২০১৫<br>হইতে ৩১-<br>১২-২০১৫       | অতিরিক্ত                             | হ্যাঁ                                                            | ০২             |
| জনাব মোঃ আরদুল মতিন<br>সরকার  | ঢাকা পওর সার্কেল<br>তত্ত্বাবধায়ক<br>প্রকৌশলী | ০১-০২-<br>২০১৬<br>হইতে ১২-<br>১১-২০১৮ | অতিরিক্ত                             | হ্যাঁ                                                            | ০৩             |
| বিজয় ইন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী  | নরসিংদী পওর<br>বিভাগ<br>নির্বাহী প্রকৌশলী     | ১৩-১১-<br>২০১৮<br>হইতে<br>অদ্যাবধি    | অতিরিক্ত                             | না                                                               |                |

১২. ভূমি অধিগ্রহণ, Resettlement, Utility সংযোগ (বিদ্যুৎ/পানি/গ্যাস) সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য (যদি থাকে):  
আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ১.০০ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণপূর্বক ০৪টি রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়েছে।

১৩. অডিট সম্পাদন ও আপত্তি নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য: প্রকল্পের Internal এবং External অডিট এখনো সম্পাদন  
করা হয়নি বলে জানা যায়।

১৪. স্টিয়ারিং/পিআইসি সভা সংক্রান্ত: স্টিয়ারিং কমিটির পাঁচটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিআইসি সভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১৫. Project Management Information System (PMIS)/অনলাইনে সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্য  
প্রেরণের তারিখ (পিএমআইএস চালু হলে): আলোচ্য প্রকল্পটি এখনো পিএমআইএস (PMIS) এ চালু হয়নি।

গ. প্রকল্প পরিদর্শন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ:

১৬. (ক) পরিদর্শনকৃত এলাকা: নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলা।

(খ) পূর্ববর্তী পরিদর্শনকারীর নাম ও তারিখ: জনাব মোঃ আফজল হোসেন, পরিচালক, আইএমইডি, তারিখ ১২৮/০৩/২০১৮।

**১৭. পরিদর্শনের আলোকে পর্যবেক্ষণ:**

ক. আলোচ্য প্রকল্পটি গত ১১/০৬/২০১৯ তারিখে আইএমইডির সহকারী পরিচালক লসমী চাকমা কর্তৃক প্রকল্পের আওতায় সম্পাদনাধীন চলমান কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে প্রকল্প পরিচালক জনাব বিজয় ইন্দ্র শংকর চক্রবর্তী নির্বাহী প্রকৌশলী, নরসিংদী এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

১৭.১ পরিদর্শনে জানা যায়, আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯। মে, ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩২৪৭.২৯ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮৫%।

১৭.২. প্রকল্পের আওতায় ১৩১৯.৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২.২৭১ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের সংস্থান রয়েছে। জমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১৭.৩. আরডিপিপি অনুযায়ী ৪টি রেগুলেটর যথাক্রমে বাকারদিয়া ২ ভেন্ট রেগুলেটর, ঘাসেরদিয়া ২ ভেন্ট রেগুলেটর, বাউকান্দি ২ ভেন্ট রেগুলেটর, ঘড়িয়ারবিল ২ ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া ১.০ – ০.৯০ মিটার ডায়া এবং ২টি পাইপ স্লুইস একটি দক্ষিণ বানিয়াদি পাইপ স্লুইস ও অপরটি শিবপুর বাজার পাইপ স্লুইস নির্মাণ করা হয়েছে।

১৭.৪. প্রকল্পের আওতায় ৪১৯.৯৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০টি পাইপ আউটলেট নির্মাণের সংস্থান ছিল। এর মধ্যে ৫টি পাইপ আউটলেট নির্মাণ করা হয়েছে। স্থানীয় জনগণ আউটলেট নির্মাণে জমি প্রদানে ইচ্ছুক না হওয়ায় বাকী ১৫টি আউটলেট নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

১৭.৫. প্রকল্পের আওতায় ১.৭৪৮ কি:মি: নদী তীর সংরক্ষণ করা হয়েছে। পরিদর্শনে তীর সংরক্ষণ কাজ সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে। জানা যায়, টাঙ্কফোর্স কর্তৃক ব্লকের গুণগতমান পরীক্ষা এবং গণনার পর তীর সংরক্ষণ কাজে ব্লক স্থাপন করা হয়েছে।

১৭.৬. প্রকল্পের আওতায় মোট ১৪.৮৯ কি:মি: খাল পুনঃখননের সংস্থান রয়েছে। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ৯.২৯০ কি:মি: খাল পুনঃখনন করা হয় বাকী অংশে কাজ চলমান রয়েছে।

১৭.৭. প্রকল্পের আওতায় ৭.৫০ কি:মি: বীধ নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৫.২০ কি:মি: বীধ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শনে বাধের নির্মাণকাজ সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে। জানা যায়, স্থানীয় জনগণ ভূমি অধিগ্রহণ ব্যতীত বীধ নির্মাণে জমি প্রদানে ইচ্ছুক নয়। তারা মহামান্য হাইকোর্টে এ বিষয়ে রীট করেছে। এছাড়া বীধ নির্মাণ বন্ধ রাখতে হাইকোর্ট কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয় এবং ০৯/০৫/২০১৯ তারিখে কন্টেম্পট অব কোর্টের উকিল নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় বাকী ২ কি:মি: বীধ সমাপ্ত করতে না পারার আশংকা রয়েছে।

খ. পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় প্রচলিত আইন/বিধি অনুসরণ: প্রকল্পের কার্যক্রম মোট ২২টি প্যাকেজের আওতায় সম্পাদন করা হচ্ছে। ক্রয় সংক্রান্ত দলিলাদি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, সেবা ক্রয় প্রচলিত পাবরিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি অনুসরণ করা হয়েছে।

গ. গুণগতমান (প্রয়োজনে ল্যাব-টেন্টিং-এর ফলাফলের মাধ্যমে যাচাইকৃত): প্রকল্পের আওতায় প্রতিরক্ষা কাজে ব্যবহৃত সামগ্রীর গুণগতমান পরীক্ষাগারে যথাযথভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে বলে জানা যায়। এছাড়া প্রতিরক্ষা কাজে ব্যবহৃত সিসি ব্লকের গুণগত টাঙ্কফোর্স কর্তৃক পরীক্ষা এবং গণনার পর ব্লক ডাম্পিং ও প্রেসিং করা হয়েছে।

ঘ. সাইট বই পর্যালোচনা (ভৌত কাজের ক্ষেত্রে): সাইট বই সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

১৮. বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত নতুন ঝুঁকি/বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে): আলোচ্য প্রকল্পটিতে রেগুলেটর নির্মাণ, পাইপ স্লুইস নির্মাণ এবং ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান আছে। কিন্তু ৭.৫০০ কি:মি: বীধ নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান নেই। ইতোমধ্যে ১.০০ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণপূর্বক ৪টি রেগুলেটর নির্মাণ করা হয়েছে। রেগুলেটরের সংযোগ বীধ নির্মাণ কাজ চলমান থাকা

অবস্থায় স্থানীয় জনগণ কাজে বাধা দেন এবং ভূমি অধিগ্রহণ করে বীধ নির্মাণ করতে বলেন। এর মধ্যে কিছু সংখ্যক জমির মালিক বীধ নির্মাণের বিরুদ্ধে মহামান্য কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন। প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত ৭.৫ কি:মি: দৈর্ঘ্যের মধ্যে প্রায় ৫.২৫ কি:মি: দৈর্ঘ্যের বীধ নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া গত ০৯/০৫/২০১৯ তারিখে বীধ নির্মাণে কনটেন্ট অব কোর্টের উকিল নোটিশ প্রেরণ করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, মহামান্য কোর্টে রিট ও কনটেন্ট অব কোর্টের উকিল নোটিশ ব্যতীত কাজ সম্পাদনে তীব্র বাধা থাকায় অবশিষ্ট ২.৫ কি:মি: বীধ সম্পন্ন না হওয়ার আশংকা রয়েছে। এছাড়া জনগণের দাবী অনুযায়ী স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ২০টি আউটলেটের মধ্যে ১৫টি আউটলেট নির্মাণ না করার জন্য ডিও লেটার প্রদান করেছেন। সামগ্রিক বিষয়ে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১৯. সুবিধাভোগীর মতামত: পরিদর্শনকালে স্থানীয় জনগণের সাথেও আলোচনা করা হয়। প্রকল্প এলাকায় জনগণ বন্যা, জলাবদ্ধতা রোধ এবং নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন চান তবে তারা সরকার কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণের ভিত্তিতে প্রকল্পের কাজ সম্পাদনের জন্য দাবী জানান।

২০. সার্বিক পর্যবেক্ষণ:


২০.১ আলোচ্য প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল এপ্রিল, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯। প্রকল্পটি জুন, ২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। মে, ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩২৪৭.২৯ লক্ষ টাকা (৬৪.৬৫%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮৫%।


২০.২ প্রকল্পের আওতায় ২০টি আউটলেট নির্মাণের সংস্থান থাকলেও স্থানীয় জনগণ জমি অধিগ্রহণ ব্যতীত আউটলেট নির্মাণে জমি প্রদানে ইচ্ছুক না হওয়ায় মাত্র ৫টি আউটলেট নির্মাণ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১৫টি আউটলেট নির্মাণ করা সম্ভব হবে না।

২০.৩ প্রকল্পের আওতায় ৭.৫ কি:মি: বীধ নির্মাণের সংস্থান রয়েছে এবং সেটা প্রায় ৫.২০ কি:মি: নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। স্থানীয় জনগণ জমি অধিগ্রহণ ব্যতীত বীধ নির্মাণে জমি প্রদান করতে ইচ্ছুক নন এবং তারা এ বিষয়ে হাইকোর্ট রীট করেছেন। বীধ নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখতে হাইকোর্ট কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয় এবং ০৯/০৫/২০১৯ তারিখে কনটেন্ট অব কোর্টের উকিল নোটিশ প্রেরণ করা হয়। এমতাবস্থায়, অবশিষ্ট ২ কি:মি: বীধ নির্মাণ সমাপ্ত না করতে পারার আশংকা রয়েছে।

২০.৪ প্রকল্পের আওতায় আউটলেট নির্মাণ ও বীধ নির্মাণ কাজ দুটি ব্যতীত অন্যান্য অঙ্গসমূহের কাজ যথাক্রমে ৪টি রেগুলেটর নির্মাণ, ২টি স্লুইস নির্মাণ, খাল খনন এবং নদী তীর সংরক্ষণের কাজসমূহ সমাপ্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের সম্পাদিত কাজসমূহ সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে।

২১. প্রকল্প পরিদর্শনের স্থির/ ডিডিও চিত্র ও বর্ণনা:
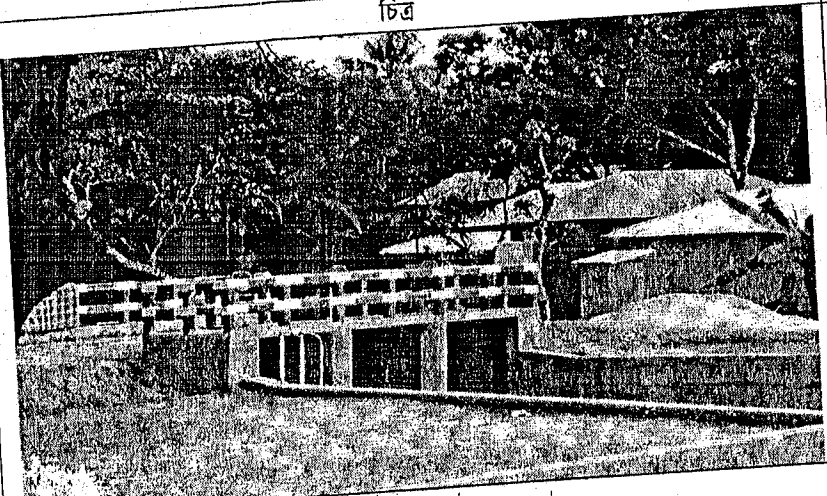
| চিত্র                                                                                | বর্ণনা                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | চিত্র-১: নির্মাণকৃত ঘড়িয়ার বিল ও ভেন্ট রেগুলেটর |
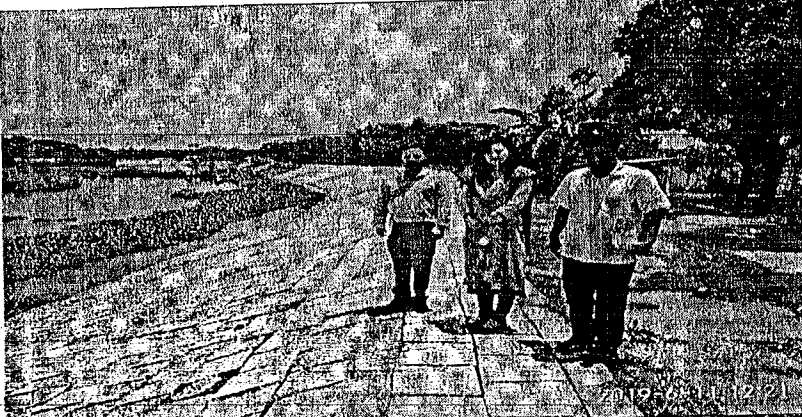
|                                                                                     |                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>চিত্র-২: প্রকল্পের<br/>আওতায় সম্পাদিত<br/>তীর সংরক্ষণ কাজ<br/>পরিদর্শনরত<br/>আইএমইডি'র প্রতিনিধি</p> |
|  | <p>চিত্র-৩: প্রকল্পের<br/>আওতায় নির্মাণকৃত বাঁধ</p>                                                     |

## ২২. সুপারিশ/মতামত:


২২.১ আলোচ্য প্রকল্পের অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৯। মে, ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩২৪৭.২৯ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৮৫%। প্রকল্পের আরো ১৭৭৫.৭১ লক্ষ টাকা এবং ১৫% বাস্তব কাজ অবশিষ্ট রয়েছে। অবশিষ্ট কাজের বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে (অনুচ্ছেদ ১৭.১, ১৭.৪, ১৭.৭ ও অনুচ্ছেদ ১৮);

২২.২. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদনাধীন কাজ রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে;

২২.৩ খননকৃত খালের মাটিসমূহ ম্যানেজমেন্টের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে, যেন বৃষ্টির পানি পুনরায় খালে পড়ে না যায়;

২২.৪ প্রকল্প সমাপ্তির ৩ মাসের মধ্যে প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর) আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে;

২২.৫ অনুচ্ছেদ ২২.১ – ২২.৪ পর্যন্ত সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আগামী ১(এক) মাসের মধ্যে আইএমইডি-কে অবহিত করতে হবে।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা  
  
 ০২.০৭.২০২০  
 (লসমী চাকমা)  
 সহকারী পরিচালক

