



প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর): আইএমইডি ০৪/২০২৪ (সংশোধিত)

প্রকল্পের নাম: নওগাঁ জেলার খামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন ও আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।

প্রকল্পের মেয়াদকাল: জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪।

বিভাগ: নওগাঁ পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, নওগাঁ।

সার্কেল: রাজশাহী পানি উন্নয়ন সার্কেল, বাপাউবো, রাজশাহী।

জোন : উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, রাজশাহী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর): আইএমইডি ০৪/২০২৪ (সংশোধিত)

ক. প্রকল্পের বিবরণী:

০১	প্রকল্পের নাম	:	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন ও আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
০২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
০৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
০৪	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর/ বিভাগ	:	কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
০৫	প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	:	বিনিয়োগ।

০৬	প্রকল্পের অবস্থান (প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)	:	
ক্রমিক	বিভাগ	জেলা	মহানগর/পৌরসভা/উপজেলা
১।	রাজশাহী	নওগাঁ	ধামুইরহাট, পল্লীতলা, মহাদেবপুর।

০৭. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়), বাস্তবায়নকাল এবং অনুমোদন:

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়			বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	মেয়াদ ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
	মোট	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন				
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
মূল	১৭৯৪৭.০৫	১৭৯৪৭.০৫	-	১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২২	০৬-০৭-২০২০	-	একনেক
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (১ম বার)	১৭৯৪৭.০৫	১৭৯৪৭.০৫	-	১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২৩	২০-০৭-২০২২	-	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
১ম সংশোধন	১৭৬৩৬.৪১	১৭৬৩৬.৪১	-	১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২৩	১৫-০৬-২০২৩	-	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (২য় বার)	১৭৬৩৬.৪১	১৭৬৩৬.৪১	-	১ জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪	২৬-০৭-২০২৩	-	পরিকল্পনা কমিশন
অর্থনৈতিক কোড সংশোধন (অন্তর্ভুক্ত ব্যয় সমন্বয়)	১৭৬৩৬.৪১	১৭৬৩৬.৪১	-	১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন, ২০২৪	১০-০১-২০২৪	-	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়



০৮. প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

৮.১ সার্বিক (যদি থাকে)

- পুরাতন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন কাজ বাস্তবায়িত হলে প্রকল্পগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধিসহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
- নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট, কৃষি জমি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বীধ, হাট-বাজার ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সম্পদ নদী ভাঞ্জন হতে রক্ষা করা।
- ডেজিং এবং খাল খনন কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদী/খালের নাব্যতা, পানি ধারণ ক্ষমতা এবং কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- নদীর গতি পথ পরিবর্তন রোধ করা।
- প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

৮.২ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য (বুলেট আকারে সংক্ষিপ্ত):

- আত্রাই নদীর ভাঞ্জন কবলিত অংশের ভাঞ্জন কমিয়ে নদী ব্যবস্থাপনার উন্নতি করা।
- আত্রাই নদীর নাব্যতা ও পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীধ পুনঃরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি করা।

০৯. প্রকল্পের গটভূমি (সংক্ষিপ্ত)

প্রকল্পটি আত্রাই নদীকে কেন্দ্র করে প্রস্তুত করা হয়। আত্রাই নদীটি ভারত থেকে উৎপত্তি হয়ে বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া উপজেলার ভোজনপুর ইউনিয়ন দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড় সদর, বোদা, দেবীগঞ্জ, বীরগঞ্জ, খানসামা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার মালিজল নামক স্থানে আত্রাই নদী নাম ধারণ করে দিনাজপুর সদর হয়ে নদীটি ভারতে প্রবেশ করেছে। পুনরায় আত্রাই নদীটি ভারত হতে নওগাঁ জেলার ধামুরহাট উপজেলার শীমুলতলী দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার পোটাঙ্গিয়া ইউনিয়নে হুঁসাগর নদীতে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশ নদী মাতৃক দেশ। নদী ভাঞ্জন একটি প্রতিনিয়ত ঘটনা। আত্রাই নদীটি মরফলোজিক্যালি Meandering প্রকৃতির। আত্রাই নদীর প্রবাহ পথে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা নদীর গতি প্রকৃতি পরিবর্তনের কারণে ভাঞ্জন কবলিত হয়। আত্রাই নদীর ডান/বাম তীরে নওগাঁ জেলার ধামুরহাট উপজেলার পূর্ব নন্দনপুর, উদয়শ্রী; পল্লীতলা উপজেলার পাটিচড়া, বৈরাগীপোতা, মহাশ্মশান, মাহমুদপুর, ইছাপুড়, মহাদেবপুর উপজেলার নুরপুর ও কলোনীপাড়া ইত্যাদি এলাকাসমূহ ব্যাপক ভাঞ্জনের সম্মুখীন হয়। এ ভাঞ্জন অব্যাহত থাকলে এ বিশাল জনবসতি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেত। এতে, অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হতো। তাছাড়া, আত্রাই নদীর ডানতীর বরাবর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীধ, নদীতীর থেকে মাত্র ১৫০ মিটার দূরে, কোথাও একেবারে সন্নিকটে অবস্থান করে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা না নিলে এ ভাঞ্জন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীধকে স্পর্শ করতো। ফলে, বন্যার প্রবনতা বেড়ে যেতো, মানুষের দুর্ভোগ বাড়তো, কৃষি ফসলের উৎপাদন ও নিবিড়তা কমে যেত। আত্রাই নদীর বামতীর ঘেঁষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। এখানে, হাইস্কুল, মসজিদ, মন্দির, মাদ্রাসা, কলেজ, গীর্জা, আধাপাকা, পাকা ঘরবাড়ি, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি রয়েছে। আত্রাই নদীর বামতীর বরাবর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীধ নদীতীর থেকে মাত্র ২০-২৫ মিটার দূরে ছিল। কোথাও, একেবারে নিকটবর্তী রয়েছে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা না নিলে বসতভিটা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কৃষি জমি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীধ ভেঙ্গে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেত। ফলে, হাজার হাজার মানুষ ভূমিহীন, গৃহহীন হয়ে কর্মবিমুখ অবস্থায় মানবেতর জীবন যাবন করতো। অত্র একালার মাটির প্রকৃতি বালিযুক্ত হওয়ায় আত্রাই নদীর পানির তোড়ে এবং ফ্লাসি ফ্লাডের কারণে অতিদ্রুত নদীতীর ভাঞ্জনের সম্মুখীন হয়। বর্তমানে নওগাঁ পওর বিভাগের আওতায় সম্পাদিত ৩টি প্রকল্প যথা- (১) আত্রাই নদীর ডানতীর বীধ নির্মাণ প্রকল্প (২) ছিলিমপুর-সালিগ্রাম উপ-প্রকল্প (৩) পল্লীতলা উপ-প্রকল্প এর কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে। বিধায়, এ প্রকল্প ৩টির পুনর্বাসন প্রয়োজন। পুনর্বাসন কাজ সম্পাদন করা গেলে প্রকল্প ৩টির উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হবে এবং কার্যকারিতা অনেক গুন বৃদ্ধি পাবে। উপযুক্ত প্রেক্ষাপটে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

১০. প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

ক্রঃ নং	প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ	:	মোট দৈর্ঘ্য/সংখ্যা
১	নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ	:	৫.১৪৫ কিলোমিটার
২	বীধ পুনঃরাকৃতিকরণ কাজ	:	১৭.১৬৪ কিলোমিটার
৩	নদী ডেজিং কাজ	:	২৭.০০০ কিলোমিটার
৪	খাল পুনঃখনন কাজ	:	৬.০০০ কিলোমিটার
৫	রেগুলেটর মেরামত	:	৫টি

১১. প্রকল্প সংশোধনের কারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার বুড়াশিবতলা নামক স্থানে ১০০ মিটার নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করায় ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে বুড়াশিবতলা নামক স্থানে ১০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষনমূলক কাজের প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া, নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার উদয়শ্রী নামক স্থানে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাড়িঘর, দোকান ও রাঙ্গামাটি নামক স্থানে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ, পাকা রাস্তা, ফসলি জমি এবং পল্লীতলা উপজেলার নজিপুর পৌরসভার বাদপুইয়া শিমুলতলী নামক স্থানে শ্মশানঘাট আত্রাই নদী ভাঙ্গনের কবল থেকে রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষনমূলক কাজ বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সাংসদ সদস্য ডিও লেটারের মাধ্যমে অনুরোধ করেন। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত স্থানসমূহে নদীতীর সংরক্ষনমূলক কাজ বাস্তবায়নের জন্য সদয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে উদয়শ্রী নামক স্থানে ১৪৫ মিটার, রাঙ্গামাটি নামক স্থানে ৮০০ মিটার এবং বাদপুইয়া শিমুলতলী নামক স্থানে ১০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষনমূলক কাজের প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে, ১১৪৫ মিটার নতুন নদীতীর সংরক্ষনমূলক কাজ অন্তর্ভুক্তিকরনের জন্য প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে ২৬২২.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পায়। বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজের Working Design অনুযায়ী প্রাক্কলন প্রস্তুত করায় প্রাক্কলিত মূল্য ডিপিপি মূল্যের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির কারণে খাল পুনঃখনন কাজটি ডিজাইন প্রশস্ততায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ফলে, খাল পুনঃখনন কাজের ব্যয় ৩১.১৪ লক্ষ টাকা হ্রাস পেয়েছে। বর্ষা মৌসুমের পূর্বে জরিপ কাজ সম্পন্ন করে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হলেও প্রি-ওয়ার্ক জরিপ গ্রহন কাজ বর্ষা মৌসুমের পরে সম্পন্ন করা হয়। বর্ষা মৌসুমে নদীর মরফোলজিকাল পরিবর্তন হওয়ায় প্রি-ওয়ার্ক জরিপে নদী ড্রেজিং কাজের মূল প্রাক্কলনের তুলনায় প্রয়োজনীয় ড্রেজিং এর ভলিউম হ্রাস পেয়েছে। ফলে, প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে নদী ড্রেজিং কাজের ব্যয় হ্রাস পেয়েছে।

১২. ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

১ম বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি:

প্রকল্পটি ০৬-০৭-২০২০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৯.১৭-৭৯, তারিখ: ২১/০৯/২০২০ মোতাবেক প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন আদেশ জারি করা হয়। পৃথিবী ব্যাপী মহামারী করোনা ভাইরাসের ব্যাপকতার ফলে নির্মাণ সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা এবং শ্রমিক সংকটের কারণে প্রকল্পটির ভৌত কাজ জুন ২০২৩ এর মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভব হয় নাই। ফলে, পরিকল্পনা কমিশনের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের স্মারক নং-২০.০০.০০০০.১১১.১৪. ২৩৪.২০২০-৩৩৯, তারিখ: ১৭/০৭/২০২২ মোতাবেক ১ জুলাই, ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পটির সময় বৃদ্ধি করা হয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৯.১৭-১৭, তারিখ: ২০/০৭/২০২২ মোতাবেক প্রশাসনিক অনুমোদন আদেশ জারি করা হয়।

২য় বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি:

প্রকল্পটির ২য় স্টিয়ারিং কমিটির সভা ০৫-০৬-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় এবং মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি প্রকল্পটির সাইট ১৭-০৬-২০২২ ও ১৮-০৬-২০২২ তারিখে সাইট পরিদর্শন করেন। মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, তৎসময়ে প্রকল্পটির ভৌত কাজের ১৬টি প্যাকেজের মধ্যে ১৫টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান করা হয়। প্রকল্প সংলগ্ন এলাকায় ডিপিপি বহির্ভূত ৩.০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে নদীতীরে ভাঙ্গণ দেখা দেয় এবং ভাঙ্গণের ব্যাপকতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। উক্ত স্থানসমূহে নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা জরুরী হয়ে পড়ে, যার মধ্যে ১.৯৮০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে নদীতীর অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। অধিক ঝুঁকিপূর্ণ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য ডিপিপি সংশোধন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া, প্রকল্পটির কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করার জন্য স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আইএমডি'র সুপারিশের আলোকে পরিকল্পনা কমিশনের স্মারক নং-২০.৩৫৮.০১৪.০১.০১.১৭.২০১৮/৩৬, তারিখ: ২৬/০৭/২০২৩ মোতাবেক প্রকল্পের সকল অঙ্গের কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করার জন্য প্রকল্পটির মেয়াদ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

বাঁধের উপর এলজিইডি'র বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা এবং বন বিভাগ ও ধামুইরহাট কল্যান ট্রাস্টের মধ্যে গাছ নিয়ে মামলা এবং জমি অধিগ্রহণের সামগ্রিক বিষয় বাস্তবতার ভিত্তিতে সমাধানের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ বাপাউবোর কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কারিগরি কমিটি প্রকল্পের বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা, বাস্তবতার নিরীখে এলজিইডি কর্তৃক কার্পেটিং রাস্তা থাকায় এবং সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যে ভূমি অধিগ্রহণ না থাকার কারণে প্যাকেজ নং-Nao-W-07 এর ৪.০০ কিঃমিঃ কাজ রহিতকরন, প্যাকেজ নং-Nao-W-08 এর ৫.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের মধ্যে ২.০৩৪ কিঃমিঃ অংশে ক্যারিড আর্থ দিয়ে, প্যাকেজ নং-Nao-W-09 এর সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য এবং প্যাকেজ নং-Nao-W-10 এর ৭.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের মধ্যে ০.৮৭০ কিঃমিঃ ব্যতিত অবশিষ্টাংশে কাজ বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করেছেন। সে মোতাবেক ২৫ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজের মধ্যে (৯+২.০৩৪+৬.১৩০) বা ১৭.১৬৪ কিঃমিঃ কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অবশেষে জেলা পানি সম্পদ

উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৫.০০ কিলোমিটারের মধ্যে ১৭.১৬৪ কি:মি: বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ বাস্তবায়িত না হওয়ায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয় নাই। প্রকল্পটির মেয়াদ জুন ২০২৩ পর্যন্ত থাকায় প্রকল্পটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করা সম্ভব নয়।

১৩. প্রকল্পের অর্থায়ন (লক্ষ টাকায়):

উৎস ধরন	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন	অন্যান্য	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)=(২+৩+৪)
বিনিয়োগ	১৭৬৩৬.৪১	-	-	১৭৬৩৬.৪১
ঋণ	-	-	-	-
ইকুইটি	-	-	-	-
অনুদান	-	-	-	-
অন্যান্য	-	-	-	-
মোট =	১৭৬৩৬.৪১	-	-	১৭৬৩৬.৪১

খ. বাস্তবায়ন অবস্থা

১৪. বাস্তবায়নকাল:

অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি (মূল মেয়াদের %)	মন্তব্য
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২২ (৭০০ দিন)	১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২৪ (১৪৬১ দিন)	১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২৪ (১৪৬১ দিন)	১০৮.৭১% বৃদ্ধি (৭৬১ দিন)	-

১৫. প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি (মূল ব্যয়ের %)	মন্তব্য
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৭৯৪৭.০৫	১৭৬৩৬.৪১	১৫৪০২.২৮	(-) ১২.৬৭%	বাস্তব অগ্রগতি

১৬. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমানুসারে):

নাম, আইডি, মূল পদবি, গ্রেড ও মোবাইল নম্বর	দায়িত্বের ধরণ		একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত (হ্যাঁ/না)	সময়কাল (তারিখ)		মন্তব্য
	পূর্ণকালীন (হ্যাঁ/না)	অতিরিক্ত দায়িত্ব (হ্যাঁ/না)		যোগদান	অবমুক্তি	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
আরিফউজ্জামান খান আইডি নং-৭৫০৫০১০০৪ নির্বাহী প্রকৌশলী ৫ম গ্রেড ০১৩১৮২৩৫২০৫	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	২৪/০৮/২০২০	১২/০১/২০২৩	-
মোঃ ফাইজুর রহমান আইডি নং-৭৬০৯২১০০১ নির্বাহী প্রকৌশলী ৫ম গ্রেড ০১৩১৮২৩৫২০৫	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	২৯/০৩/২০২৩	৩০/০৬/২০২৪	-

১৭. প্রকল্পের জনবল:

(ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের জনবল: বিদ্যমান রাজস্ব জনবল থেকে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্বে পদায়ন।

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত জনবল	বাস্তবায়নকালে নিয়োগকৃত জনবল
(১)	(২)	(৩)	(৪)
নকশা প্রকৌশলী:			
১।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (৪র্থ গ্রেড)	১	-
২।	নির্বাহী প্রকৌশলী (৫ম গ্রেড)	১	-
৩।	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (৬ষ্ঠ গ্রেড)	১	-
মাঠ কর্মকর্তা:			
১।	প্রধান প্রকৌশলী (৩য় গ্রেড)	১	-
২।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (৪র্থ গ্রেড)	১	-
৩।	নির্বাহী প্রকৌশলী (৫ম গ্রেড)	১	-
৪।	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (৬ষ্ঠ গ্রেড)	৩	-
৫।	সহকারী প্রকৌশলী (৯ম গ্রেড)	১	-
৬।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী/শাখা কর্মকর্তা (১০ম গ্রেড)	৭	-
৭।	সার্ভেয়ার (১৫তম গ্রেড)	৩	-
৮।	কার্য-সহকারী (১৬তম গ্রেড)	৩	-
৯।	করণিক (১৬তম গ্রেড)	১	-
১০।	হিসাব করণিক (১৬তম গ্রেড)	১	-
১১।	অফিস সহায়ক (২০তম গ্রেড)	২	-
১২।	গার্ড/টৌকিদার (২০তম গ্রেড)	১	-
মোট =		২৮	-

(খ) প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রয়োজনীয় জনবলের তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে): প্রযোজ্য নয়।

ক্রমিক নং	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে (হ্যাঁ/না)	নিয়োগ সম্পন্ন না হলে তার কারণ ও সর্বশেষ অবস্থা
	পদের নাম ও গ্রেড	সংখ্যা		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
প্র	যো	জ্য	ন	য়
মোট =		-	-	-

১৮. প্রশিক্ষণ (স্থানীয়/বৈদেশিক):

ধরন	ক্রমিক নং	দিন/সপ্তাহ/মাস, ব্যাচ ও অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা					
		প্রকল্প দলিল অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			প্রকৃত অর্জন		
		দিন/সপ্তাহ/মাস	ব্যাচ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	দিন/সপ্তাহ/মাস	ব্যাচ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
স্থানীয় প্রশিক্ষণ	-	প্র	যো	জ্য	ন	য়	-
উপমোট	-	-	-	-	-	-	-
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	-	প্র	যো	জ্য	ন	য়	-
উপমোট	-	-	-	-	-	-	-
মোট	-	-	-	-	-	-	-

১৯. অজাতিভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (প্রকল্প দলিল অনুযায়ী):

(লক্ষ টাকায়)

অংশের নাম	একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয়				প্রকৃত অর্জন			
			মোট	জিওবি	নিজস্ব	অন্যান্য	মোট	জিওবি	নিজস্ব	অন্যান্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
(ক) রাজস্ব ব্যয়:										
অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	জনদিন	৪৯৮.০০	৫.০০	৫.০০	-	-	৫.০০	৫.০০	-	-
পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	লিটার	৯৩৫৯.০০	১১.০০	১১.০০	-	-	১০.০২	১০.০২	-	-
মুদ্রন ও বীধাই	সেট	১৬৯.০০	২.০০	২.০০	-	-	২.০০	২.০০	-	-
স্ট্যাম্প ও সিল (স্টেশনারীসহ)	প্রতিটি	১৪৬৭.০০	৫.০০	৫.০০	-	-	৪.৯৭	৪.৯৭	-	-
প্রচার ও বিজ্ঞাপন	সেট	১.০০	২.০০	২.০০	-	-	২.০০	২.০০	-	-
শ্রমিক মজুরি (সরকারি কর্মচারী ব্যতীত)	থোক	১.০০	০.৫০	০.৫০	-	-	০.৫০	০.৫০	-	-
সম্মানী ভাতা (পিএসসি, পিআইসি, টিইসি, ডিপিইসি ইত্যাদি)	টি	৩৩.০০	৭.০০	৭.০০	-	-	৭.০০	৭.০০	-	-
সম্মানী ভাতা (মধ্যমেয়াদী মূল্যায়ন বাবদ)	টি	১.০০	৮.০০	৮.০০	-	-	৮.০০	৮.০০	-	-
জরিপ	কিমিঃ	২০.০০	৬.৫০	৬.৫০	-	-	৬.৪৬	৬.৪৬	-	-
মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন :										
মোটরযান (বিদ্যমান যানবাহনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ-৫টি)	টি	৫	৮.০০	৮.০০	-	-	৭.৯১	৭.৯১	-	-
রেগুলেটর মেরামত	টি	৫	৫৫.৪৭	৫৫.৪৭	-	-	৫৫.৪৬	৫৫.৪৬	-	-
উপমোট (রাজস্ব ব্যয়)			১১০.৪৭	১১০.৪৭			১০৯.৩২	১০৯.৩২		
(খ) মূলধন ব্যয়:										
সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয় :										
মোটরযান (মোটরসাইকেল-২টি)	টি	২	৪.০০	৪.০০	-	-	৪.০০	৪.০০	-	-
প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (স্ট্যান্ডসহ লেভেলিং মেশিন-২টি, জিপিএস-১টি)	টি	৩	৩.২০	৩.২০	-	-	৩.৩৫	৩.৩৫	-	-
কম্পিউটার ও আনুষাংগিক (লেজার প্রিন্টার ও আনুষাংগিক যন্ত্রপাতিসহ ব্র্যান্ড কম্পিউটার-২টি)	টি	২	২.০০	২.০০	-	-	২.০০	২.০০	-	-
কম্পিউটার ও আনুষাংগিক (লেজার প্রিন্টারসহ ল্যাপটপ-২টি)	টি	২	২.৫০	২.৫০	-	-	২.৫০	২.৫০	-	-
অফিস সরঞ্জামাদি (ফটোকপিয়ার মেশিন-১টি)	টি	১	১.৫০	১.৫০	-	-	১.৫০	১.৫০	-	-
আসবাবপত্র	থোক	১	৪.০০	৪.০০	-	-	৪.০০	৪.০০	-	-
বৃক্ষ, শস্য ও উদ্ভিদসম্পদ উৎপাদনকারী আবর্তক	সংখ্যা	১৬৯০	১০.০০	১০.০০	-	-	৮.৯২	৮.৯২	-	-

(লক্ষ টাকায়)

অংশের নাম	একক	পরিমাণ	প্রাকলিত ব্যয়				প্রকৃত অর্জন			
			মোট	জিওবি	নিজস্ব	অন্যান্য	মোট	জিওবি	নিজস্ব	অন্যান্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
পণ্য										
নির্মাণ ও পূর্ত কাজ:										
নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ	কিঃমিঃ	৫.১৪৫	৯৮৮৭.২৭	৯৮৮৭.২৭	-	-	৯৫৮৭.২০	৯৫৮৭.২০	-	-
বীধ পুনরাকৃতিকরণ	কিঃমিঃ	২৫.০০	২৯২৫.৯৭	২৯২৫.৯৭	-	-	১৫২৪.৬১	১৫২৪.৬১	-	-
খাল পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৬.০০	৫৭.৫৮	৫৭.৫৮	-	-	৫৭.৫৭	৫৭.৫৭	-	-
নদী ড্রেজিং কাজ	কিঃমিঃ	২৭.০০	৪৪২৭.৯২	৪৪২৭.৯২	-	-	৪০৯৭.৩১	৪০৯৭.৩১	-	-
উপমোট (মূলধন ব্যয়)			১৭৩২৫.৯৪	১৭৩২৫.৯৪			১৫২৯২.৯৬	১৫২৯২.৯৬		
মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন) =			১৭৪৩৬.৪১	১৭৪৩৬.৪১			১৫৪০২.২৮	১৫৪০২.২৮		
(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি			১০০.০০	১০০.০০			-	-		
(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সি			১০০.০০	১০০.০০			-	-		
সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় [(ক)+(খ)+(গ)+(ঘ)]=			১৭৬৩৬.৪১	১৭৬৩৬.৪১			১৫৪০২.২৮	১৫৪০২.২৮		

২০. যানবাহন ক্রয় সংক্রান্ত:

যানবাহনের ধরন	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী সংখ্যা	ক্রয়ের সংখ্যা ও ক্রয়ের তারিখ	সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিবহন পুলে হস্তান্তরের সংখ্যা ও তারিখ	ও এন্ড এম-এ হস্তান্তরের সংখ্যা, মেমো নং, তারিখ	বাতিল ঘোষণা হয়ে থাকলে তার সংখ্যা, মেমো নং, তারিখ	পরবর্তীতে ফেরৎ/স্থানান্তর	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
কার			প্রযোজ্য নয়				
জীপ			ঐ				
মাইক্রোবাস			ঐ				
মিনিবাস			ঐ				
বাস			ঐ				
পিক-আপ			ঐ				
ট্রাক			ঐ				
মটর সাইকেল	০২ টি	০২ টি	০২ টি, ৪২.০১.৬৪০০.৪০৫.২৪. ০০১.২৪-৩৪০, ৩০/০৬/২০২৪	০২ টি, ৩০/০৬/২০২৪	-	-	অত্র দপ্তরের দাপ্তরিক কাজের স্বার্থে ক্রয়কৃত মোটর সাইকেল ২টি বর্ণিত প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।
বাইসাইকেল			প্রযোজ্য নয়				
স্পিডবোট			ঐ				
লঞ্চ			ঐ				
অন্যান্য			ঐ				

২১. প্রকল্পের পরামর্শক সংক্রান্ত (স্থানীয়/বৈদেশিক):

পরামর্শকের ধরন	জন-মাস		প্রকৃত জন-মাস এর তথ্য	ডেলিভারেবলের সংখ্যা		মন্তব্য
	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী	চুক্তি অনুযায়ী		প্রকল্প দলিল অনুযায়ী	প্রকৃত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
ক) স্থানীয়	প্র	যো	জ্য	ন	য়	-
খ) বৈদেশিক	প্র	যো	জ্য	ন	য়	-

২২. অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি স্থাপন:

অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতির বিবরণ	পরিমাণ (প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)	ক্রয়ের পরিমাণ (তারিখসহ)	ও এন্ড এম-এ হস্তান্তরের তারিখ	বিধি অনুযায়ী বাতিল ঘোষণার তারিখ	অবশিষ্ট	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
-	প্র	যো	জ্য	ন	য়	

২৩. পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

২৩.১ প্যাকেজসমূহের এর তথ্য:

ক) প্রকল্প দলিল অনুযায়ী মোট প্যাকেজের সংখ্যা: ২৬ টি; তার মধ্যে পণ্য ০৭ টি, কার্য ১৯ টি ও সেবা ০ টি।

খ) ক্রয়কৃত মোট প্যাকেজের সংখ্যা: ২৬ টি; তার মধ্যে পণ্য ০৭ টি, কার্য ১৯ টি ও সেবা ০ টি।

গ) কোন প্যাকেজের ক্রয় সম্পন্ন না হলে তার কারণ (যদি থাকে):

বীধের উপর এলজিইডি'র বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা এবং বন বিভাগ ও ধামুইরহাট কল্যান ট্রাস্টের মধ্যে গাছ নিয়ে মামলা এবং জমি অধিগ্রহণের সামগ্রিক বিষয় বাস্তবতার ভিত্তিতে সমাধানের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ বাপাউবোর কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কারিগরি কমিটি প্রকল্পের বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা, বাস্তবতার নিরীখে এলজিইডি কর্তৃক কার্পেটিং রাস্তা থাকায় এবং সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যে ভূমি অধিগ্রহণ না থাকার কারণে প্যাকেজ নং-Nao-W-07 এর ৪.০০ কি:মি: কাজ রহিতকরন, প্যাকেজ নং-Nao-W-08 এর ৫.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের মধ্যে ২.০৩৪ কিঃমিঃ অংশে ক্যারিড আর্থ দিয়ে, প্যাকেজ নং-Nao-W-09 এর সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য এবং প্যাকেজ নং-Nao-W-10 এর ৭.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের মধ্যে ০.৮৭০ কি:মি: ব্যতিত অবশিষ্টাংশে কাজ বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করেছেন। সে মোতাবেক ২৫ কি:মি: বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজের মধ্যে (৯+২.০৩৪+৬.১৩০) বা ১৭.১৬৪ কি:মি: কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অবশেষে জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৫.০০ কিলোমিটারের মধ্যে ১৭.১৬৪ কি:মি: বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট কাজ বাস্তবায়িত না হওয়ায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয় নাই।

ঘ) যে সকল প্যাকেজের প্রাক্কলিত মূল্য প্রকল্পের মোট অনুমোদিত প্রাক্কলিত মূল্যের ১% এর বেশী তার সংখ্যা: ১৬টি; তার মধ্যে পণ্য ০ টি, কার্য ১৬ টি ও সেবা ০ টি।

২৩.২ প্যাকেজ ভিত্তিক পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের তথ্য (প্রতি ক্ষেত্রে ব্যয়ের ক্রমানুসারে সর্বোচ্চ ৫০টি প্যাকেজ): সংযুক্তি-ক, সংযুক্তি-খ এবং সংযুক্তি-গ অনুযায়ী তথ্যাদি প্রদান করতে হবে।

সংযুক্ত করা হয়েছে।

গ. আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন

২৪. মূল এবং সর্বশেষ সংশোধিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রকল্পের বহরভিত্তিক আর্থিক বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (মূল প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)				আর্থিক ও বাস্তব অর্জন (সর্বশেষ সংশোধিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)			
	মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন	বাস্তব (%)	মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০২০-২১	১০৩৩৪.৮১	১০৩৩৪.৮১	-	৫৯%	১৪৫.০৫	১৪৫.০৫	-	০.৮২%
২০২১-২২	৭৬১২.২৪	৭৬১২.২৪	-	৪১%	৩৯৯৯.৯৫	৩৯৯৯.৯৫	-	২২.৬৮%
২০২২-২৩	-	-	-	-	৬৪৯৫.০৩	৬৪৯৫.০৩	-	৩৬.৮৩%
২০২৩-২৪	-	-	-	-	৬৯৯৬.৬৪	৬৯৯৬.৬৪	-	৩৯.৬৭%
সর্বমোট =	১৭৯৪৭.০৫	১৭৯৪৭.০৫	-	১০০%	১৭৬৩৬.৪১	১৭৬৩৬.৪১	-	১০০.০০%

২৫. সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং আর্থিক ও বাস্তব অর্জন:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা				অর্থছাড় জিওবি	আর্থিক ও বাস্তব অর্জন				অব্যয়িত হাড়কৃত জিওবি
	মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন	বাস্তব (%)		মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন	বাস্তব (%)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
২০২০-২১	১৪৭.০০	১৪৭.০০	-	০.৯৪%	১৪৭.০০	১৪৪.৯৫	১৪৪.৯৫	-	১.৮২%	২.০৫
২০২১-২২	৪০০০.০০	৪০০০.০০	-	২৫.৯৭%	৪০০০.০০	৩৯৯৯.৯৭	৩৯৯৯.৯৭	-	২৪.৬৮%	০.০৩
২০২২-২৩	৫৯৯৯.৩১	৫৯৯৯.৩১	-	৩৮.৯৫%	৫৯৯৯.৩১	৫৯৯৯.৩১	৫৯৯৯.৩১	-	৩৬.০২%	০.০০
২০২৩-২৪	৫৬৫০.০০	৫৬৫০.০০	-	৩৪.১৪%	৫৫৮৪.২৪	৫২৫৮.০৫	৫২৫৮.০৫	-	৩২.৮১%	৩২৬.১৯
সর্বমোট =	১৫৭৯৬.৩১	১৫৭৯৬.৩১	-	১০০.০০%	১৫৭৩০.৫৫	১৫৪০২.২৮	১৫৪০২.২৮	-	৯৫.৩৩%	৩২৮.২৭

নোট: ১। হাড়কৃত জিওবি অর্থের অব্যয়িত অংশের সমন্বয় সংক্রান্ত প্রমাণক সংযুক্ত করতে হবে;

২। পরিকল্পনা বিভাগের জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী ফর্মুলা ব্যবহার করে বাস্তব অগ্রগতির হার নির্ধারণ করতে হবে।

ঘ. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন

২৬. প্রকল্পের উদ্দেশ্য, প্রকৃত অর্জন ও উদ্দেশ্য অর্জনে ঘাটতির কারণ (যদি থাকে):

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন	অর্জনে ঘাটতি থাকলে তার কারণ
নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ	৫.১৪৫ কিলোমিটার	-
বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ	১৭.১৬৪ কিলোমিটার	বীধের উপর এলজিইডি'র বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা এবং বন বিভাগ ও ধামুইরহাট কল্যান ট্রাস্টের মধ্যে গাছ নিয়ে মামলা এবং জমি অধিগ্রহণের সামগ্রিক বিষয় বাস্তবতার ভিত্তিতে সমাধানের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ বাপাউবোর কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত (৫পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কারিগরি কমিটি প্রকল্পের বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা, বাস্তবতার নিরাখে এলজিইডি কর্তৃক কার্পেটিং রাস্তা থাকায় এবং সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যে ভূমি অধিগ্রহণ না থাকার কারণে প্যাকেজ নং-Nao-W-07 এর ৪.০০ কি:মি: কাজ রহিতকরণ, প্যাকেজ নং-Nao-W-08 এর ৫.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের মধ্যে ২.০৩৪ কিঃমিঃ অংশে ক্যারিড আর্থ দিয়ে, প্যাকেজ নং-Nao-W-09 এর সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য এবং প্যাকেজ নং-Nao-W-10 এর ৭.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের মধ্যে ০.৮৭০ কি:মি: ব্যতিত অবশিষ্টাংশে কাজ বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করেছেন। সে মোতাবেক ২৫ কি:মি: বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজের মধ্যে (৯+২.০৩৪+৬.১৩০) বা ১৭.১৬৪ কি:মি: কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অবশেষে জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৫.০০ কিলোমিটারের মধ্যে ১৭.১৬৪ কি:মি: বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
নদী ড্রেজিং কাজ	২৭.০০০ কিলোমিটার	-
খাল পুনঃখনন কাজ	৬.০০০ কিলোমিটার	-
রেগুলেটর মেরামত	৫টি	-

৩. বেনিফিট বিশ্লেষণ

২৭. বার্ষিক আউটপুট:

ক্র. নং	আউটপুটসমূহ	একক	প্রত্যাশিত উৎপাদনের পরিমাণ (পূর্ণ মাত্রায় কার্যকর হলে)	পূর্ণমাত্রায় কার্যকর হবার পর ১ম বছরের প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ
১	উপজেলা হাসপাতাল	সংখ্যা	৩	৩
২	পশু হাসপাতাল	সংখ্যা	৩	৩
৩	কলেজ	সংখ্যা	৫	৫
৪	উচ্চ বিদ্যালয়	সংখ্যা	১৫	১৫
৫	প্রাথমিক বিদ্যালয়	সংখ্যা	৩১	৩১
৬	প্রাইভেট ক্লিনিক	সংখ্যা	১০	১০
৭	দোকানঘর	সংখ্যা	১০৫	১০৫
৮	মসজিদ	সংখ্যা	১০	১০
৯	মন্দির	সংখ্যা	৭	৭
১০	খাদ্যগুদাম	সংখ্যা	২০	২০
১১	রেজিস্টার অফিস	সংখ্যা	৩	৩
১২	ধানের চাটাল	সংখ্যা	৪০	৪০
১৩	ইদগাহ	সংখ্যা	৬	৬
১৪	কাঠের মিল	সংখ্যা	৫	৫
১৫	কাঁচাবাড়ি	সংখ্যা	২০০৫	২০০৫
১৬	পাকাবাড়ি	সংখ্যা	৫০৩	৫০৩
১৭	পুলিশ স্টেশন	সংখ্যা	৩	৩
১৮	অফিস বিল্ডিং (সরকারী/ আধা সরকারী)	সংখ্যা	৪০	৪০
১৯	কবরস্থান	সংখ্যা	৬	৬
২০	বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিশন লাইন	কিঃমিঃ	৩০	৩০
২১	বাঁধ	কিঃমিঃ	৭৫	৭৫
২২	রাস্তা	কিঃমিঃ	৪৫	৪৫
২৩	কালভার্ট/ব্রিজ/রেগুলেটর	সংখ্যা	৫০	৫০

২৮. কস্ট বেনিফিট:

বিবরণ	প্রাক্কলিত	প্রকৃত
(১) প্রকল্পের বেনিফিট কস্ট - এর অনুপাত (ক) আর্থিক (খ) অর্থনৈতিক (২) ইনটারনাল রোট অব রিটার্ন (ক) আর্থিক (খ) অর্থনৈতিক	(১) প্রকল্পের বেনিফিট কস্ট - এর অনুপাত (ক) আর্থিক : - (খ) অর্থনৈতিক : ১.৪২ : ১.০০ (২) ইনটারনাল রোট অব রিটার্ন (ক) আর্থিক : - (খ) অর্থনৈতিক : ১৯.১০	পরবর্তীতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং পরিকল্পনা কমিশনের আইএমইডি কর্তৃক মূল্যায়ন করা হবে।

২৯. প্রকল্পের প্রত্যাশিত ও প্রকৃত বেনিফিটের মধ্যে কোন ঘাটতি থাকলে তার কারণ উল্লেখ করুন: প্রযোজ্য নয়।

৮. পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষণ

৩০. প্রকল্প বাস্তবায়নকালের পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত:

পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিবীক্ষণের তারিখ	উল্লেখযোগ্য সমস্যা	সুপারিশসমূহ	সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
ক) আইএমইডি এস. এম. রেজাউল মোস্তফা কামাল অতিরিক্ত সচিব (পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও আল্ফায়েক মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি।	১৭/০৬/২০২২ হতে ১৮/০৬/২০২২	স্পেসিফিকেশন বর্হিভূত ম্যাটেরিয়ালস ব্যবহার, সিসি ব্লকের টেস্ট বুয়েট/বুয়েটে করতে হবে।	১। সাইটে বিদ্যমান পাথর ভালো মানের হতে হবে। ২। ডিজাইন বিভাগের সহায়তায় বীধ পুনরাকৃতিকরন কাজের উচ্চতার যৌক্তিকতা বিবেচনা করতে হবে। ৩। পূর্ব পাটিচড়া নামকস্থানে প্যাকেজ-২ এর অর্ন্তগত নদীতীর সংরক্ষন কাজের ব্লকের Horizontal Top এর দৈর্ঘ্য একটি রিক্সা/ভ্যান চালানোর মতো প্রশস্থ রাখতে হবে। ৪। বুড়া শিবতলার ২টি মন্দির ও শশমান নদী ভাঙ্গণের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। উক্ত মন্দির ও শশমান রক্ষার্থে উক্তস্থানটির নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। ৫। কনক্রিট ব্লকের গুনাগুণ পরীক্ষা বাপাউবো'র ল্যাবরেটরীরর পরিবর্তে BUET/RUET করতে হবে। ৬। নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজে সাধারণ মানুষের উঠা-নামার সুবিধার্থে কনক্রিটে ব্লক দিয়ে ঘাটলা তৈরী করতে হবে। ৭। বীধ পুনরাকৃতিকাজে বীধের স্লোপ ডিজাইন অনুযায়ী, বীধে ঘাস ও বৃক্ষরোপন করতে হবে। ৮। বীধের নিকট হতে মাটি কাটা যাবে না এবং লেয়ার অনুযায়ী কম্প্যাকশন করতে হবে। ৯। ডেজড ম্যাটেরিয়ালস ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে করতে হবে যেন কোন ডেজড ম্যাটেরিয়ালস অপচয় না হয়।	১। সাইটে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ভালো মানের পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। ২। ডিজাইন বিভাগ সর্বোচ্চ পানি সমতল বিবেচনা করে বীধ পুনরাকৃতিকরন কাজের ডিজাইন দিয়েছেন। ৩। পূর্ব পাটিচড়া নামকস্থানে প্যাকেজ-২ এর অর্ন্তগত নদীতীর সংরক্ষন কাজে ব্লকের Horizontal Top এর দৈর্ঘ্য ১.০০ মিটার করা হয়েছে। ৪। বুড়া শিবতলার ২টি মন্দির ও শশমান নদী ভাঙ্গণের কবল থেকে রক্ষার জন্য তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ৫। কনক্রিট ব্লকের গুনাগুণ পরীক্ষা বাপাউবো'র ল্যাবরেটরী ছাড়াও বুয়েট/বুয়েটে টেস্ট করা হয়েছে। ৬। নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজে সাধারণ মানুষের উঠা-নামার সুবিধার্থে কনক্রিটে ব্লক দিয়ে ঘাটলা তৈরী করা হয়েছে। ৭। বীধ পুনরাকৃতি কাজে ডিজাইন অনুযায়ী, বীধে ঘাস ও বৃক্ষরোপন করা হয়েছে। ৮। বীধের নিকট হতে মাটি কাটা হয় নাই এবং লেয়ার অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে কম্প্যাকশন টেস্ট করা হয়েছে। ৯। উপজেলা কমিটির মাধ্যমে যথাযথভাবে ডেজড ম্যাটেরিয়ালস ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে।
জনাব উপমা আকতার উপ-পরিচালক	১৮/১২/২০২১	নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি	(১) প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত হলেও	(১) প্রকল্পের অনুকূলে চলতি অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ

পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিবীক্ষণের তারিখ	উল্লেখযোগ্য সমস্যা	সুপারিশসমূহ	সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ (কৃষি ও পানি সম্পদ) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।		সন্তোষজনক নয়। প্রকল্পটির কাজে বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয়। প্রকল্পের আওতায় বীধ পুনরাকৃতিকরণ, ড্রেজিং, খাল পুনঃখনন কাজের সকল প্যাকেজে কাজ আরম্ভ হয় নাই।	নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। এ বিবেচনায় প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে না বলে মর্মে প্রতীয়মান হয়। প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজিত অগ্রগতি না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে।	৪০০০.০০ লক্ষ টাকা। অপ্রতুল বরাদ্দ, নির্মাণ সমাপ্তি যথা-পাথর ও সিমেন্টের দাম বৃদ্ধি এবং পাথরের দুস্প্রাপ্যতা প্রভৃতি কারণে নভেম্বর/২০২১ পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি কম থাকলেও মার্চ/২০২২ পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সন্তোষজনক ছিল।
			(২) প্রকল্পটির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, প্রকল্পের অনুকূলে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ হতে মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ পূর্বক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। (৩) প্রকল্পের আওতায় বীধ পুনরাকৃতিকরণ, ড্রেজিং, খাল পুনঃখনন কাজের বিদ্যমান সমস্যা দ্রুত সমাধান করে চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ করতে হবে। (৪) নদীর তীর সংরক্ষণের ক্ষেত্রে নির্মিত রকগুলো পরবর্তী বর্ষার পূর্বেই ডাম্পিং ও গ্লেসিং সম্পন্ন করতে হবে।	(২) প্রকল্পটির কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং প্রকল্পের অনুকূলে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগের করা হয়। (৩) প্রকল্পের আওতায় ড্রেজিং ও খাল পুনঃখনন কাজের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানপূর্বক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। (৪) নদীতীর সংরক্ষণ কাজের নির্মিত রকগুলোর ডাম্পিং ও গ্লেসিং কাজ বর্ষার পূর্বেই তা সম্পন্ন করা হয়েছে।
মোহাম্মদ সাইফুর রহমান উপপরিচালক আইএমইডি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪	০৮/০৫/২০২২	প্রকল্পের সময় বর্ধিতকরণ, স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ম্যাটেরিয়ালস ব্যবহার এবং প্রকল্প মনিটরিং বৃদ্ধিকরন।	(১) কোভিড-১৯ এর কারণে প্রকল্পের বেশির ভাগ প্যাকেজের কাজই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না। বিধায়, ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০১(এক) বছর বৃদ্ধি করতে হবে। (২) প্রকল্পের বিভিন্ন সাইটে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী চুক্তিতে উল্লিখিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে এবং প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুবিধার্থে মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও প্রকল্প পরিচালক নিবিড় পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করবে।	(১) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০১৪. ১৪.০১৯.১৭-১৭, তারিখঃ ২০- ০৭-২০২২ খ্রিঃ মোতাবেক প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জুন/২০২৩ পর্যন্ত ০১(এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। (২) প্রকল্পের বিভিন্ন সাইটে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী চুক্তিতে উল্লিখিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুবিধার্থে মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও প্রকল্প পরিচালক নিবিড় পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করছেন।

পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিবীক্ষণের তারিখ	উল্লেখযোগ্য সমস্যা	সুপারিশসমূহ	সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
খ) মন্ত্রণালয়/সংস্থা:				
মোহাম্মদ আব্দুর রহিম রিপন উপ-সচিব, পরিকল্পনা-৩ শাখা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	১১/০১/২০২৪	বীধ পুনরাকৃতিকরণ ৪টি প্যাকেজের কাজে বীধের উপরে এলজিইডি'র কার্পেটিং রাস্তা ও গাছ থাকায় শতভাগ কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না।	(৩) বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজের প্যাকেজ নং-Nao-W- 07 এর ৪.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৩.৭০৬ কিঃমিঃ অংশে এলজিইড কর্তৃক কার্পেটিং রাস্তা রয়েছে এবং ডিজাইন অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়নের জন্য জমি অধিগ্রহণ না থাকায়, এ প্যাকেজের কাজ রহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্যাকেজ নং-Nao-W-08 এর ৫.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ২.০৩৪ কিঃমিঃ, Nao-W-09 এর ৯কিঃমিঃ এবং Nao-W-10 এর ৭ কিঃমিঃ এর মধ্যে ৬.১৩০ কিঃমিঃ কাজ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	(৩) কারিগরী কমিটির সুপারিশের আলোকে, প্যাকেজ নং-Nao-W-07 এর কাজ রহিত করা হয় এবং প্যাকেজ নং-Nao-W-08 এর ২.০৩৪ কিঃমিঃ, প্যাকেজ নং-Nao- W-09 এর ৯কিঃমিঃ, প্যাকেজ নং-Nao-W-10 এর ৬.১৩০ কিঃমিঃ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটিতে বিস্তারিত আলোচনা করে এ তিনটি প্যাকেজকে এ পর্যায়ে সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।
মোঃ রবিউল আলম, যুগ্মসচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	১৬/০৫/২০২৪	বর্ষা মৌসুমের পূর্বেই পিচিং কাজ সম্পন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে সিসি ব্লক ডাম্পিং।	ডিজাইন অনুসরণ করে দ্রুত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ ও বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ সমাপ্ত করতে হবে এবং সমাপ্ত নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজের সার্ভে করে যে সমস্ত স্থানে ডাম্পিং ম্যাটারিয়ালস সরে গিয়েছে, সে সমস্ত স্থানে সংরক্ষিত Stock Pile ডাম্পিং করা যেতে পারে।	ডিজাইন অনুসরণ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ ও বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে এবং সমাপ্ত নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজের সার্ভে করে যে সমস্ত স্থানে ডাম্পিং ম্যাটারিয়ালস সরে গিয়েছে, সে সমস্ত স্থানে সংরক্ষিত Stock Pile ডাম্পিং করার জন্য নোটশীট প্রেরণ করা হয়েছে।
গ) অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে)				
নাসিমা জাহান তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিজাইন সার্কেল-৭, বাপাউবো, ঢাকা	১৩/০২/২০২৩	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি ও স্থানীয় সাংসদের ডিও লেটারের স্বাপেক্ষে খামুইরহাট উপজেলার রাজামাটি নামকস্থানে ৮০০ মিটার ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় নদীতীর সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বাপাউবোর প্রধান কার্যালয়ের প্রতিনিধি পরিদর্শনপূর্বক মতামত প্রেরণ করবেন।	নওগাঁ জেলার খামুইরহাট উপজেলার রাজামাটি নামকস্থানে প্রস্তাবিত নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজের স্থানে নদীতীর ঝুঁকিপূর্ণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীধের নিকটবর্তী হওয়ায় রাজামাটি নামকস্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে ৮০০ মিটার স্থায়ী নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। পরিদর্শনকালে দেখা যায়, বীধের পাশের মাটি বালু প্রকৃতির হওয়ায়, ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক মাটি দ্বারা বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবতার আলোকে ক্যারিড আর্থ ও	বুড়াশিবতলা, বাদপুইয়া শিমুলতলী, উদয়গ্রী, রাজামাটি নামকস্থানে নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কমিটির সুপারিশের আলোকে বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজের প্রাক্কলন সংশোধন করে কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিবীক্ষণের তারিখ	উল্লেখযোগ্য সমস্যা	সুপারিশসমূহ	সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
		বাপাউবো'র ডিজাইন বিভাগের প্রতিনিধি বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক ডিজাইন ও ব্যয় পুনঃযাচাই করবেন।	রয়েলটি দফার অধিক প্রয়োজন হওয়ায় সংশোধিত ডিপিপি'র প্রাক্কলনে ক্যারিড আর্থ ও রয়েলটি দফার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।	
এ, কে, এম-আনিসুর-রহমান- সিদ্দিকী তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কোয়ালিটি কন্ট্রোল এন্ড অ্যাসুরেন্স সেল ওয়েস্ট রিজিওন, বাপাউবো, ঢাকা।	২৬/১২/২০২৩	স্যাটারের ঘাটতি, W/C অনুপাত এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ফিল্ড টেস্ট উপকরণের অপর্যাপ্ততা।	তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজে নির্দিষ্ট সময় পরে স্যাটার খুলতে হবে, স্ল্যাম্প টেস্ট করতে হবে এবং বীধপুনরাকৃতিকরণ কাজের সাইটে পর্যাপ্ত পরিমাণে টেস্ট উপকরণ/টেস্ট করতে হবে।	তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজে স্যাটার নির্দিষ্ট সময় পরে খোলা হয় এবং W/C অনুপাত সঠিকভাবে আছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত স্ল্যাম্প টেস্ট করা হয়েছে।
প্রবীর কুমার গোস্বামী তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী রাজশাহী পানি উন্নয়ন সার্কেল বাপাউবো, রাজশাহী।	০২/১২/২০২৩		প্যাকেজ নং-Nao-W-10 এর কাজের সাইটে মাটি পরিবহনের জন্য ট্রলি, এক্সাভেটর, বুলডোজার বৃদ্ধি করে, যথাযথভাবে কম্পাকশন করতে হবে। প্যাকেজ নং-Nao-W- 17 এর কাজের সাইটে প্ল্যাটফর্ম করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথাযথভাবে সিসি ব্লক কাস্টিং কাজ সমাপ্ত করতে হবে। প্যাকেজ নং-Nao-W-19 এর কাজের সাইটে প্ল্যাটফর্ম করে ঢালাই করতে হবে এবং সাইটে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে ম্যাটেরিয়ালস সরবরাহ করতে হবে। প্যাকেজ নং-Nao-W-9 এর কাজের সাইটে মেশিন সংখ্যা বাড়িয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে হবে।	নির্দেশনাগুলো অনুসরণপূর্বক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজগুলো সমাপ্ত করা হয়েছে।
প্রবীর কুমার গোস্বামী তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী রাজশাহী পানি উন্নয়ন সার্কেল বাপাউবো, রাজশাহী।	১১/০১/২০২৪	বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়নে জটিলতা।	কারিগরী কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	কারিগরী কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।
মোঃ মুখলেসুর রহমান অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, রাজশাহী।	১৬/০৪/২০২৪	সিসি ব্লক কাস্টিং ও জিওব্যাগ ডাম্পিং কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।	বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজের ডিজাইন টপ লেভেল, টপের প্রস্থ, ডিজাইন স্লোপ, কম্পাকশন ও ক্লোজড টার্মিং ডিজাইন স্পেসিফিকেশন অনুসরণপূর্বক দ্রুত শেষ করতে হবে। তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজের	ডিজাইন অনুযায়ী বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়নের পরে টার্মিং কাজ বাস্তবায়ন করা হয় এবং বিভিন্ন সময়ে লেয়ার বাই লেয়ার কম্পাকশন টেস্ট করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তীর

পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিবীক্ষণের তারিখ	উল্লেখযোগ্য সমস্যা	সুপারিশসমূহ	সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
			প্যাকেজ নং-Nao-W-3 ও Nao-W-18 এর সিসি ব্লক কাস্টিং ২৫-০৪-২০২৪ এবং প্যাকেজ নং-Nao-W-18 এর জিও বস্তা ডাম্পিং ৩০-০৪- ২০২৪ তারিখের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে। প্রকল্পটি জুন/২০২৪ এর মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।	প্রতিরক্ষামূলক কাজের সিসি ব্লক কাস্টিং, জিওব্যাগ ডাম্পিং করা হয়। প্রকল্পটি জুন/২০২৪ এর মধ্যে সমাপ্ত করা হয়।

৩১. প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ও সমাপ্তির পর নিরীক্ষণ সংক্রান্ত:

(ক) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা:

ক্রমিক নং	নিরীক্ষা সময়কাল	নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	পর্যবেক্ষণ/আপত্তি ও অর্থের সংশ্লেষ (পরিমাণ)	আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা (না হলে বর্তমান অবস্থা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
প্র	যো	জ্য	ন	য়

(খ) বহিঃনিরীক্ষা:

ক্রমিক নং	নিরীক্ষা সময়কাল	নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	পর্যবেক্ষণ/আপত্তি ও অর্থের সংশ্লেষ (পরিমাণ)	আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা (না হলে বর্তমান অবস্থা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	২০২১-২২	১৫/০৯/২২	টাক্সফোর্স এবং IWM কর্তৃক প্রি-ওয়ার্ক, পোস্ট ওয়ার্ক মেজারমেন্ট ও মাটির গুনগত মান প্রতিবেদন ব্যতিরেকে মাটি খনন কাজের বিল পরিশোধ করায় বোর্ডের অনিয়মিত ব্যয় ৮৯,০৯,৫৯,০৯১ (উননব্বই কোটি নয় লক্ষ উনষাট হাজার একানব্বই) টাকা। জড়িত টাকার পরিমাণ: ১,৪৪,২৯৮,১১১/-	ব্রডসীট জবাব প্রদান করা হয়েছে।
২।	ঐ	১৩/০৯/২২	চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক ঠিকা কাজের বিবিধ বুঁকির উপর বীমা না করা এবং বীমা করলেও যথাযথ হারে বীমাযোগ্য অর্থ নির্ধারন এবং বীমা প্রিমিয়ামের উপর নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৫,৩৪,৫৫,৪৬২/- (পাঁচ কোটি চৌত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার চারশত বাষটি) টাকা। জড়িত টাকার পরিমাণ: ২৬৯,০৬৮/-	ব্রডসীট জবাব প্রদান করা হয়েছে।
৩।	ঐ	১৫/০৯/২২	বীধ নির্মাণ কাজে মাটির গুনগত মান পরীক্ষা না করে ঠিকাদারকে ৭,১৭,৩৬,৪৬৫ (সাত কোটি সত্তের লক্ষ ছত্রিশ হাজার চারশত পয়ষটি) টাকার বিল অনিয়মিতভাবে পরিশোধ। জড়িত টাকার পরিমাণ: ৫০,০০,০০০/-	ব্রডসীট জবাব প্রদান করা হয়েছে।
৪।	২০২২-২৩	০৭/১১/২৩	প্রকল্পের কাজে চুক্তিপত্রের শর্ত মোতাবেক পূর্ত কাজের বিবিধ বুঁকির উপর বীমা না করা এবং প্রিমিয়ামের উপর নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৩,৬৬,৯৪,৪৩১/- (তিন কোটি ছিষটি লক্ষ চুরানব্বই হাজার চারশত একত্রিশ) টাকা। জড়িত টাকার পরিমাণ: ৬,০৬,০৯৫/-	মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের স্মারক নং- ৮২.০৯.০০০০.০১১.৩৩.১৩৮.২৩, তারিখ: ১৫/০৫/২৪ মোতাবেক আপত্তিটি নিষ্পত্তি হয়েছে।
৫।	ঐ	০৭/১১/২৩	ভূয়া টেন্ড রিপোর্ট তৈরির মাধ্যমে সিসি ব্লকের বিল প্রদান করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১,৭৫,২০,৬১২/- (এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ বিশ হাজার ছয়শত বারো) টাকা। জড়িত টাকার পরিমাণ: ১,৭৫,২০,৬১২/-	মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের স্মারক নং- ৮২.০৯.০০০০.০১১.৩৩.১৩৮.২৩, তারিখ: ১৫/০৫/২৪ মোতাবেক আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ

ক্রমিক নং	নিরীক্ষা সময়কাল	নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	পর্যবেক্ষণ/আপত্তি ও অর্থের সংশ্লেষ (পরিমাণ)	আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা (না হলে বর্তমান অবস্থা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
				করা হয়েছে।
৬।	ঐ	০৭/১১/২৩	জিও ব্যগ ও সিসি ব্লকের গুনগত মান যাচাই ব্যতিরেকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ ৪,০৩,১০,৬০৭ (চার কোটি তিন লক্ষ দশ হাজার ছয়শত সাত) টাকা। জড়িত টাকার পরিমাণ: ৫৮,৯৪,৮৭১/-	ব্রডসীট জবাব প্রদান করা হয়েছে।
			মোট আপত্তির সংখ্যা = ৬টি, আপত্তিকৃত টাকার পরিমাণ = ১৭৩৫,৮৮,৭২৭/-	

ছ. প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর মন্তব্য

৩২. প্রকল্পের বিষয়ে সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য (নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে):

৩২.১. পটভূমি

প্রকল্পটি আত্রাই নদীকে কেন্দ্র করে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আত্রাই নদীর প্রবাহ পথে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা নদীর গতি প্রকৃতি পরিবর্তনের কারণে ভাঙন কবলিত হয়। আত্রাই নদীর ডান/বাম তীরে নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার পূর্ব নন্দনপুর, উদয়শ্রী, রাঙামাটি; পল্লীতলা উপজেলার পাটিচড়া, বৈরাগীপোতা, মহাশ্মশান, মাহমুদপুর, ইছাপুড়, বাদপুইয়া শিমুলতলী এবং মহাদেবপুর উপজেলার নুরপুর, কলোনীপাড়া ও বুড়াশিবতলা ইত্যাদি এলাকাসমূহ ব্যাপক ভাঙনের সম্মুখীন হয়। এ ভাঙন এ বিশাল জনবসতি নদীগর্ভে বিলীনের হাত রক্ষার জন্য নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ, খাল খনন, বীধ পুনরাকৃতিকরণ, নদী ডেজিং কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়।

নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ ৪.০০ কিঃমিঃ, বীধ পুনরাকৃতিকরণ ২১.০০ কিঃমিঃ, রেগুলেটর মেরামত ৫টি, খাল পুনঃখনন ৬.০০ কিঃমিঃ এবং নদী ডেজিং কাজ ২৭.০০ কিঃমিঃ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ডিপিপিটি গত ০৬-০৭-২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের সুফল বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি মহাদেবপুর উপজেলার বুড়াশিবতলা নামক স্থানে নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করে। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্য মহোদয় ধামুইরহাট উপজেলার উদয়শ্রী, রাঙামাটি ও পল্লীতলা উপজেলার বাদপুইয়া শিমুলতলী নামক স্থানে নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়নের জন্য ডিও লেটারের মাধ্যমে অনুরোধ করেন। এ প্রেক্ষিতে ১৫/০৬/২৩ তারিখে ১১৪৫ মিটার নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি'র ১ম সংশোধন অনুমোদন করা হয় এবং সে মোতাবেক কাজ বাস্তবায়ন করা হয়।

৩২.২. যৌক্তিকতা/পর্যাপ্ততা

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে, ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত পুরাতন ৩টি প্রকল্প যথা: আত্রাই নদীর ডানতীর বীধ নির্মাণ প্রকল্প, ছিলিমপুর-সালিগ্রাম উপ-প্রকল্প, পল্লীতলা উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের পুনর্বাসন কাজ বাস্তবায়িত হওয়ায় এ প্রকল্পগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি সহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে; নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হলে বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট, কৃষি জমি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বীধ, হাট-বাজার ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সম্পদ নদী ভাংগন হতে রক্ষা পেয়েছে; নদী ডেজিং/খাল পুনঃখনন কাজ বাস্তবায়িত হওয়ায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদীর নাব্যতা, পানি ধারণ ক্ষমতা এবং কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে; নদীর গতি পথ পরিবর্তন রোধ হয়েছে; প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পেয়েছে।

আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলা ১.৬৪৫ কিলোমিটার, পল্লীতলা উপজেলায় ২.৫৭০ কিলোমিটার এবং মহাদেবপুর উপজেলায় ০.৯৩০ কিলোমিটার সহ সর্বমোট ৫.১৪৫ কিলোমিটার নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ধামুইরহাট উপজেলা ৯.০০ কিলোমিটার, পল্লীতলা উপজেলায় ১৭.০০ কিলোমিটার এবং মহাদেবপুর উপজেলায় ১.০০ কিলোমিটার সহ সর্বমোট ২৭.০০ কিলোমিটার নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, ১৭.১৬৪ কিলোমিটার বীধ পুনরাকৃতিকরণ, ৫টি রেগুলেটর মেরামত এবং ৬.০ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নদীতীর প্রতিরক্ষা, নদী



ডেজিং, বীধ পুনরাকৃতিকরণ, রেগুলেটর মেরামত এবং খাল পুনঃখনন কাজ বাস্তবায়িত হওয়ায় নওগাঁ জেলার ধামইরহাট, পল্লীতলা এবং মহাদেবপুর উপজেলায় প্রায় ৯০০.০০ কোটি টাকার সরকারি-বেসরকারি সম্পদ রক্ষা পেয়েছে।

৩২.৩ উদ্দেশ্য

- বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
- নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি সম্পদ নদী ভাঙ্গান হতে রক্ষা করা।
- ডেজিং কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদীর নাব্যতা, পানি ধারণ ক্ষমতা এবং কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- নদীর গতি পথ পরিবর্তন রোধ করা।
- প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা।

৩২.৪ প্রকল্প সংশোধন এ তার কারণ সম্পর্কিত:

নিম্নলিখিত কারণে প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজন হয়েছে।

ক্র: নং	খাত	অনুমোদিত মূল ডিপিপি অনুযায়ী		প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত অনুযায়ী		পরিবর্তন		প্রকল্প সংশোধনের কারণ
		পরিমাণ	ব্যয়	পরিমাণ	ব্যয়	পরিমাণ	ব্যয়	
১	নদীতীর সংরক্ষণ কাজ	৪.০০ কিঃমিঃ	৮২২৫.৮৯	৫.১৪৫ কিঃমিঃ	৯৮৮৭.২৭	(+) ১.১৪৫ কিঃমিঃ	(+) ১৬৬১.৩৮	প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার বুড়াশিবতলা নামক স্থানে মন্দির রক্ষার্থে নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করেন। প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে বুড়াশিবতলা নামক স্থানে ১০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজের প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া, মাননীয় সংসদ সদস্য-৪৭, নওগাঁ-২ (ধামুইরহাট ও পল্লীতলা) নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার উদয়শ্রী নামক স্থানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাড়িঘর, দোকান ও রাজামাটি নামক স্থানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীধ, পাকা রাস্তা, ফসলি জমি এবং পল্লীতলা উপজেলার নজিপুর পৌরসভার বাদপুইয়া শিমুলতলী নামক স্থানে শাশানঘাট আত্রাই নদী ভাঙ্গানের কবল থেকে রক্ষাকল্পে নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের জন্য ডিও লেটারের মাধ্যমে অনুরোধ করেন। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক উক্ত স্থানসমূহে নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের জন্য সদয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে উদয়শ্রী নামক স্থানে ১৪৫ মিটার, রাজামাটি নামক স্থানে ৮০০ মিটার এবং বাদপুইয়া শিমুলতলী নামক স্থানে ১০০ মিটার সহ সর্বমোট ১১৪৫ মিটার দীর্ঘ নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজের প্রস্তাবনা ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
২	বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ	২৫ কিঃমিঃ	১৮৮৭.৭৪	২৫ কিঃমিঃ	২৯২৫.৯৭	-	(+) ১০৩৮.২৩	Working Design অনুযায়ী প্রাক্কলন প্রস্তুত করায় প্রাক্কলিত মূল্য ডিপিপি মূল্যের চেয়ে বৃদ্ধি পায়। ফলে ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজের ব্যয় বৃদ্ধি পায়।
৩	রেগুলেটর মেরামত কাজ	৫টি	৬২.৭৮	৫টি	৫৫.৪৭	-	(-) ৭.৩১	প্রাক্কলিত মূল্যের তুলনায় চুক্তিমূল্য কম হওয়ায় ব্যয় হ্রাস পায়।
৪	খাল পুনঃখনন কাজ	৬.০০ কিঃমিঃ	৮৮.৭২	৬.০০ কিঃমিঃ	৫৭.৫৮	-	(-) ৩১.১৪	ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির কারণে খাল পুনঃখনন কাজটি ডিজাইন প্রশস্ততায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ফলে খাল পুনঃখনন কাজের ব্যয় ৩১.১৪ লক্ষ টাকা হ্রাস পায়।
৫	নদী ডেজিং	২৭.০০ কিঃমিঃ	৭৪০৯.৪২	২৭.০০ কিঃমিঃ	৪৪২৭.৯২	-	(-) ২৯৮১.৫০	বর্ষা মৌসুমের পূর্বে জরিপ কাজ সম্পন্ন করে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হলেও প্রি-ওয়ার্ক জরিপ গ্রহন কাজ বর্ষা মৌসুমের পরে সম্পন্ন হয়। বর্ষা মৌসুমে নদীর মরফোলজিকাল পরিবর্তন হওয়ায় প্রি-ওয়ার্ক জরিপে নদী ডেজিং কাজের মূল প্রাক্কলনের তুলনায় প্রয়োজনীয় ডেজিং এর ডলিউম হ্রাস পায়। ফলে প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে নদী ডেজিং কাজের ব্যয় হ্রাস পায়।

৩৩. প্রকল্পের নিম্নবর্ণিত বিষয়ে যৌক্তিকতা (নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে):

৩৩.১ খারনা:

প্রকল্পটি আত্রাই নদীকে কেন্দ্র করে প্রস্তুত করা হয়েছে। আত্রাই নদীটি ভারত হতে নওগাঁ জেলার ধামুরহাট উপজেলার শীমুলতলী দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার পোটাডিয়া ইউনিয়নে হড়া সাগর নদীতে পতিত হয়েছে। আত্রাই নদীটি মরফলোজিক্যালি meandering প্রকৃতির। আত্রাই নদীর প্রবাহের পথে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা নদীর গতি প্রকৃতি পরিবর্তনের কারণে ভাঙন কবলিত হচ্ছে। আত্রাই নদীর ডান/বাম তীরে নওগাঁ জেলার ধামুরহাট উপজেলার পূর্ব নন্দনপুর, উদয়গ্রী; পল্লীতলা উপজেলার পাটিচড়া, বৈরাগীপোতা, মহাশ্মশান, মাহমুদপুর, ইছাপুড়, মহাদেবপুর উপজেলার নুরপুর ও কলোনীপাড়া ইত্যাদি এলাকাসমূহ ব্যাপক ভাঙনের সম্মুখীন হয়। এতে অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভবনা দেখা দেয়। তাছাড়া, আত্রাই নদীর ডানতীর বরাবর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, নদী তীর থেকে মাত্র ১৫০ মিটার দূরে কোথাও একেবারে সন্নিবিষ্ট অবস্থান করছে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা না নিলে এ ভাঙন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধকে স্পর্শ করবে। ফলে বন্যার প্রবনতা বেড়ে যাবে, মানুষের দুর্ভোগ বাড়বে, কৃষি ফসলের উৎপাদন, নিবিড়তা কমে যাবে। আত্রাই নদীর বাম তীর ঘেঁষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসবাস। এখানে হাইস্কুল, মসজিদ, মন্দির, মাদ্রাসা, কলেজ, গীর্জা, আধাপাকা, পাকা ঘড়বাড়ি, রাস্তা-ঘাট ইত্যাদি রয়েছে। আত্রাই নদীর বাম তীর বরাবর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নদী তীর থেকে মাত্র ২০-২৫ মিটার দূরে অবস্থান করছে। কোথাও একেবারে নিকটবর্তী রয়েছে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা না নিলে বসত ভিটা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কৃষি জমি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙে যাবে। ফলে হাজার হাজার মানুষ ভূমিহীন, গৃহহীন হয়ে কর্মবিমুখ অবস্থায় মানবত্বের জীবন যাবন করবে। অত্র একালার মাটির প্রকৃতি বালিযুক্ত হওয়ায় আত্রাই নদীর পানির তোড়ে এবং ফ্লাস ফ্লাডের কারণে অতি দ্রুত তীর ভাঙনের সম্মুখীন হয়। বর্তমানে নওগাঁ পওর বিভাগের আওতায় সম্পাদিত ৩টি প্রকল্প যথা- (১) আত্রাই নদীর ডানতীর বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (২) ছিলিমপুর-সালিগ্রাম উপ-প্রকল্প (৩) পত্নীতলা উপ-প্রকল্প এর কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে। বিধায় প্রকল্প ৩টির পুনর্বাসন প্রয়োজন। পুনর্বাসন কাজ সম্পাদন করা গেলে প্রকল্প ৩টির উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হবে এবং কার্যকারিতা অনেক বৃদ্ধি পাবে। ডিপিপিতে বর্ণিত ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসনের কাজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উল্লেখিত ৩টি প্রকল্পের বিদ্যমান বাঁধগুলি প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে নির্মিত এবং এ যাবৎ তেমন কোন সংস্কার কাজ করা সম্ভব হয়নি। বিধায় বাঁধগুলি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আছে। ব্যাপক মেরামত না করলে যে কোন সময় সাংঘাতিক বিপর্যয় ঘটার সমূহ সম্ভবনা আছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় দীর্ঘদিন খালটির তলদেশে পলি জমে তলদেশ উঁচু হয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে খালগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে। বর্ণিত ক্রমিক নং-৩ উপ-প্রকল্পের আওতায় ৫টি রেগুলেটর সুদীর্ঘ প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে নির্মিত যোগুলোর অবস্থা নাজুক, বিধায় উহাদের মেরামত আবশ্যিক। প্রকল্পের আওতায় রেগুলেটরগুলো মেরামত করার পর স্থানীয় জনপ্রতিনিধি-১ জন, সুবিধাভোগী-৩জন ও বাপাউবো'র ১ জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে রেগুলেটরগুলো পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষন করা হবে। এছাড়া আত্রাই নদী পলি/বালি পড়ে অনেকটাই ভরে গেছে। উহার পানি ধারণ ক্ষমতা ও নাব্যতা হ্রাস পেয়েছে। বর্ষাকালে সহজেই নদী পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে দুকূল উপচিয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। অপরপক্ষে শুষ্ক মৌসুমে নদী প্রায় পানি শূন্য হয়ে পড়ে। বিধায় প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকায় ২৭.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে নদী ড্রেজিং করা প্রয়োজন।

নদী ড্রেজিং/খাল পুনঃখনন কাজ বাস্তবায়িত হলে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পাবে, নদী/খালে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, নদী/খালে প্রায় সারা বছর পানি থাকবে এবং কৃষি উৎপাদন ও মৎস্য উৎপাদন বেড়ে যাবে। ফলে অধিক কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন হবে। প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে জাতীয়ভাবে খাদ্য নিরাপত্তার কাজে সহায়ক হবে। সর্বপরি সামাজিক নিরাপত্তাসহ এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখাসহ পরিবেশের বিরূপ প্রভাব হতে প্রকল্প এলাকার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হবে। প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তৎকালীন মাননীয় হুইপ এবং বর্তমান স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ শহীদুজ্জামান সরকার মহোদয় পানি উন্নয়ন বোর্ডকে ডিও লেটার প্রদান করেছেন (কপি সংযুক্ত) এবং মৌখিকভাবে বারবার অনুরোধ করছেন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সচিবালয়ের স্মারক নং-বাপাউবো(সচি)/পরি-১/বিবিধ-৩/২০১৭(১ম খন্ড)/৬০ তারিখঃ ০৯/০২/২০১৭ খ্রি: মোতাবেক প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে কারিগরি প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য ৬(ছয়) সদস্য বিশিষ্ট কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। কারিগরি কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন পূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। গত ৩০-০১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ডিপিপির উপর যাচাই সভা এবং ৩১-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বোর্ডে ডিপিপি যাচাই বাছাইয়ের জন্য কারিগরি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রণালয়ের যাচাই সভা ও বোর্ডের কারিগরি কমিটির সভার সিদ্ধান্ত

মোতাবেক ডিপিপি সংশোধন করতঃ প্ল্যানিং কমিশনে দাখিল করা হয়। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশন, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, সেচ উইং এর স্মারক নং-২০.৩৫৮.০১৪.০১.১৭.২০১৮/৮৬ তারিখঃ ০৪-১১-২০১৮ খ্রিঃ মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠনের নির্দেশনা পাওয়া যায় (কপি সংযুক্ত)। তৎপ্রেক্ষিতে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়। পুনর্গঠিত ডিপির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬৬১৮.৪৮ লক্ষ টাকা। যার উপর গত ০৭-০৮-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে প্ল্যানিং কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ডিপিপি'র প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়িয়েছে ১৭৯৪৭.০৫ লক্ষ টাকা। গত ০৬-০৭-২০২০ খ্রিঃ তারিখে একনেক সভায় শর্ত সাপেক্ষে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। একনেক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বর্তমানে ডিপির প্রাক্কলিত ব্যয় দাঁড়িয়েছে ১৭৯৪৭.০৫ লক্ষ টাকা।

৩৩.২ নকশা

প্রকল্পের ভৌত কাজ সমূহের নকশা মাঠ দপ্তর কর্তৃক জরিপ করত যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নকশা সার্কেল, বাপাউবো, ঢাকায় প্রেরণ করা হয়। ভৌত কাজের নকশা সমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। অনুমোদিত ডিজাইনের প্রেক্ষিতে প্রাক্কলন প্রস্তুত পূর্বক প্রাক্কলন সমূহ বাপাউবো'র আর্থিক ক্ষমতা বন্টন বিধিমালা অনুসারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করত দরপত্র আহ্বান করে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়।

৩৩.৩ স্থান

প্রকল্পটি রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার পূর্বনন্দনপুর, উদয়গ্রী, ছিলিমপুর ছালিগ্রাম ও রাজামাটি; পল্লীতলা উপজেলার পূর্ব পাটিচড়া, মাহমুদপুর, ইছাপুর, বৈরাগীপোতা, মহাশ্মাশান ও শিমুলতলী শ্মশানঘাট এবং মহাদেবপুর উপজেলার নুরপুর, কলোনীপাড়া ও বুড়ানীবতলা নামক স্থানে নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া, নদী ড্রেজিং ও বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ সমূহ ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলায় এবং খাল খনন ও রেগুলেটর মেরামত কাজ সমূহ পল্লীতলা উপজেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে।

৩৩.৪ বাস্তবায়নকাল

প্রকল্পটি ০৬/০৭/২০২০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হলেও বৈশ্বিক মহামারী করোনার জন্য দরপত্র আহ্বান পূর্বক ঠিকাদার নিয়োগ করে ভৌত কাজ শুরু করতে কিছুটা বিলম্ব হয়। প্রকল্পটির প্রকৃত বাস্তবায়ন কাল জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত।

৩৪. প্রকল্প পরিকল্পনা, অর্থায়ন ও প্রয়োজ্যতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ (নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে):

৩৪.১ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)

প্রয়োজ্য নয়।

৩৪.২ প্রকল্প সনাক্তকরণ

প্রাথমিকভাবে প্রকল্প এলাকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলার নদীভাঙ্গন প্রশমনে নদীতীর প্রতিরক্ষা, বন্যা নিয়ন্ত্রণে বীধ পুনরাকৃতিকরণ ও নদী ড্রেজিং, পানি নিষ্কাশনে খাল খনন ও রেগুলেটর মেরামত করণের প্রয়োজনে প্রকল্পটি সনাক্তকরণ করা হয়।

৩৪.৩ প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন

স্থানীয় সংসদ সদস্যের ডিও লেটারের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সচিবালয়ের স্মারক নং-বাপাউবো(সচি)/পরি-১/বিবিধ-৩/২০১৭(১ম খন্ড)/৬০ তারিখঃ ০৯/০২/২০১৭ খ্রিঃ মোতাবেক প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে কারিগরি প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য ৬(ছয়) সদস্য বিশিষ্ট কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। কারিগরি কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়।

৩৪.৪ প্রকল্পের প্রাক-মূল্যায়ন

প্রয়োজ্য নয়।

৩৪.৫ অর্থায়ন

প্রকল্পের বছর ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ, অর্থছাড় ও অর্থ ব্যয়ের চিত্র নিচে দেওয়া হল।

অর্থবছর	মোট বরাদ্দ	বাস্তব (%)	অর্থছাড়	মোট ব্যয়	বাস্তব (%)	অব্যয়িত
২০২০-২১	১৪৭.০০	০.৯৪%	১৪৭.০০	১৪৪.৯৫	১.৮২%	২.০৫
২০২১-২২	৪০০০.০০	২৫.৯৭%	৪০০০.০০	৩৯৯৯.৯৭	২৪.৬৮%	০.০৩
২০২২-২৩	৫৯৯৯.৩১	৩৮.৯৫%	৫৯৯৯.৩১	৫৯৯৯.৩১	৩৬.০২%	০.০০
২০২৩-২৪	৫৬৫০.০০	৩৪.১৪%	৫৫৮৪.২৪	৫২৫৮.০৫	৩২.৮১%	৩২৬.১৯
সর্বমোট=	১৫৭৯৬.৩১		১৫৭৩০.৫৫	১৫৪০২.২৮		৩২৮.২৭

৩৪.৬ প্রকল্প অনুমোদন

স্থানীয় সংসদ সদস্যের ডিও লেটারের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সচিবালয়ের স্মারক নং-বাপাউবো(সচি)/পরি-১/বিবিধ-৩/২০১৭(১ম খণ্ড)/৬০ তারিখঃ ০৯/০২/২০১৭ খ্রি: মোতাবেক প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে কারিগরি প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য ৬(ছয়) সদস্য বিশিষ্ট কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। কারিগরি কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ডিপিপি প্রণয়ন পূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। গত ৩০-০১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ডিপিপির উপর যাচাই সভা এবং ৩১-০৫-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে বোর্ডে ডিপিপি যাচাই বাছাইয়ের জন্য কারিগরি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রণালয়ের যাচাই সভা ও বোর্ডের কারিগরি কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধন করতঃ প্ল্যানিং কমিশনে দাখিল করা হয়। পরবর্তীতে ০৬-০৭-২০২০ তারিখে ১৭৯৪৭.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একনেক সভায় আলোচ্য প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

৩৪.৭ অন্যান্য (যদি থাকে)

৩৫. প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর অবস্থা ও প্রকল্পের ফলাফল বিশ্লেষণ (নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে):

৩৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে উপকারভোগীদের সুস্পষ্ট জ্ঞান ছিল কি না: ছিল।

৩৫.২ প্রকল্প থেকে সৃষ্ট সুবিধাদির ব্যবহারের জন্য কার্যক্রম: গ্রহণ করা হবে।

৩৫.৩ প্রকল্পের ও এন্ড এম কার্যক্রম

পরিচালন ব্যয় খাতের নিয়মিত কার্যক্রম হতে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যকারিতা বজায় রাখা হবে।

৩৫.৫ প্রকল্পের প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)

প্রত্যক্ষ প্রভাব: প্রকল্পের আওতায় ৫.১৪৫ কিলোমিটার কাজ বাস্তবায়নের ফলে নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার পূর্বনন্দনপুর, উদয়গ্রী, ছিলিমপুর ছালিগ্রাম ও রাজামাটি; পল্লীতলা উপজেলার পূর্ব পাটিচড়া, মাহমুদপুর, ইছাপুর, বৈরাগীপোতা, মহাশ্মাশান ও শিমুলতলী শ্মাশানঘাট এবং মহাদেবপুর উপজেলার নুরপুর, কলোনীপাড়া ও বুড়াশীবতলা নামক স্থান নদীভাঙ্গন হতে রক্ষা পেয়েছে। এছাড়া, ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলায় নদী ড্রেজিং, বীধ পুনরাকৃতিকরণ, খাল খনন ও রেগুলেটর মেরামত কাজ সমূহ বাস্তবায়িত হওয়ায় নদীভাঙ্গন হ্রাস, নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ হয়েছে।

পরোক্ষ প্রভাব: প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি সম্পদ রক্ষা পাওয়ায় সুরক্ষা নিশ্চিত হয়েছে। ভূ-পরিষ্ক ও ভূ-গর্ভস্থ পানির সুরক্ষা নিশ্চিত হয়েছে।

অন্যান্য প্রভাব: প্রকল্প এলাকাটি নদী ভাঙ্গন মুক্ত হবে ও অন্যান্য জৌত অবকাঠামো নদীর গ্রাস হতে রক্ষা পাবে। প্রকল্পের নদী ড্রেজিং ও খাল পুনঃখনন কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত হবে এবং নৌপথে যাতায়াতের সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সৃষ্ট নদী ভাঙ্গন, বন্যা, জলাবদ্ধতা, প্লাবন ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতে প্রকল্প এলাকাটি সুরক্ষিত হবে ও এলাকার পরিবেশ উত্তরোত্তর উন্নত হবে। এছাড়াও ভূগর্ভস্থ পানিস্তরের পুনর্ভরণের ফলে প্রকল্প এলাকাটি মরুকরণ হতে রক্ষা পাবে। ফলে বন্যা ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে।

৩৫.৬ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ব্যবস্থা

প্রযোজ্য নয়।

৩৫.৭ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান

প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে প্রকল্প এলাকায় একটি বিশাল কর্মযজ্ঞের সৃষ্টি হয়। প্রকল্পের ভৌত কাজ বাস্তবায়নের সময় সহায় সম্বলহীন নিঃশ্ব, হত দরিদ্র, দিনমজুর মানুষ সরাসরি কাজে অংশগ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয়। নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়িত হওয়ায় নদী ভাঙ্গন রোধ হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় মানুষের মনে আস্থা ও স্বস্তি ফিরে এসেছে। তাছাড়া, ড্রেজিং এর ফলে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশীয় প্রজাতির মাছের আধিক্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, প্রকল্প এলাকার জেলে সম্প্রদায় উজ্জীবিত হয়েছে। অপরদিকে, শূষ্ক মৌসুমে নদীর পানি দিয়ে কৃষকরা খুব সহজেই কৃষি পণ্য উৎপাদন করতে পারছে। প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায়, মানুষ জন নতুন নতুন পরিকল্পনা করে ব্যবসা-বানিজ্য শুরু করেছে। ফলে, প্রকল্প এলাকায় নানাভাবে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

৩৫.৮ আত্ম-কর্মসংস্থানের সম্ভাব্যতা

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জন মানুষের বিপুল পরিমাণ সহায় সম্পদ ও জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। প্রকল্প এলাকার পরিবেশ-প্রতিবেশ উন্নত হচ্ছে। প্রতিরক্ষামূলক কাজ ও নদী পুনঃখনন কাজ বাস্তবায়নকালীন সময় নানাভাবে জনগণের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা ছিল। সময়ে সময়ে সুবিধাভোগী মানুষকে প্রকল্পের সুবিধা সমূহের বিষয়ে জ্ঞাত করা হয়েছে। নদী ভাঙন, জলোচ্ছ্বাস, প্লাবন ও জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত প্রকৃতিক বিপর্যয় হতে কাজটি রক্ষা করার বিষয়ে প্রাথমিক করণীয় ও কার্যবলী সম্বলিত ধারণা এবং স্থানীয়ভাবে সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর ব্যবস্থা, প্রকল্পের সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই হওয়ার পাশাপাশি গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ব্যবসা ও বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব তৈরী হবে। ফলে, আত্ম-কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে।

৩৫.৯ নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগের সম্ভাব্যতা

এ প্রকল্পের মাধ্যমে নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে।

৩৫.১০ উন্নয়নের নারীদের অংশ গ্রহণ

হা, উন্নয়নের নারীদের অংশ গ্রহণ ছিল।

৩৫.১১ আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমে প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব

নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়িত হওয়ায় নদী ভাঙ্গন রোধ হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় মানুষের মনে আস্থা ও স্বস্তি ফিরে এসেছে। নদী ড্রেজিং এর ফলে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশীয় প্রজাতির মাছের আধিক্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, প্রকল্প এলাকার জেলে সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। শূষ্ক মৌসুমে নদীর পানি দিয়ে কৃষকরা খুব সহজেই কৃষি পণ্য উৎপাদন করতে পারছে। বাঁধ নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত হওয়ায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। এতে করে প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন ধনাত্মক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ জন নতুন নতুন পরিকল্পনা করে ব্যবসা-বানিজ্য শুরু করেছে। ফলে, প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে।

৩৫.১২ পরিবেশের ওপর প্রভাব

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নদী ভাঙন রোধ হবে। নদী ও খাল খননের ফলে নদী ও খালের পানি ধারণ ও পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। এতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিষ্ক পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত হবে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করাসহ স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা বাড়বে। ভূ-গর্ভস্থ পানির নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশের যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য, বন ইত্যাদি ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন সাধন হবে তথা প্রকল্প এলাকার পরিবেশের উত্তরত্তোর উন্নতির মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে। এতে করে পরিবেশ-প্রতিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

৩৫.১৩ প্রকল্প টেকসইকরণ ও এক্সিট প্ল্যান

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নদী ভাঙন রোধ হবে। কৃষি জমি নদী ভাঙনের কবল থেকে রক্ষার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করাসহ স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা বাড়বে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব হবে। ফলে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ব্যবসা ও বাণিজ্য ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশের যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য, বন ইত্যাদি ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন সাধন হবে তথা প্রকল্প এলাকার পরিবেশের উত্তরত্তর উন্নতির মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে।

৩৫.১৪ দারিদ্র দূরিকরণ/হাসকরণে অবদান

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নদী ভাঙন রোধ হয়েছে, কৃষি জমি নদী ভাঙনের কবল থেকে রক্ষার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা অর্জিত হয়েছে। ফলে, নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন/হাস করা সম্ভব হবে।

৩৫.১৫ জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় অভিজাত ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, মহিলা প্রতিনিধি প্রমুখের মতামত

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় অভিজাত ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, মহিলা প্রতিনিধিগণ সকলে ইতিবাচক মতামত প্রদান করেছেন।

৩৫.১৬ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে অবদান এবং এনজিও কর্মকাণ্ডের সাথে দ্বৈততা মস্পর্কে মতামত

প্রযোজ্য নয়।

৩৬. প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সমস্যা মেয়াদ ও সমস্যা নিরসনে গৃহীত ব্যবস্থা (নিম্নবর্ণিত বিষয় বিবেচনা) করা যেতে পারে:

৩৬.১ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

প্রযোজ্য নয়।

৩৬.২ প্রকল্প পরিচালক

একটি প্রকল্পে একাধিক প্রকল্প পরিচালক নিয়োগে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের স্বাভাবিক গতি হ্রাস করে, ফলে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়। আলোচ্য প্রকল্পে দুই জন প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত ছিলেন।

৩৬.৩ ভূমি অধিগ্রহণ

বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজে ভূমি অধিগ্রহণ জটিলতার কারণে কাজ বাস্তবায়নে নানাবিধ সমস্যা তৈরী হয়।

৩৬.৪ ক্রয় কার্যক্রম

নকশা প্রাপ্তি এবং সময়ে সময়ে নকশা পরিবর্তনের জন্য কাজ বাস্তবায়নে বিলম্ব হয়।

৩৬.৫ পরামর্শ সেবা

প্রযোজ্য নয়।

৩৬.৬ ঠিকাদার

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, করোনা, নির্মাণ সামগ্রী ও শ্রমিক দুস্প্রাপ্যতা ইত্যাদি কারণে ঠিকাদারগণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সমাপ্ত করতে পারে নাই।

প্যাকেজ নম্বর (দরপত্র আইডি নম্বর)	প্যাকেজ ভিত্তিক কাজের বর্ণনা	ঠিকাদারের নাম	চুক্তিমূল্য	পরিশোধিত বিলের পরিমাণ	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ	বিলম্বের কারণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
প্যাকেজ নং-Nao- W-1, (আইডি- ৫৫৬১৪৫)	নওগাঁ জেলার খামুইরহাট উপজেলার অন্তর্গত পূর্বনন্দনপুর নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ৬.৭০০ হতে কিঃমিঃ ৭.২০০ = ৫০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	মেসার্স আমিন এ্যান্ড কোং, গগন বাবু রোড, খুলনা।	১০৬৪.৭৪	১০৬৪.৫০	৩১/০৫/২২	৩১/১০/২২	

প্যাকেজ নম্বর (দরপত্র আইডি নম্বর)	প্যাকেজ ভিত্তিক কাজের বর্ণনা	ঠিকাদারের নাম	চুক্তিমূল্য	পরিশোধিত বিলের পরিমাণ	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ	বিলম্বের কারণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
প্যাকেজ নং-Nao-W-2, (আইডি-৫১৮৬৯৫)	নওগাঁ জেলার পল্লীতলা উপজেলার অন্তর্গত পূর্ব পাটিচড়া নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ৫.৮০০ হতে কিঃমিঃ ৬.৮০০ = ১০০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	মেসার্স এ এস কনস্ট্রাকশন, ঘোড়ামারা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।	১৭৪১.৪৩	১৭৪০.৪৩	৩১/০৫/২২	০২/০৪/২৩	
প্যাকেজ নং-Nao-W-3, (আইডি-৫১৮৬৯৭)	নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার অন্তর্গত নুরপুর ও কলোনীপাড়া নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ২০.২০০ হতে কিঃমিঃ ২০.৫০০ = ৩০০ মিটার ও কিঃমিঃ ২৪.১৫০ হতে কিঃমিঃ ২৪.৬৮০ = ৫৩০ মিটার অর্থাৎ সর্বমোট ৮৩০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	ঐ	১২৯৭.৪৩	১২৯৭.৩২	৩১/০৫/২২	৩১/০৫/২৪	
প্যাকেজ নং-Nao-W-4, (আইডি-৫১৮৬৯৮)	নওগাঁ জেলার পল্লীতলা উপজেলার অন্তর্গত মাহমুদপুর ও ইছাপুর নামক স্থানে আত্রাই নদীর ডানতীরে কিঃমিঃ ১৬.২৮০ হতে কিঃমিঃ ১৬.৫৫০ = ২৭০ মিটার ও কিঃমিঃ ১৮.১০০ হতে কিঃমিঃ ১৮.৩৫০ = ২৫০ মিটার এবং কিঃমিঃ ১৮.৩৭৪ হতে কিঃমিঃ ১৮.৫৭৪ = ২০০ মিটার অর্থাৎ সর্বমোট = ৭২০.০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	ঐ	১২৮১.১২	১২৮০.৪০	৩১/০৫/২২	৩১/০৫/২৩	
প্যাকেজ নং-Nao-W-5, (আইডি-৫৫৬১৫৬)	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার অন্তর্গত উদয়শ্রী নামক স্থানে আত্রাই নদীর ডানতীরে কিঃমিঃ ৪.৯০০ হতে কিঃমিঃ ৫.১০০ = ২০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	মেসার্স খন্দকার শাহিন আহমেদ, গোয়ালচামট, ফরিদপুর।	৪৬৪.৩৬	৪৬১.৫৫	৩১/০৩/২২	৩১/০৩/২২	
প্যাকেজ নং-Nao-W-6, (আইডি-৫৫৬১৫৭)	নওগাঁ জেলার পল্লীতলা উপজেলার অন্তর্গত বৈরাগীপোতা নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ৭.৩০০ হতে কিঃমিঃ ৭.৮৫০ = ৫৫০ মিটার এবং মহাশাশান নামক স্থানে কিঃমিঃ ৭.৯০০ হতে কিঃমিঃ ৮.১০০ = ২০০ মিটার সর্বমোট ৭৫০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	এইচবি-এসআর (জেনি), মাহমুদ টাওয়ার নর্থসাইড রোড, বংশাল, ঢাকা।	১৪১৫.৪৬	১৪১২.৬৬	৩১/০৫/২২	৩১/০৫/২৩	
প্যাকেজ নং-Nao-W-7, (আইডি-৫৮৮১৪০)	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার অন্তর্গত ছিলিমপুর ছাণিগ্রাম উপ-প্রকল্পের আওতায় কিঃমিঃ ০.০০ হতে কিঃমিঃ ৪.০০০ = ৪.০ কিঃমিঃ বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ।	মেসার্স আমিন এ্যান্ড কোং, গগন বাবু রোড, খুলনা।	১৯৭.৯৭	০.০০	৩১/০৩/২২	-	এলাজিইডি কর্তৃক কার্পেটিং রাতা থাকায় এবং সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যে ভূমি অধিগ্রহণ না থাকার কারণে এ প্যাকেজের কাজ রহিত করা হয়।

প্যাকেজ নম্বর (দরপত্র আইডি নম্বর)	প্যাকেজ ভিত্তিক কাজের বর্ণনা	ঠিকাদারের নাম	চুক্তিমূল্য	পরিশোধিত বিলের পরিমাণ	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ	বিলম্বের কারণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
প্যাকেজ নং-Nao-W-8, (আইডি-৫৮৮৩১২)	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার অন্তর্গত আত্রাই নদীর ডানতীর বীধ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় কিঃমিঃ ০.০০ হতে কিঃমিঃ ৫.০০ = ৫.০০০ কিঃমিঃ বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ।	ঐ	৫০৪.৯৯ (৩৬৪.৩৮)	২৩৭.৩৪	৩১/০৫/২২	২৭/০৬/২৪	
প্যাকেজ নং-Nao-W-9, (আইডি-৫৮৮৩১৪)	নওগাঁ জেলার পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলার অন্তর্গত পল্লীতলা উপ-প্রকল্পের আওতায় কিঃমিঃ ৫.০০০ হতে কিঃমিঃ ২৩.০০০ এর মধ্যবর্তী স্থানে = ৯.০০০ কিঃমিঃ বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ কাজ।	মেসার্স আবুল কালাম আজাদ, পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী।	৭৬৮.৮০	৮৩৫.৬৪	৩১/০৫/২২	২৫/০৬/২৪	
প্যাকেজ নং-Nao-W-10, (আইডি-৫৮৮৩১৫)	নওগাঁ জেলার পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলার অন্তর্গত আত্রাই নদীর ডানতীর বীধ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় কিঃমিঃ ২৫.০০ হতে কিঃমিঃ ৩২.০০ = ৭.০০০ কিঃমিঃ বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ।	মেসার্স আমিন এ্যান্ড কোং, গগন বাবু রোড, খুলনা।	৫৮৩.৩৮ (৫৭১.৮৪)	৪৫১.৬৩	৩১/০৫/২২	১৫/০৬/২৪	
প্যাকেজ নং-Nao-W-11 (lot-1), (আইডি-৬২০৬৮৩)	নওগাঁ জেলার পল্লীতলা উপজেলার অন্তর্গত কাশিপুর, বড় চাঁদপুর, ছোট চাঁদপুর, রাজপাথ এবং উজিরপুর নামক স্থানে ০৫টি রেগুলেটর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	মেসার্স ইউনাইটেড ব্রাদার্স, স্টেশন বাজার, রংপুর।	৪০.৭৬	৩৯.৭৪	২২/০৫/২২	২২/০৫/২২	
প্যাকেজ নং-Nao-W-11 (lot-2), (আইডি-৬২০৬৬৩)	বগুড়া যান্ত্রিক বিভাগের মাধ্যমে নওগাঁ পওর বিভাগাধীন ৩টি প্রকল্পের প্রনবার্সন এবং আত্রাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় কাশিপুর ১ ভেন্ট, উজিরপুর ১ ভেন্ট, ছোট চাঁদপুর ২ ভেন্ট, বড় চাঁদপুর ১ ভেন্ট, রাজপাথ ১ ভেন্ট কাঠামোর ৬টি লিফ্ট গেট, ৫টি ফ্লাপ গেট ও ৬টি হোয়েস্ট সরবরাহ এবং স্থাপন কাজ।	মেসার্স নুরমম্বী মোল্লা পুরান বগুড়া, তিনমাথা, রেলগেট, বগুড়া।	১৫.৭২	১৫.৭২	২৮/০৬/২২	৩০/০৩/২২	
প্যাকেজ নং-Nao-W-12, (আইডি-৫৮৮৩১৬)	নওগাঁ জেলার পল্লীতলা উপজেলার অন্তর্গত কাশিপুর খাল, বড় চাঁদপুর খাল, ছোট চাঁদপুর খাল, রাজপাথ খাল এবং উজিরপুর খাল মোট ৬.০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন কাজ।	মেসার্স আমিন এ্যান্ড কোং, গগন বাবু রোড, খুলনা।	১০৫.২৬	৫৭.৫৭	২৮/০৪/২২	২৮/০৪/২২	
প্যাকেজ নং-Nao-W-13, (আইডি-৫৪৯৪৬৯)	আত্রাই নদীর কিঃমিঃ ২০.০০ হতে কিঃমিঃ ২৯.০০ = ৯.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ডেজিং কাজ।	এনজেক্টকে-ডন (জেভি) খান প্রাজা, মতিঝিল, ঢাকা।	১৬৭৫.৫৯	১৩২১.০২	১০/০৬/২২	২৮/০২/২৩	

প্যাকেজ নম্বর (দরপত্র আইডি নম্বর)	প্যাকেজ ভিত্তিক কাজের বর্ণনা	ঠিকাদারের নাম	চুক্তিমূল্য	পরিশোধিত বিলের পরিমাণ	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ	বিলম্বের কারণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
প্যাকেজ নং-Nao-W-14, (আইডি-৫৮৫৩৬৯)	আত্রাই নদীর কিঃমিঃ ১১.০০ হতে কিঃমিঃ ২০.০০ = ৯.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ডেজিং কাজ।	বঙ্গ ডেজারস লিমিটেড, বিজয় নগর ঢাকা।	২২৫৮.০৯	১৫৬১.৭৯	৩১/০৫/২২	৩১/০৩/২৩	
প্যাকেজ নং-Nao-W-15, (আইডি-৫৪৯৪৭১)	আত্রাই নদীর কিঃমিঃ ২.০০ হতে কিঃমিঃ ১১.০০ = ৯.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ডেজিং কাজ।	এসএসডিইসি এল এ্যান্ড এনসিএল (জেভি), ঢাকা।	২২৮২.৩৮	১২১৪.৪৯	১০/০৬/২২	১০/০৬/২২	
প্যাকেজ নং-Nao-W-16, (আইডি-৮৬২৫৪৬)	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে নওগাঁ পওর বিভাগ, বাপাউবো, নওগাঁর আওতায় বিভিন্ন বাঁধে বনায়ন কাজ।	মেসার্স ইউনাইটেড ব্রাদার্স, রংপুর।	৯.০০	৮.৯২	৩০/০৫/২৪	৩০/০৫/২৪	
প্যাকেজ নং-Nao-W-17, (আইডি-৮৫৯৯৯৬)	নওগাঁ জেলার পল্লীতলা উপজেলার বাদপুইয়া শিমুলতলী শ্মশানঘাট নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ১৮.৮১০ হতে কিঃমিঃ ১৮.৯১০ = ১০০ মিটার ও মহাদেবপুর উপজেলার বুড়াশিবতলা নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ২৩.৭৭০ হতে কিঃমিঃ ২৩.৮৭০ = ১০০ মিটার সর্বমোট ২০০.০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	ঐ	৩৪২.৯৯	৩৪২.৭৩	১৫/০৬/২৪	১৫/০৬/২৪	
প্যাকেজ নং-Nao-W-18, (আইডি-৮৬০০০১)	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার অন্তর্গত রাঙ্গামাটি নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ৮.৩০০ হতে কিঃমিঃ ৮.৭৯০ = ৪৯০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	এস জে (জেভি), নর্থ সার্কুলার রোড, ঠাকুরগাঁও।	১০২২.০৩	১০২১.৯৯	১৫/০৬/২৪	১৫/০৬/২৪	
প্যাকেজ নং-Nao-W-19, (আইডি-৮৬০০০২)	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার অন্তর্গত রাঙ্গামাটি নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ৮.৭৯০ হতে কিঃমিঃ ৯.১০০ = ৩১০ মিটার এবং উদয়শ্রী নামক স্থানে আত্রাই নদীর ডানতীরে কিঃমিঃ ৪.৭৫৫ হতে কিঃমিঃ ৪.৯০০ = ১৪৫ মিটার সর্বমোট ৪৫৫ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	মেসার্স জুয়েল ইলেকট্রনিক্স, মোজাফফর বিপণী বিতান, নওগাঁ।	৯৬৫.৬৫	৯৬৫.৬৩	১৫/০৬/২৪	১৫/০৬/২৪	

নোট: ভৌত কাজের স্থিরচিত্র সংযুক্ত।

৩৬.৭ লোকবল

প্রযোজ্য নয়।

৩৬.৮ আইন শৃংখলা

প্রযোজ্য নয়।

৩৬.৯ প্রাকৃতিক দুর্যোগ

বৈশ্বিক মহামারী করোনার কারণে প্রকল্প শুরুতে ঠিকাদার নিয়োগ করে কাজ বাস্তবায়নে কিছুটা বিলম্বিত হয়।

৩৬.১০ প্রকল্পে অর্থায়ন

প্রয়োজ্য নয়।

৩৬.১১ বরাদ্দ ও অর্থছাড়

(লক্ষটাকায়)

অর্থবছর	এডিপি বরাদ্দ	অর্থছাড়	অর্থব্যয়	অব্যয়িত	জিও/দপ্তরের স্মারকনম্বর
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২০২০-২০২১	১৪৭.০০	১৪৭.০০	১৪৪.৯৫	২.০৫	-
১ম ও ২য় কিস্তি		২৮.৫০			পাউবো (অর্থ) উবাত/৭০৮ তারিখঃ ০৯-০৬-২০২১ খ্রিঃ
১ম, ২য় কিস্তির অবশিষ্টাংশসহ ৩য় ও ৪র্থ কিস্তি		১১৮.৫০			পাউবো (অর্থ) উবাত/৭৫১ তারিখঃ ২৯-০৬-২০২১ খ্রিঃ
মোট (২০২০-২০২১) =	১৪৭.০০	১৪৭.০০	১৪৪.৯৫	২.০৫	
২০২১-২০২২	৪০০০.০০		৩৯৯৯.৯৭	০.০৩	স্মারক নং- ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০৫০.২১-৩২৭, তারিখঃ ২৯-০৫-২০২২ খ্রিঃ।
১ম কিস্তি	-	১০০০.০০			পাউবো (অর্থ) উবাত/২০৩ তারিখঃ ২৬-০৯-২০২১ খ্রিঃ
২য় কিস্তি	-	৯৯৭.০০			পাউবো (অর্থ) উবাত/৩৮০ তারিখঃ ২৮-১২-২০২১ খ্রিঃ
৩য় কিস্তি	-	১০০০.০০			পাউবো (অর্থ) উবাত/৫৪১ তারিখঃ ২৮-০৩-২০২২ খ্রিঃ
৪র্থ কিস্তি	-	১০০৩.০০			পাউবো (অর্থ) উবাত/৯০৬ তারিখঃ ২৭-০৬-২০২২ খ্রিঃ
উপমোট (২০২১-২০২২) =	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৩৯৯৯.৯৭	০.০৩	-
২০২২-২০২৩	৫৯৯৯.৩১	-	৫৯৯৯.৩১	০০.০০	স্মারক নং- ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০৫০.২১-৩৬০, তারিখঃ ০২-০৫-২০২৩ খ্রিঃ।
১ম কিস্তি	-	১২১৫.৯৪			পাউবো (অর্থ) উবাত/৯২ তারিখঃ ১১-০৯-২০২২ খ্রিঃ
২য় কিস্তি	-	১২১৪.৩০			পাউবো (অর্থ) উবাত/২৩৫ তারিখঃ ১০-১১-২০২২ খ্রিঃ
৩য় কিস্তি	-	১২১৫.০০			পাউবো (অর্থ) উবাত/৪৪৪ তারিখঃ ২২-০২-২০২৩ খ্রিঃ
১ম-৩য় কিস্তির অবশিষ্টাংশ	-	৮৫৪.৩২			পাউবো (অর্থ) উবাত/৬৩৯ তারিখঃ ২৪-০৪-২০২৩ খ্রিঃ
৪র্থ কিস্তি	-	১৪৯৯.৭৫			পাউবো (অর্থ) উবাত/৯৪০ তারিখঃ ২৪-০৬-২০২৩ খ্রিঃ
উপমোট (২০২২-২০২৩) =	৫৯৯৯.৩১	৫৯৯৯.৩১	৫৯৯৯.৩১	০০.০০	-
২০২৩-২০২৪	৫৬৫০.০০	৫৫৮৪.২৪	৫২৫৮.০৫	৩২৬.১৯	স্মারক নং- ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০৫০.২১-৪৩০, তারিখঃ ৩০-০৬-২০২৪ খ্রিঃ।
১ম কিস্তি	-	৯০০.০০			পাউবো (অর্থ) উবাত/১৪১ তারিখঃ ১৩-০৯-২০২৩ খ্রিঃ
২য় কিস্তি	-	৮৯৯.৫০			পাউবো (অর্থ) উবাত/৩০০ তারিখঃ ১৯-১১-২০২৩ খ্রিঃ
৩য় কিস্তি	-	৮৯৯.৭৫			পাউবো (অর্থ) উবাত/৫৩৪ তারিখঃ ১২-০৩-২০২৪ খ্রিঃ
১ম-৩য় কিস্তির অবশিষ্টাংশ	-	১৭৯৯.৯৯			পাউবো (অর্থ) উবাত/৬৮০ তারিখঃ ২৮-০৪-২০২৪ খ্রিঃ
৪র্থ কিস্তি	-	৫০০.০০			পাউবো (অর্থ) উবাত/৮৭৭ তারিখঃ ১৯-০৬-২০২৪ খ্রিঃ
৪র্থ কিস্তির অবশিষ্টাংশ	-	৫৮৫.০০			পাউবো (অর্থ) উবাত/৯১৪ তারিখঃ ২৫-০৬-২০২৪ খ্রিঃ
উপমোট (২০২৩-২০২৪) =	৫৬৫০.০০	৫৫৮৪.২৪	৫২৫৮.০৫	৩২৬.১৯	-
প্রকল্প সর্বমোট =	১৫৭৯৬.৩১	১৫৭৩০.৫৫	১৫৪০২.২৮	৩২৮.২৭	-

৩৬.১২ নকশা প্রস্তুত ও অনুমোদন

নিচের ছকে প্রতিটি ভৌত প্যাকেজের ডিজাইন ও প্রাক্কলন অনুমোদনের বর্ণনা দেওয়া হলো।

ক্র: নং	কাজের নাম ও প্যাকেজ নং	নকশা অনুমোদনের স্মারক ও তারিখ	নকশা অনুমোদনকারী	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রাক্কলন অনুমোদনের তারিখ	প্রাক্কলন অনুমোদনকারী
১	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার অন্তর্গত পূর্বনন্দনপুর নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ৬.৭০০ হতে কিঃমিঃ ৭.২০০ = ৫০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-Nao-W-1, (আইডি-৫৫৬১৪৫)	DRWG No: NAOG-PRO-0007 DATE: 25/11/2020.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল-৭, বাপাউবো, ঢাকা।	১১৮৩.০৪	০৪/০৩/২০২১	মহাপরিচালক বাপাউবো, ঢাকা
২	নওগাঁ জেলার পদ্মীতলা উপজেলার অন্তর্গত পূর্ব পাটিচড়া নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ৫.৮০০ হতে কিঃমিঃ ৬.৮০০ = ১০০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-Nao-W-2, (আইডি-৫১৮৬৯৫)	DRWG No: NAOG-PRO-8656 DATE: 15/10/2020.	ঐ	১৯৩৪.৯২	২৪/১১/২০২০	প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, রাজশাহী।
৩	নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার অন্তর্গত নুরপুর ও কলোনিপাড়া নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ২০.২০০ হতে কিঃমিঃ ২০.৫০০ = ৩০০ মিটার ও কিঃমিঃ ২৪.১৫০ হতে কিঃমিঃ ২৪.৬৮০ = ৫৩০ মিটার অর্থাৎ সর্বমোট ৮৩০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-Nao-W-3, (আইডি-৫১৮৬৯৭)	DRWG No: NAOG-PRO-8655 DATE: 15/10/2020.	ঐ	১৪৪১.৫৯	২৪/১১/২০২০	ঐ
৪	নওগাঁ জেলার পদ্মীতলা উপজেলার অন্তর্গত মাহমুদপুর ও ইছাপুর নামক স্থানে আত্রাই নদীর ডানতীরে কিঃমিঃ ১৬.২৮০ হতে কিঃমিঃ ১৬.৫৫০ = ২৭০ মিটার ও কিঃমিঃ ১৮.১০০ হতে কিঃমিঃ ১৮.৩৫০ = ২৫০ মিটার এবং কিঃমিঃ ১৮.৩৭৪ হতে কিঃমিঃ ১৮.৫৭৪ = ২০০ মিটার অর্থাৎ সর্বমোট = ৭২০.০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-Nao-W-4, (আইডি-৫১৮৬৯৮)	DRWG No: NAOG-PRO-8654 DATE: 15/10/2020	ঐ	১৪২৩.৪৭	২৪/১১/২০২০	ঐ
৫	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার অন্তর্গত উদয়গ্রী নামক স্থানে আত্রাই নদীর ডানতীরে কিঃমিঃ ৪.৯০০ হতে কিঃমিঃ ৫.১০০ = ২০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-Nao-W-5, (আইডি-৫৫৬১৫৬)	DRWG No: NAOG-PRO-0008 DATE: 25/11/2020	ঐ	৫১৫.৯৬	০৪/০৩/২০২১	মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
৬	নওগাঁ জেলার পদ্মীতলা উপজেলার অন্তর্গত বৈরাগীপোতা নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ৭.৩০০ হতে কিঃমিঃ ৭.৮৫০ = ৫৫০ মিটার এবং মহাশ্মাশান নামক স্থানে কিঃমিঃ ৭.৯০০ হতে কিঃমিঃ ৮.১০০ = ২০০ মিটার সর্বমোট ৭৫০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-Nao-W-6, (আইডি-৫৫৬১৫৭)	DRWG No: NAOG-PRO-0006 DATE: 25/11/2020	ঐ	১৫৭২.৭৩	০৪/০৩/২০২১	মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
৭	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার অন্তর্গত ছিলিমপুর ছালিগ্রাম উপ-প্রকল্পের আওতায় কিঃমিঃ ০.০০ হতে কিঃমিঃ ৪.০০০ = ৪.০ কিঃমিঃ বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ। প্যাকেজ নং-Nao-W-7, (আইডি-৫৮৮১৪০)	DWG No: EMB-NAO-ATR-373-0052 DATE: 12/04/2021	প্রধান প্রকৌশলী নকশা, বাপাউবো, ঢাকা।	২১৯.৯৬	২৭/০৫/২০২১	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী পওর সার্কেল, বাপাউবো, রাজশাহী।
৮	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার অন্তর্গত আত্রাই নদীর ডানতীর বীধ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় কিঃমিঃ ০.০০ হতে কিঃমিঃ ৫.০০ = ৫.০০০ কিঃমিঃ বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ। প্যাকেজ নং-Nao-W-8, (আইডি-৫৮৮৩১২)	DWG No: EMB-NAO-ATR-373-0051 DATE: 12/04/2021	ঐ	৫৬১.১০	১০/০৬/২০২১	মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
৯	নওগাঁ জেলার পদ্মীতলা ও মহাদেবপুর	DWG No: EMB-	ঐ	৮৫৪.২৩	১০/০৬/২০২১	মহাপরিচালক,

	উপজেলার অন্তর্গত পল্লীতলা উপ-প্রকল্পের আওতায় কিঃমিঃ ৫.০০০ হতে কিঃমিঃ ২৩.০০০ এর মধ্যবর্তী স্থানে = ৯.০০০ কিঃমিঃ বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ। প্যাকেজ নং-Nao-W-9, (আইডি-৫৮৮৩১৪)	NAO-ATR-373-0056 DATE: 29/04/2021				বাপাউবো, ঢাকা।
১০	নওগাঁ জেলার পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলার অন্তর্গত আত্রাই নদীর ডানতীর বীধ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় কিঃমিঃ ২৫.০০ হতে কিঃমিঃ ৩২.০০ = ৭.০০০ কিঃমিঃ বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ। প্যাকেজ নং-Nao-W-10, (আইডি-৫৮৮৩১৫)	DWG No: EMB-NAO-ATR-373-0051 DATE: 12/04/2021	ঐ	৬৩৫.৩৮	১০/০৬/২০২১	মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
১১	নওগাঁ জেলার পল্লীতলা উপজেলার অন্তর্গত কাশিপুর, বড় চাঁদপুর, ছোট চাঁদপুর, রাজপাথ এবং উজিরপুর নামক স্থানে ০৫টি রেলগেটের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-Nao-W-11 (lot-1), (আইডি-৬২০৬৮৩)	DWG No: REG-NAOG-ATR-373-0077 DATE: 22/09/2021	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল-৭, বাপাউবো, ঢাকা।	৪৫.২৯	১৭/১০/২০২১	নির্বাহী প্রকৌশলী, নওগাঁ পওর বিভাগ, বাপাউবো, নওগাঁ।
১২	নওগাঁ জেলার পল্লীতলা উপজেলার অন্তর্গত কাশিপুর খাল, বড় চাঁদপুর খাল, ছোট চাঁদপুর খাল, রাজপাথ খাল এবং উজিরপুর খাল মোট ৬.০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন কাজ। প্যাকেজ নং-Nao-W-12, (আইডি-৫৮৮৩১৬)	DWG No: KHAL-NAOG-373-0049 DATE: 11/04/2021	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল-৭, বাপাউবো, ঢাকা।	১১৬.৯৬	১০/০৬/২০২১	মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা।
১৩	আত্রাই নদীর কিঃমিঃ ২০.০০ হতে কিঃমিঃ ২৯.০০ = ৯.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং কাজ। প্যাকেজ নং-Nao-W-13, (আইডি-৫৪৯৪৬৯)	DWG No: DRE-NAO-ATR-373-0009 DATE: 30/11/2020	প্রধান প্রকৌশলী নকশা, বাপাউবো, ঢাকা।	১৮৬১.৭৭	১০/০২/২০২১	প্রধান প্রকৌশলী উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, রাজশাহী।
১৪	আত্রাই নদীর কিঃমিঃ ১১.০০ হতে কিঃমিঃ ২০.০০ = ৯.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং কাজ। প্যাকেজ নং-Nao-W-14, (আইডি-৫৮৫৩৬৯)	DWG No: DRE-NAO-ATR-373-0009 DATE: 30/11/2020	ঐ	২৫০৮.৯৮	১০/০২/২০২১	ঐ
১৬	আত্রাই নদীর কিঃমিঃ ২.০০ হতে কিঃমিঃ ১১.০০ = ৯.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং কাজ। প্যাকেজ নং-Nao-W-15, (আইডি-৫৪৯৪৭১)	DWG No: DRE-NAO-ATR-373-0009 DATE: 30/11/2020	ঐ	২৪৫২.৩৩	১০/০২/২০২১	ঐ
১৮	নওগাঁ জেলার পল্লীতলা উপজেলার বাদপুইয়া শিমুলতলী শ্মশানঘাট নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ১৮.৮১০ হতে কিঃমিঃ ১৮.৯১০ = ১০০ মিটার ও মহাদেবপুর উপজেলার বুড়াশিবতলা নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ২৩.৭৭০ হতে কিঃমিঃ ২৩.৮৭০ = ১০০ মিটার সর্বমোট ২০০.০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-Nao-W-17, (আইডি-৮৫৯৯৯৬)	DWG No: BPW-NAOG-ATR-373-0201 DATE: 05/04/2023	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, নকশা সার্কেল-৭, বাপাউবো, ঢাকা।	৩৮১.১০	২০/০৬/২০২৩	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী পওর সার্কেল, বাপাউবো, রাজশাহী।
১৯	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার অন্তর্গত রাণামাটি নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ৮.৩০০ হতে কিঃমিঃ ৮.৭৯০ = ৪৯০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-Nao-W-18, (আইডি-৮৬০০০১)	DWG No: BPW-NAOG-ATR-373-153 DATE: 12/06/2022	ঐ	১১৩৫.৫৯	২৬/০৬/২০২৩	প্রধান প্রকৌশলী উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, রাজশাহী।
২০	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার অন্তর্গত রাণামাটি নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ৮.৭৯০ হতে কিঃমিঃ ৯.১০০ = ৩১০ মিটার এবং উদয়গ্রী নামক স্থানে আত্রাই নদীর ডানতীরে কিঃমিঃ ৪.৭৫৫ হতে কিঃমিঃ ৪.৯০০ = ১৪৫ মিটার সর্বমোট ৪৫৫ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। প্যাকেজ নং-Nao-W-19, (আইডি-৮৬০০০২)	DWG No: BPW-NAOG-ATR-373-153 DATE: 12/06/2022 & DWG No: BPW-NAOG-ATR-373-154 DATE: 12/06/2022	ঐ	১০৭২.৯৪	২৬/০৬/২০২৩	ঐ

৩৬.১৩ প্রকল্প সহায়তা ছাড়করণ এবং পূর্ণভরণ

প্রযোজ্য নয়।

৩৬.১৪ মেসাদ ও ব্যয় বৃদ্ধি

প্রযোজ্য নয়।

৩৬.১৫ তত্ত্বাবধান/পরিবীক্ষণ

প্রযোজ্য নয়।

৩৬.১৬ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব

প্রযোজ্য নয়।

৩৬.১৭ যানবাহন

প্রযোজ্য নয়।

৩৬.১৮ প্রশিক্ষণ

প্রযোজ্য নয়।

৩৬.১৯ অনুমোদন

প্রযোজ্য নয়।

৩৬.২০ অন্যান্য।

৩৭. প্রকল্প পরিচালকের মতামত এবং সুপারিশ:

প্রকল্পটি আত্রাই নদীকে কেন্দ্র করে প্রস্তুত করা হয়। আত্রাই নদীটি মরফলোজিক্যালি Meandering প্রকৃতির। আত্রাই নদীর প্রবাহ পথে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা নদীর গতি পরিবর্তনের কারণে ভাঙন কবলিত হয়। আত্রাই নদীর ডান/বাম তীরে নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলার বিভিন্ন স্থান ব্যাপক ভাঙনের সম্মুখীন হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ৫.১৪৫ কিলোমিটার প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের ফলে নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার পূর্বনন্দনপুর, উদয়গ্রী, ছিলিমপুর ছালিগ্রাম ও রাজামাটি; পল্লীতলা উপজেলার পূর্ব পাটিচড়া, মাহমুদপুর, ইছাপুর, বৈরাগীপোতা, মহাশ্মাশান ও শিমুলতলী শ্মশানঘাট এবং মহাদেবপুর উপজেলার নুরপুর, কলোনীপাড়া ও বুড়াশীবতলা নামক স্থান নদীভাঙন হতে রক্ষা পেয়েছে। এছাড়া, ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলায় ২৭.০০ কিলোমিটার নদী ড্রেজিং, ১৭.১৬৪ কিলোমিটার বীধ পুনরাকৃতিকরণ, ৬.০ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন কাজ বাস্তবায়িত হওয়ায় নদীভাঙন হ্রাস, নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নয়ন হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন কালে প্রকল্প এলাকায় একটি বিশাল কর্মযজ্ঞের সৃষ্টি হয়। প্রকল্পের ভৌত কাজ বাস্তবায়নের সময় সহায় সম্বলহীন নিঃস্ব, হত দরিদ্র, দিনমজুর মানুষ সরাসরি কাজে অংশগ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয়। নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের ফলে নদী ভাঙন রোধ হওয়ায় প্রকল্প এলাকায় মানুষের মনে আস্থা ও স্বস্তি ফিরে এসেছে। প্রকল্প এলাকার সরকারি-বেসরকারি সম্পদ ও জনমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। তাছাড়া, নদী ড্রেজিং এর ফলে নদীর নাব্যতা ও ভূ-পরিস্থ পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় শুষ্ক মৌসুমে ভূ-পরিস্থ নদীর পানি ব্যবহার করে কৃষকরা খুব সহজেই কৃষি পণ্য উৎপাদন করতে পারছে। তাছাড়া, দেশীয় প্রজাতির মাছের আধিক্য বৃদ্ধির ফলে প্রকল্প এলাকার জেলে সম্প্রদায় উজ্জীবিত হয়েছে। অপরদিকে, বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়নের ফলে বন্যা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষ নতুন নতুন কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করে ব্যবসা-বানিজ্য শুরু করেছে। এতে করে প্রকল্প এলাকায় বহুমুখী কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে, প্রকল্প এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে।

সার্বিকভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নদী ভাঙন রোধ হয়েছে। নদী ও খাল খননের ফলে নদী ও খালের পানি ধারণ ও পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়েছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা বাড়ছে। ভূ-গর্ভস্থ পানির নিরাপত্তা নিশ্চিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র

বিমোচন করা সম্ভব হবে। ফলে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ব্যবসা ও বাণিজ্য ইত্যাদির প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশের যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য, বন ইত্যাদি ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন সাধন হবে তথা প্রকল্প এলাকার পরিবেশের উত্তরত্তোর উন্নতির মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে। তবে, প্রকল্পের সুফল বজায় রাখার নিমিত্ত ভবিষ্যতে প্রকল্পের বিভিন্ন ভৌত কাজের রক্ষাবেক্ষন করার প্রয়োজন হবে।

সার্বিকভাবে বলা যায় প্রকল্পটির উদ্দেশ্য সমূহ অর্জিত হওয়ায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি'র) অডীট ও লক্ষ্যমাত্রা সমূহ অর্জিত হয়েছে।

তারিখ: ... ২২-০২-২০২৪ ...

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবিসহ স্বাক্ষর ও সীল

(মোঃ ফাইজুর রহমান)
নিবাহী প্রকৌশলী
নওগাঁ পানি উন্নয়ন বিভাগ
বাপাউবো, নওগাঁ।

৩৮. সংস্থা প্রধানের মতামত এবং সুপারিশ:

আত্রাই নদীর ভাঙ্গন হতে নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলার বিভিন্ন স্থান নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা এবং নদী তীরবর্তী জনপদকে বন্যার প্রকোপ হতে রক্ষার জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রকল্পের আওতায় নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের ফলে নদী ভাঙ্গন হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, নদী ড্রেজিং এবং খাল পুনঃখনন এর ফলে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি সাধিত হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ায় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সার্থক বলে প্রতীয়মান হয়।

তারিখ:

সংস্থা প্রধানের নাম ও পদবিসহ স্বাক্ষর ও সীল

(মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা)
পরিচিতি নং- ৬৬০১১৮০০১
মহাপরিচালক
বাপাউবো, ঢাকা।

৩৯. মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব/সিনিয়র সচিবের মতামত এবং সুপারিশ:

প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সুফল অব্যাহত ও স্থায়ী রাখার জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নিয়মিত পরিচালন ও রক্ষাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

তারিখ:

মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব/সিনিয়র সচিবের স্বাক্ষর ও সীল

পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত:

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী		প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	দরপত্র আবহানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উদ্ধৃত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিমূল্য ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ	
প্যাকেজ নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা											চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
নওগাঁ- জি-১	ফটোকপিয়ার মেশিন ১টি	পরিকল্পনা: ১.৫০	আরএফকিউ	নির্বাহী প্রকৌশলী	২৯-০৪-২১	-	-	০৫/০৯/২১	০৫/০৯/২১	১.৫০	১.৫০	০৮-০৫-২১	০৮-০৫-২১
		প্রকৃত: ১.৫০	আরএফকিউ	নির্বাহী প্রকৌশলী	২৯-০৪-২১	-	-	০৫-০৫-২১	০৫-০৫-২১	০৫-০৫-২১			
		ব্যয়: -	-	-	-	-	-	-	-	০৫-০৫-২১			
নওগাঁ- জি-২	ফানিচার লামসাম	পরিকল্পনা: ৪.০০	আরএফকিউ	প্রধান প্রকৌশলী	১৯-০৫-২১	-	-	২৫/০৯/২১	২৫/০৯/২১	৪.০০	৪.০০	০৯-০৬-২১	০৯-০৬-২১
		প্রকৃত: ৪.০০	আরএফকিউ	প্রধান প্রকৌশলী	১৯-০৫-২১	-	-	২৫-০৫-২১	২৫-০৫-২১	২৫-০৫-২১			
		ব্যয়: -	-	-	-	-	-	-	-	২৫-০৫-২১			
নওগাঁ- জি-৩	মটর সাইকেল- ২টি	পরিকল্পনা: ৪.০০	আরএফকিউ	প্রধান প্রকৌশলী	১৯-০৫-২১	-	-	২৫/০৯/২১	২৫/০৯/২১	৪.০০	৪.০০	১০-০৬-২১	১০-০৬-২১
		প্রকৃত: ৪.০০	আরএফকিউ	প্রধান প্রকৌশলী	১৯-০৫-২১	-	-	২৫-০৫-২১	২৫-০৫-২১	২৫-০৫-২১			
		ব্যয়: -	-	-	-	-	-	-	-	২৫-০৫-২১			
নওগাঁ- জি-৪	স্ট্যান্ডসহ লেভেলিং মেশিন-২টি	পরিকল্পনা: ২.৫০	আরএফকিউ	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২৯-০৪-২১	-	-	০৫/০৯/২১	০৫/০৯/২১	২.৫০	২.৫০	১৫-০৫-২১	১৫-০৫-২১
		প্রকৃত: ২.৫০	আরএফকিউ	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২৯-০৪-২১	-	-	০৫-০৫-২১	০৫-০৫-২১	০৫-০৫-২১			
		ব্যয়: -	-	-	-	-	-	-	-	০৫-০৫-২১			
নওগাঁ- জি-৫	জিপিস-১টি	পরিকল্পনা: ০.৭০	আরএফকিউ	নির্বাহী প্রকৌশলী	০৪/০৫/২১	-	-	০৪/০৯/২১	০৪/০৯/২১	০.৭০	০.৭০	২৬-০৫-২১	২৬-০৫-২১
		প্রকৃত: ০.৭০	আরএফকিউ	নির্বাহী প্রকৌশলী	০৪/০৫/২১	-	-	১১-০৫-২১	১১-০৫-২১	১১-০৫-২১			
		ব্যয়: -	-	-	-	-	-	-	-	১১-০৫-২১			
নওগাঁ- জি-৬	লেজার প্রিন্টার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ ব্র্যান্ড কম্পিউটার- ২টি	পরিকল্পনা: ২.০০	আরএফকিউ	নির্বাহী প্রকৌশলী	২৯-০৪-২১	-	-	০৫/০৯/২১	০৫/০৯/২১	২.০০	২.০০	১৫-০৫-২১	১৫-০৫-২১
		প্রকৃত: ২.০০	আরএফকিউ	নির্বাহী প্রকৌশলী	২৯-০৪-২১	-	-	০৫-০৫-২১	০৫-০৫-২১	০৫-০৫-২১			
		ব্যয়: -	-	-	-	-	-	-	-	০৫-০৫-২১			
নওগাঁ- জি-৭	লেজার প্রিন্টার সহ ল্যাপটপ-২টি	পরিকল্পনা: ২.৫০	আরএফকিউ	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২৯-০৪-২১	-	-	০৫/০৯/২১	০৫/০৯/২১	২.৫০	২.৫০	১৫-০৫-২১	১৫-০৫-২১
		প্রকৃত: ২.৫০	আরএফকিউ	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২৯-০৪-২১	-	-	০৫-০৫-২১	০৫-০৫-২১	০৫-০৫-২১			
		ব্যয়: -	-	-	-	-	-	-	-	০৫-০৫-২১			

(মোঃ ফজলুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
নওগাঁ পানি উন্নয়ন বিভাগ
বাপাউবো, নওগাঁ।

* পরিকল্পনা ও প্রকৃত তারিখ উল্লেখ করুন
** ব্যতায় হিসেবে পরিকল্পনা ও প্রকৃত তারিখের মধ্যে পার্থক্য দিন এ উল্লেখ করুন
*** প্রকল্প দলিলের ক্রম পরিকল্পনায় উল্লিখিত তারিখ পরিকল্পনা হিসেবে উল্লেখ করুন

কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য:

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী		প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী	দরপত্র আহবানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিমূল্য ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ	
প্যাকেজ নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা											চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
প্যাকেজ নং-Nao- W-1, (আইডি- ৫৫৬১৪৫)	নওগাঁ জেলার খামুইরহাট উপজেলার অন্তর্গত পূর্বনন্দনপুর নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ৬.৭০০ হতে কিঃমিঃ ৭.২০০ = ৫০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	পরিকল্পনা: ১০৬৮.৬৭	উন্মুক্ত	প্রধান প্রকৌশলী	০৮/০৮/২০	দৈনিক ইত্তেফাক (বাং)	-	০৪/১০/২০	০৫/১০/২০	১০৬৪.৭৪ ও ১৬/০৭/২১	১০৬৪.৫০	৩১/০৫/২২	৩১/১০/২২
		প্রকৃত: ১১৮৩.০৪			০৮/০৩/২১	দৈনিক সানসাইন (বাং)	১২/০৪/২১	০৪/০৭/২১	০৪/০৭/২১				
		ব্যয়: -			২১০ দিন	দৈনিক ইআনসি (ইং)	-	২৭০ দিন	২৬৯ দিন				
প্যাকেজ নং-Nao- W-2, (আইডি- ৫১৮৬৯৫)	নওগাঁ জেলার পল্লীতলা উপজেলার অন্তর্গত পূর্ব পাটিচড়া নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ৫.৮০০ হতে কিঃমিঃ ৬.৮০০ = ১০০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	পরিকল্পনা: ২১১০.৯০	উন্মুক্ত	অতি: মহাপরিচালক	২৬/০৮/২০	দৈনিক আমাদের সময় (বাং)	-	১৪/১০/২০	১৫/১০/২০	১৭৪১.৪৩ ও ১২/০৫/২১	১৭৪০.৪৩	৩১/০৫/২২	০২/০৪/২৩
		প্রকৃত: ১৯৩৪.৯২			২৬/১১/২০	দৈনিক পোস্ট (ইং)	২৯/১২/২০	১৪/০৪/২১	১৪/০৪/২১				
		ব্যয়: -			৯০ দিন	-	-	১৮০ দিন	১৭৯ দিন				
প্যাকেজ নং-Nao- W-3, (আইডি- ৫১৮৬৯৭)	নওগাঁ জেলার মহাদেবপুর উপজেলার অন্তর্গত নুরপুর ও কলোনিপাতা নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ২০.২০০ হতে কিঃমিঃ ২০.৫০০ = ৩০০ মিটার ও কিঃমিঃ ২৪.১৫০ হতে কিঃমিঃ ২৪.৬৮০ = ৫৩০ মিটার অর্থাৎ সর্বমোট ৮৩০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	পরিকল্পনা: ১৫৮৮.৫৯	উন্মুক্ত	প্রধান প্রকৌশলী	২৬/০৮/২০	দৈনিক আমাদের সময় (বাং)	-	১৪/১০/২০	১৫/১০/২০	১২৯৭.৪৩ ও ১২/০৫/২১	১২৯৭.৩২	৩১/০৫/২২	৩১/০৫/২৪
		প্রকৃত: ১৪৪১.৫৯			২৬/১১/২০	দৈনিক পোস্ট (ইং)	২৯/১২/২০	১৪/০৪/২১	১৪/০৪/২১				
		ব্যয়: -			৯০ দিন	-	-	১৮০ দিন	১৭৯ দিন				
প্যাকেজ নং-Nao- W-4, (আইডি- ৫১৮৬৯৮)	নওগাঁ জেলার পল্লীতলা উপজেলার অন্তর্গত মাহমুদপুর ও ইছাপুর নামক স্থানে আত্রাই নদীর ডানতীরে কিঃমিঃ ১৬.২৮০ হতে কিঃমিঃ ১৬.৫৫০ = ২৭০ মিটার ও কিঃমিঃ ১৮.১০০ হতে কিঃমিঃ ১৮.৩৫০ = ২৫০ মিটার এবং	পরিকল্পনা: ১৯৭৬.৭৯	উন্মুক্ত	প্রধান প্রকৌশলী	২৬/০৮/২০	দৈনিক আমাদের সময় (বাং)	-	১৪/১০/২০	১৫/১০/২০	১২৮২.১২ ও ১২/০৫/২১	১২৮০.৪০	৩১/০৫/২২	৩১/০৫/২৩
		প্রকৃত: ১৪২৩.৪৭			২৬/১১/২০	দৈনিক পোস্ট (ইং)	২৯/১২/২০	১৪/০৪/২১	১৪/০৪/২১				

প্যাকেজ নম্বর	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা	প্রাথমিক তথ্য (লক্ষ টাকায়)			ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী	দরপত্র আহবানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি তারিখ ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ	
		(১)	(২)	(৩)										চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
প্যাকেজ নং-Nao- W-5, (আইডি- ৫৫৬১৫৬)	কিঃমিঃ ১৮.৩৭৪ হতে কিঃমিঃ ১৮.৫৭৪ = ২০০ মিটার অর্থাৎ সর্বমোট = ৭২০.০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার অন্তর্গত উদয়হী নামক স্থানে আত্রাই নদীর ডানতীরে কিঃমিঃ ৪.৯০০ হতে কিঃমিঃ ৫.১০০ = ২০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	৫০৬.৮০	৫২৫.৯৬	উন্মুক্ত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৯০ দিন	দৈনিক সানসাইন (বাং) দৈনিক ইন্ডেক্স (বাং) দৈনিক ইভাঙ্গি (ইং)	০৮/০৮/২১	২৭/১০/২০	৩০/১০/২০	৪৬৪.৩৬ ও ১৪/০৭/২১	৪৬১.৫৫	৩১/০৩/২২	৩১/০৩/২২
প্যাকেজ নং-Nao- W-6, (আইডি- ৫৫৬১৫৭)	কিঃমিঃ ১৮.৩৭৪ হতে কিঃমিঃ ১৮.৫৭৪ = ২০০ মিটার অর্থাৎ সর্বমোট = ৭২০.০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার অন্তর্গত উদয়হী নামক স্থানে আত্রাই নদীর ডানতীরে কিঃমিঃ ৪.৯০০ হতে কিঃমিঃ ৫.১০০ = ২০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	৫০৬.৮০	৫২৫.৯৬	উন্মুক্ত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৯০ দিন	দৈনিক সানসাইন (বাং) দৈনিক ইন্ডেক্স (বাং) দৈনিক ইভাঙ্গি (ইং)	০৮/০৮/২১	২৭/১০/২০	৩০/১০/২০	৪৬৪.৩৬ ও ১৪/০৭/২১	৪৬১.৫৫	৩১/০৩/২২	৩১/০৩/২২
প্যাকেজ নং-Nao- W-7, (আইডি- ৫৮৮১৪০)	কিঃমিঃ ১৮.৩৭৪ হতে কিঃমিঃ ১৮.৫৭৪ = ২০০ মিটার অর্থাৎ সর্বমোট = ৭২০.০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার অন্তর্গত হিলিমপুর ছাগিগ্রাম উপ-গ্রামের আওতাধীন কিঃমিঃ ০.০০ হতে কিঃমিঃ ৪.০০০ = ৪.০ কিঃমিঃ বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ।	৫০৬.৮০	৫২৫.৯৬	উন্মুক্ত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৯০ দিন	দৈনিক সানসাইন (বাং) দৈনিক ইন্ডেক্স (বাং) দৈনিক ইভাঙ্গি (ইং)	০৮/০৮/২১	২৭/১০/২০	৩০/১০/২০	৪৬৪.৩৬ ও ১৪/০৭/২১	৪৬১.৫৫	৩১/০৩/২২	৩১/০৩/২২
প্যাকেজ নং-Nao- W-8, (আইডি- ৫৮৮১৪১)	কিঃমিঃ ১৮.৩৭৪ হতে কিঃমিঃ ১৮.৫৭৪ = ২০০ মিটার অর্থাৎ সর্বমোট = ৭২০.০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার অন্তর্গত আত্রাই নদীর ডানতীর বীধ নির্মাণ প্রকল্পের আওতাধীন কিঃমিঃ ০.০০ হতে কিঃমিঃ ৫.০০ = ৫.০০০ কিঃমিঃ বীধ	৫০৬.৮০	৫২৫.৯৬	উন্মুক্ত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	৯০ দিন	দৈনিক সানসাইন (বাং) দৈনিক ইন্ডেক্স (বাং) দৈনিক ইভাঙ্গি (ইং)	০৮/০৮/২১	২৭/১০/২০	৩০/১০/২০	৪৬৪.৩৬ ও ১৪/০৭/২১	৪৬১.৫৫	৩১/০৩/২২	৩১/০৩/২২

প্যাকেজ নম্বর	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)			ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী	দরপত্র আহবানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিস্থল ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ	
		(৩)	(৪)	(৫)										চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
(১)	(২)						(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
প্যাকেজ নং-Nao- W-9, (আইডি- ৫৮৮৩১৪)	পুনরাকৃতির কাজ। নওগাঁ জেলার পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলার অন্তর্গত পল্লীতলা উপ-প্রকল্পের আওতায় কিংমিঃ ৫.০০০ হতে কিংমিঃ ২৩.০০০ এর মধ্যবর্তী স্থানে = ১৮.০০০ কিংমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতির কাজ কাজ।	পরিকল্পনা: ১১২০.২৪	উন্মুক্ত	তথ্যবাহ্যিক প্রকৌশলী	১৪/০৭/২১	দৈনিক সমকাল (বাং)	১৪/০৭/২১	১৪/০৭/২১	১৪/০৭/২১	১৪/০৭/২১	১৪/০৭/২১	১৪/০৭/২১	১৪/০৭/২১	১৪/০৭/২১	১৪/০৭/২১
		প্রকৃত: ৮৫৪.২৩													
		ব্যয়: -													
প্যাকেজ নং-Nao- W-10, (আইডি- ৫৮৮৩১৫)	নওগাঁ জেলার পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলার অন্তর্গত আত্রাই নদীর ডানতীর বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় কিংমিঃ ২৫.০০ হতে কিংমিঃ ৩২.০০ = ৭.০০০ কিংমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতির কাজ।	পরিকল্পনা: ৭৯৮.৪২	উন্মুক্ত	তথ্যবাহ্যিক প্রকৌশলী	১৪/০৭/২১	দৈনিক সমকাল (বাং)	১৪/০৭/২১	১৪/০৭/২১	১৪/০৭/২১	১৪/০৭/২১	১৪/০৭/২১	১৪/০৭/২১	১৪/০৭/২১	১৪/০৭/২১	১৪/০৭/২১
		প্রকৃত: ৬৩৫.৩৮													
		ব্যয়: -													
প্যাকেজ নং-Nao- W-11 (lot-1), (আইডি- ৬২০৬৮৩)	নওগাঁ জেলার পল্লীতলা উপজেলার অন্তর্গত কাশিপুর, বড় চাঁদপুর, ছোট চাঁদপুর, রাজপাখ এবং উজিরপুর নামক স্থানে ০৫টি রেগুলেটর মোরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	পরিকল্পনা: ৩৯.৭৫	উন্মুক্ত	প্রকল্প পরিচালক	১৭/১১/২১	দৈনিক আমাদের নতুন সময় (বাং)	১৭/১১/২১	১৭/১১/২১	১৭/১১/২১	১৭/১১/২১	১৭/১১/২১	১৭/১১/২১	১৭/১১/২১	১৭/১১/২১	১৭/১১/২১
		প্রকৃত: ৪৫.২৯													
		ব্যয়: -													
প্যাকেজ নং-Nao- W-11 (lot-2), (আইডি- ৬২০৬৮৩)	বগুড়া যাত্রিক বিভাগের মাধ্যমে নওগাঁ পওর বিভাগধীন ৩টি প্রকল্পের প্রনবাসন এবং আত্রাই নদীর জেজিংসহ তীর সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় কাশিপুর ১ ভেট, উজিরপুর ১ ভেট, ছোট চাঁদপুর ২ ভেট, বড় চাঁদপুর ১ ভেট, রাজপাখ ১ ভেট কাঠামোর ৬টি লিট গোট, ৫টি ফ্লাপ গোট ও ৬টি হোয়েষ্ট সরবরাহ এবং স্থাপন কাজ।	পরিকল্পনা: ১৫.৭২	উন্মুক্ত	প্রকল্প পরিচালক	১৫/১০/২১	দৈনিক বাংলাদেশের খবর (বাং)	১৫/১০/২১	১৫/১০/২১	১৫/১০/২১	১৫/১০/২১	১৫/১০/২১	১৫/১০/২১	১৫/১০/২১	১৫/১০/২১	১৫/১০/২১
		প্রকৃত: ১৭.৪৮													
		ব্যয়: -													
প্যাকেজ নং-Nao-	নওগাঁ জেলার পল্লীতলা উপজেলার অন্তর্গত কাশিপুর	পরিকল্পনা: ৮৮.৭২	উন্মুক্ত	নির্বাহী প্রকৌশলী	১৪/০৬/২১	দৈনিক সমকাল (বাং)	১৪/০৬/২১	১৪/০৬/২১	১৪/০৬/২১	১৪/০৬/২১	১৪/০৬/২১	১৪/০৬/২১	১৪/০৬/২১	১৪/০৬/২১	১৪/০৬/২১

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী


প্রকল্প দাখিল অনুযায়ী		প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী	দরপত্র আহবানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিস্থল ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ	
প্যাকেজ নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা											চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
W-12, (আইডি- ৫৮৮৩১৬)	খাল, বড় চাঁদপুর খাল, ছোট চাঁদপুর খাল, রাজপাথ খাল এবং উজিরপুর খাল মোট ৬.০ কিমিঃ খাল পুনঃখনন কাজ।	প্রকৃত: ১১৬.৯৬ ব্যয়: -			১৪/০৬/২১	দৈনিক আমাদের রাজশাহী (বাং) দৈনিক নিউএজ (ইং)	৩০/০৬/২১	২২/০৯/২১	২১/০৯/২১	০৫/১০/২১			
প্যাকেজ নং-Nao- W-13, (আইডি- ৫৪৯৪৬৯)	আত্রাই নদীর কিঃমিঃ ২০.০০ হতে কিঃমিঃ ২৯.০০ = ৯.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং কাজ।	পরিকল্পনা: ১৯২৯.৮৫ প্রকৃত: ১৮৬১.৭৭ ব্যয়: -	উন্মুক্ত	অতিরিক্ত মহাপরিচালক	০৫/০৯/২০ ২০/০২/২১ ১৬ই দিন	- দৈনিক সানসাইন (বাং)	- ২১/০৩/২১	১৯/১১/২০ ১৫/০৬/২১	১৯/১১/২০ ১৬/০৬/২১	১৬/১১/২০ ১৬/০৬/২১	১০২১.০২	১০/০৬/২২	২৮/০২/২৩
প্যাকেজ নং-Nao- W-14, (আইডি- ৫৮৫৩৬৯)	আত্রাই নদীর কিঃমিঃ ১১.০০ হতে কিঃমিঃ ২০.০০ = ৯.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং কাজ।	পরিকল্পনা: ২৯৮৯.৯৫ প্রকৃত: ২৫০৮.৯৮ ব্যয়: -	উন্মুক্ত	মহাপরিচালক	০৫/০৯/২০ ০৫/০৬/২১ ২৭০ দিন	দৈনিক আমাদের সংবাদ (বাং) দৈনিক নিউএজ (ইং)	- ২৭/০৬/২১	১৯/১১/২০ ১৯/০৯/২১	২০/১১/২০ ১৯/০৯/২১	২২/০৮-০৯ ২৩/০৯/২১	১৫৬১.৭৯	৩১/০৫/২২	৩১/০৩/২৩
প্যাকেজ নং-Nao- W-15, (আইডি- ৫৪৯৪৭১)	আত্রাই নদীর কিঃমিঃ ২.০০ হতে কিঃমিঃ ১১.০০ = ৯.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং কাজ।	পরিকল্পনা: ২৪৮৯.৬০ প্রকৃত: ২৪৫২.৩৩ ব্যয়: -	উন্মুক্ত	মহাপরিচালক	২০/০৯/২০ ২০/০২/২১ ১৫০ দিন	দৈনিক সানসাইন (বাং)	- ৩১/০৩/২১	১০/০৯/২০ ১০/০৬/২১	১১/০৯/২০ ১৬/০৬/২১	২২/০৮-০৯ ২১/০৬/২১	১২১৪.৪৯	১০/০৬/২২	১০/০৬/২২
প্যাকেজ নং-Nao- W-16, (আইডি- ৮৬২৫৪৬)	২০২৩-২৪ অর্থ বছরে নওগাঁ পওর বিভাগ, বাপাউবা, নওগাঁর আওতায় বিভিন্ন বীথে বনায়ন কাজ।	পরিকল্পনা: ১০.০০ প্রকৃত: ১০.০০ ব্যয়: -	উন্মুক্ত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১৪/০৫/২৩ ১৪/০৮/২৩	দৈনিক ঢাকা টাইবুন (ইং) দৈনিক আজকের দর্পন (বাং)	- ০৬/০৯/২৩	১২/০৬/২৩ ১২/১০/২৩	১২/০৬/২৩ ১২/১০/২৩	৯.০০ ১৫/১০/২৩	৮.৯২	৩০/০৫/২৪	৩০/০৫/২৪
প্যাকেজ নং-Nao- W-17, (আইডি- ৮৫৯৯৯৬)	নওগাঁ জেলার পল্লীতলা উপজেলার বাদপুইয়া শিমুলতলী শ্মশানঘাট নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ১৮.৮১০ হতে কিঃমিঃ ১৮.৯১০ = ১০০ মিটার ও মহাদেবপুর উপজেলার বুড়াশিবতলা নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ২৩.৭৭০ হতে	পরিকল্পনা: ৩৮১.১১ প্রকৃত: ৩৮১.১০ ব্যয়: -	উন্মুক্ত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	০৭/০৫/২৩	দৈনিক ঢাকা টাইবুন (ইং) দৈনিক কালের কন্ঠ (বাং)	- ৩০/০৮/২৩	১২/০৬/২৩ ১২/১০/২৩	১২/০৬/২৩ ১২/১০/২৩	৩৪২.৯৯ ২৯/১০/২৩	৩৪২.৭৩	১৫/০৬/২৪	১৫/০৬/২৪

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী		(লক্ষ টাকায়)											
প্যাকেজ নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী	দরপত্র আহবানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিস্থল ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
প্যাকেজ নং-Nao- W-18, (আইডি- ৮৬০০০১)	কিংমিঃ ২৩.৮৭০ = ১০০ মিটার সর্বমোট ২০০.০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ। নওগাঁ জেলার খামুইরহাট উপজেলার অন্তর্গত রাজামাটি নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে কিংমিঃ ৮.৩০০ হতে কিংমিঃ ৮.৭৯০ = ৪৯০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	পরিকল্পনা: ১১৩৭.৯৩	উন্মুক্ত	প্রধান প্রকৌশলী	০৭/০৫/২৩	দৈনিক ঢাকা টাইমুন (ইং) দৈনিক কালের কণ্ঠ (বাং)	-	২৬/০৬/২৩	২৬/০৬/২৩	১০২২.০৩ ও ১৩/১১/২৩	১০২২.৯৯	১৫/০৬/২৪	১৫/০৬/২৪
		প্রকৃত: ১১৩৫.৫৯			০৭/০৮/২৩		০৬/০৯/২৩	২৬/১০/২৩	২৬/১০/২৩				
		ব্যতায়: -			৯০ দিন		-	১২০ দিন	১২০ দিন				
প্যাকেজ নং-Nao- W-19, (আইডি- ৮৬০০০২)	নওগাঁ জেলার খামুইরহাট উপজেলার অন্তর্গত রাজামাটি নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে কিংমিঃ ৮.৭৯০ হতে কিংমিঃ ৯.১০০ = ৩১০ মিটার এবং উদয়গ্রী নামক স্থানে আত্রাই নদীর ডানতীরে কিংমিঃ ৮.৭৫৫ হতে কিংমিঃ ৮.৯০০ = ১৪৫ মিটার সর্বমোট ৪৫৫ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	পরিকল্পনা: ১১০৩.৬৫	উন্মুক্ত	প্রধান প্রকৌশলী	০৭/০৫/২৩	দৈনিক ঢাকা টাইমুন (ইং) দৈনিক কালের কণ্ঠ (বাং)	-	২৬/০৫/২৩	২৬/০৬/২৩	৯৬৫.৬৫ ও ১৩/১১/২৩	৯৬৫.৬৩	১৫/০৬/২৪	১৫/০৬/২৪
		প্রকৃত: ১০৭২.৯৪			০৭/০৮/২৩		০৬/০৯/২৩	২৬/১০/২৩	২৬/১০/২৩				
		ব্যতায়: -			৯০ দিন		-	১৫০ দিন	১৫০ দিন				

*পরিকল্পনা ও প্রকৃত তারিখ উল্লেখ করুন

** ব্যতায় হিসেবে পরিকল্পনা ও প্রকৃত তারিখের মধ্যে পার্থক্য দিন এ উল্লেখ করুন

*** প্রকল্প দলিলের ক্রয় পরিকল্পনায় উল্লিখিত তারিখ পরিকল্পনা হিসেবে উল্লেখ করুন।


 মোঃ সুইজুর রহমান
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 নওগাঁ পানি উন্নয়ন বিভাগ
 বাপাউবো, নওগাঁ।


সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী	প্যাকেজ নম্বর	প্যাকেজের বর্ণনা	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	দরপত্র আহবানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	LOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিমূল্য ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ	
													চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
-			পরিকল্পনা:											
			প্রকৃত:		প্র	যো	জ্য		ন	য়				
			ব্যতায়:											

*পরিকল্পনা ও প্রকৃত তারিখ উল্লেখ করুন


** ব্যতায় হিসেবে পরিকল্পনা ও প্রকৃত তারিখের মধ্যে পার্থক্য দিন এ উল্লেখ করুন

*** প্রকল্প দলিলের ক্রয় পরিকল্পনায় উল্লিখিত তারিখ পরিকল্পনা হিসেবে উল্লেখ করুন


 (স্বাক্ষর কর্তৃক স্বাক্ষর)
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 নওগাঁ পানি উন্নয়ন বিভাগ
 বাপাডিমো, নওগাঁ।

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের স্থিরচিত্র-১



কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি





কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি



চিত্র: নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ (পূর্বনন্দনপুর, ধামুইরহাট, নওগাঁ, প্যাকেজ নং-Nao-W-1, টেন্ডার আইডি-৫৫৬১৪৫)

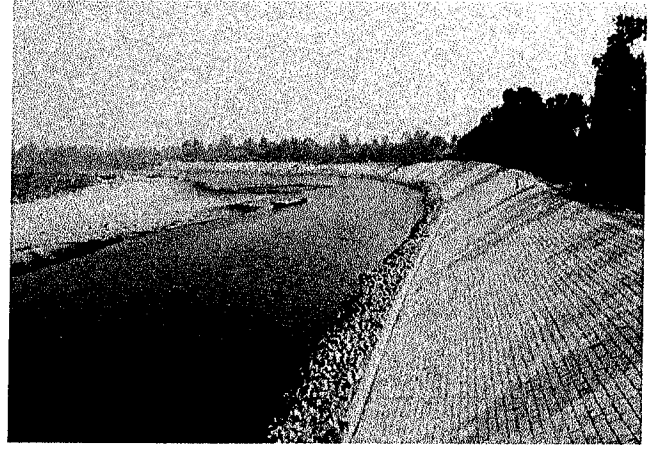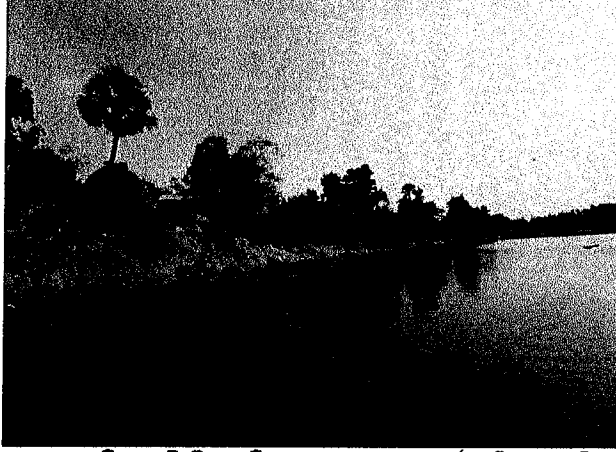

চিত্র: নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ (পূর্ব পাটিচড়া, পল্লীতলা, নওগাঁ, প্যাকেজ নং-Nao-W-2, টেন্ডার আইডি-৫১৮৬৯৫)

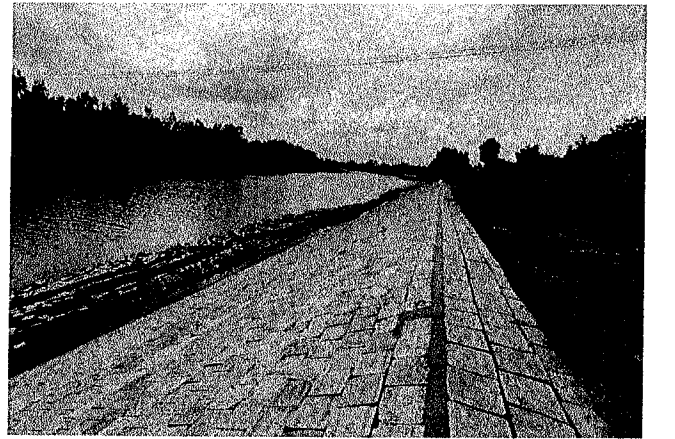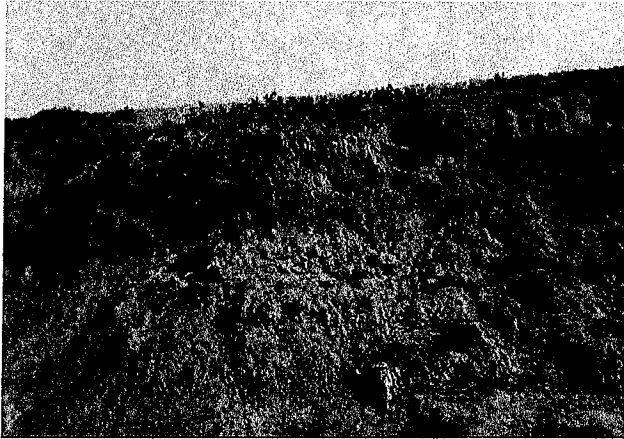


চিত্র: নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ (কলোনীপাড়া, মহাদেবপুর, নওগাঁ, প্যাকেজ নং-Nao-W-3, টেন্ডার আইডি-৫১৮৬৯৭)

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের স্থিরচিত্র-২


কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি



কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

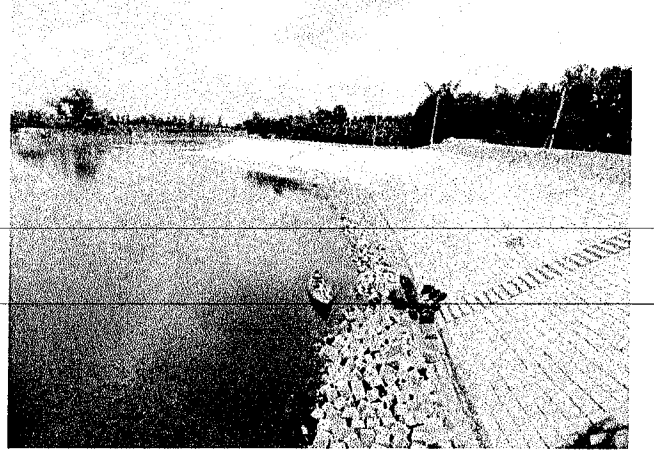

চিত্র: নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ (ইছাপুর, পল্লীতলা, নওগাঁ, প্যাকেজ নং-Nao-W-4, টেন্ডার আইডি-৫১৮৬৯৮)

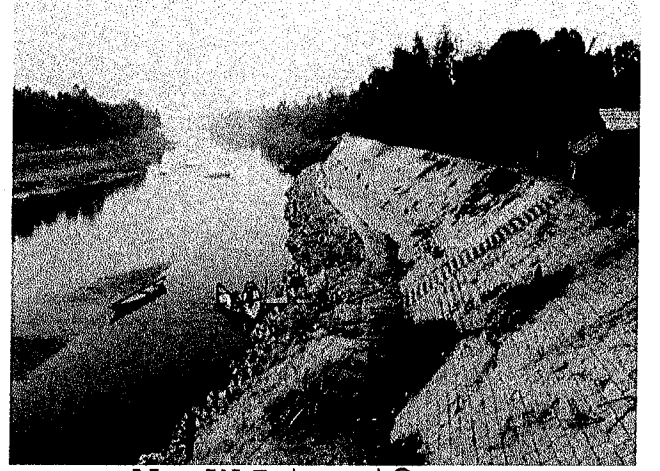

চিত্র: নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ (উদয়শ্রী, খামুইরহাট, নওগাঁ, প্যাকেজ নং-Nao-W-5, টেন্ডার আইডি-৫৫৬১৫৬)



চিত্র: নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ (বৈরাগীপোতা, পল্লীতলা, নওগাঁ, প্যাকেজ নং-Nao-W-6, টেন্ডার আইডি-৫৫৬১৫৭)

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের স্থিরচিত্র-৩

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি



কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি



চিত্র: বীধ পুনঃরাকৃতিকরণ কাজ (বেড়িতলা, খামুইরহাট, নওগাঁ, প্যাকেজ নং-Nao-W-8, টেন্ডার আইডি-৫৮৮৩১২)



চিত্র: বীধ পুনঃরাকৃতিকরণ কাজ (পল্লীতলা, নওগাঁ, প্যাকেজ নং-Nao-W-9, টেন্ডার আইডি-৫৮৮৩১৪)



চিত্র: বীধ পুনঃরাকৃতিকরণ কাজ (মহাদেবপুর, নওগাঁ, প্যাকেজ নং-Nao-W-10, টেন্ডার আইডি-৫৮৮৩১৫)

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের স্থিরচিত্র-৪

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি



কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি



চিত্র: রেগুলেটর মেরামত কাজ (রাজপথ রেগুলেটর, পল্লীতলা, নওগাঁ, প্যাকেজ নং-Nao-W-11, টেন্ডার আইডি-৬২০৬৮৩)




চিত্র: খাল পুন:খনন কাজ (কাশিপুর খাল, পল্লীতলা, নওগাঁ, প্যাকেজ নং-Nao-W-12, টেন্ডার আইডি-৫৮৮৩১৬)




চিত্র: নদী ড্রেজিং কাজ (মহাদেবপুর, নওগাঁ, প্যাকেজ নং-Nao-W-13, টেন্ডার আইডি-৫৪৯৪৬৯)

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের স্থিরচিত্র-৫


কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি

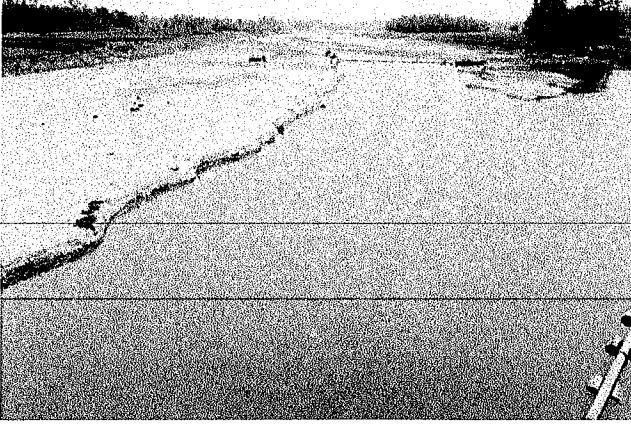

কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি

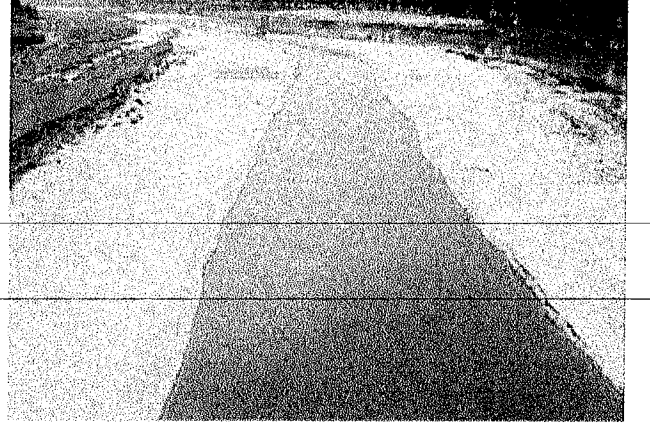

চিত্র: নদী ড্রেজিং কাজ (পল্লীতলা, নওগাঁ, প্যাকেজ নং-Nao-W-14, টেন্ডার আইডি-৫৮৫৩৬৯)

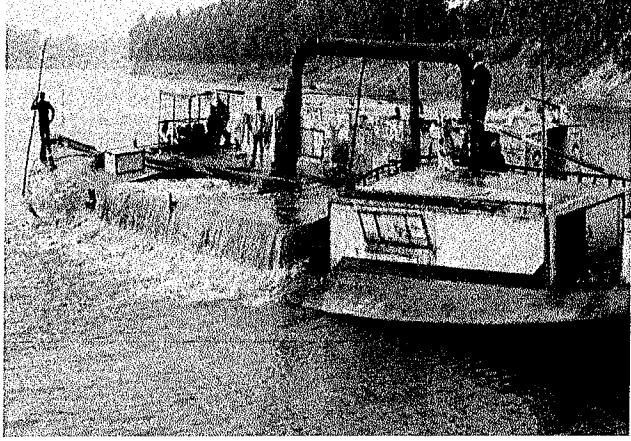

চিত্র: নদী ড্রেজিং কাজ (খামুইরহাট, নওগাঁ, প্যাকেজ নং-Nao-W-15, টেন্ডার আইডি-৫৪৯৪৭১)



চিত্র: বনায়ন কাজ (কলোনীপাড়া, মহাদেবপুর, নওগাঁ, প্যাকেজ নং-Nao-W-16, টেন্ডার আইডি-৮৬২৫৪৬)

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের স্থিরচিত্র-৬

কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের ছবি





কাজ বাস্তবায়নের পরের ছবি



চিত্র: নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ (বুড়াশিবতলা, মহাদেবপুর, নওগাঁ, প্যাকেজ নং-Nao-W-17, টেন্ডার আইডি-৮৫৯৯৯৬)



চিত্র: নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ (শিমুলতলী, খামুইরহাট, নওগাঁ, প্যাকেজ নং-Nao-W-18, টেন্ডার আইডি-৮৬০০০১)

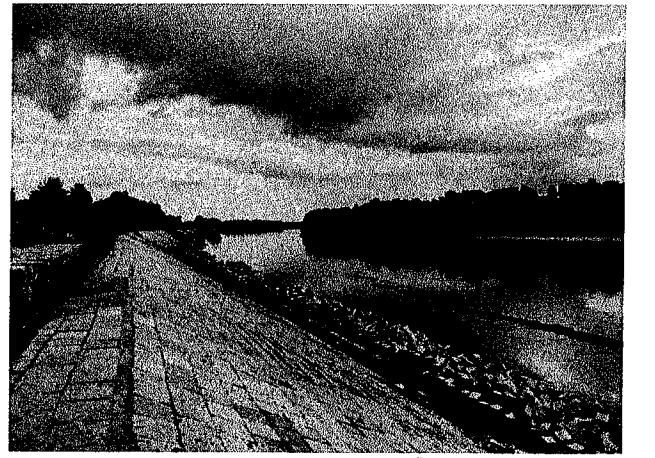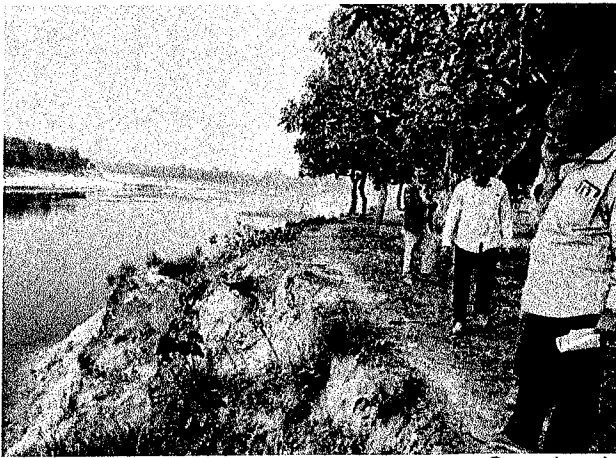

চিত্র: নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ (রাঙ্গামাটি, খামুইরহাট, নওগাঁ, প্যাকেজ নং-Nao-W-19, টেন্ডার আইডি-৮৬০০০২)

4


প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত কাজের স্থিরচিত্র-৭



চিত্র: বাঁধে গাছ লাগানো হচ্ছে।



চিত্র: বাঁধের কাজের মান চেক করা হচ্ছে।

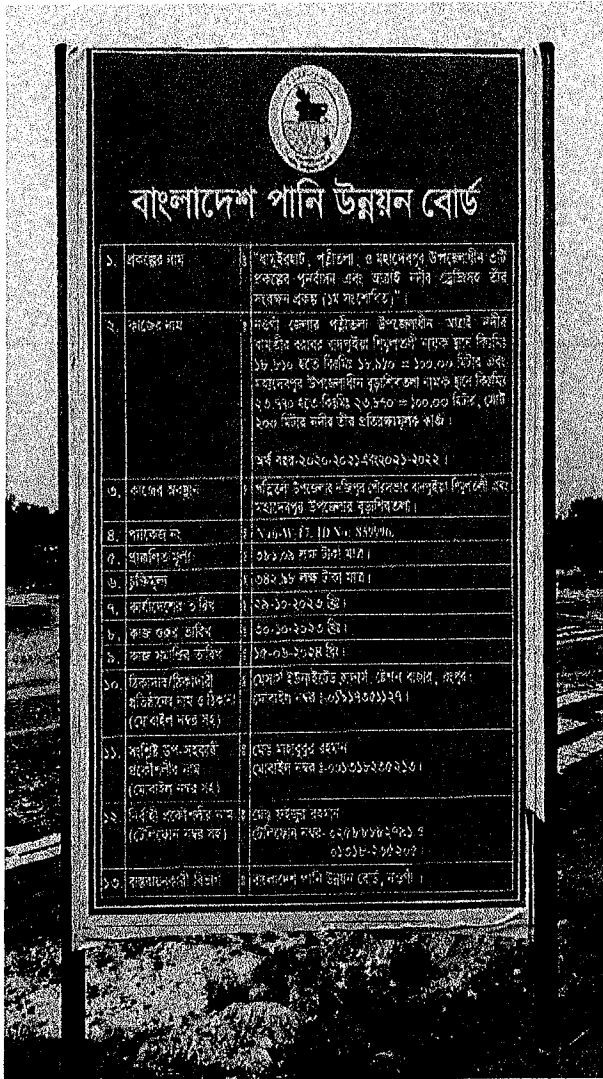

চিত্র: কাজ বাস্তবায়নকালীন সাইটে কাজের তথ্য।



চিত্র: প্রকল্পের অঙ্গ ও কাজের পরিমাণের তথ্য।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড



“নওগাঁ জেলার খামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন ও আত্রাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য বাস্তবতার নিরীখে যাচাই এর লক্ষ্যে গঠিত কারিগরী কমিটির পরিদর্শন প্রতিবেদন।

পরিদর্শনের তারিখঃ ১১-০১-২০২৪ খ্রিঃ।

“নওগাঁ জেলার খামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন ও আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ পরিদর্শন প্রতিবেদন।

১.১ ভূমিকা:

নওগাঁ পণ্ডর বিভাগ, বাপাউবো, নওগাঁর আওতায় বাস্তবায়নাধীন “নওগাঁ জেলার খামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষন” শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৬/০৭/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা শাখা-০৩, ঢাকার স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৯.১৭-৭৯, তারিখঃ ২১/০৯/২০২০ মোতাবেক প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন জারি হয়। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭৯৪৭.০৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল ১ জুলাই ২০২০ হতে জুন/২০২২। পরবর্তীতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা শাখা-০৩, ঢাকার স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৯.১৭-১৭, তারিখঃ ২০/০৭/২০২২ মোতাবেক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুন/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। অতঃপর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৯.১৭-৪৮০, তারিখঃ ১৫/০৬/২৩ মোতাবেক প্রকল্পের বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজে রয়্যালটি ও ক্যারিড আর্থের সংস্থানসহ ডিপিপিতে মোট ১১৪৫ মিটার নতুন নদী তীর সংরক্ষন মূলক কাজ অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি’র ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয়। এতে প্রকল্পটির সংশোধিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় দাড়ায় ১৭৬৩৬.৪১ লক্ষ টাকা। কিন্তু, জুন ২০২৩ এর মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২৪ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের জন্য প্রস্তাবনা দাখিল করা হয়, যা পরিকল্পনা কমিশনের স্মারক নং-২০.৩৫৮.০১৪.০১.১৭.২০১৮/৩৬, তারিখঃ ২৬/০৭/২৩ মোতাবেক অনুমোদিত হয় (কপি সংযুক্ত)।

প্রকল্পটির আওতায় ডিপিপি অনুযায়ী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ ৫.১৪৫ কিঃমিঃ, বীধ পুনরাকৃতিকরণ ২৫.০০ কিঃমিঃ, রেগুলেটর মেরামত ৫টি, খাল পুনঃখনন ৬.০০ কিঃমিঃ এবং নদী ড্রেজিং কাজ ২৭.০০ কিঃমিঃ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটির ১৯টি প্যাকেজের মধ্যে ১১টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৮টি প্যাকেজের (৪টি নদী তীর সংরক্ষণ এবং ৪টি বীধ পুনরাকৃতিকরণ) কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতির তথ্য নিচে দেওয়া হলো।

ক্র: নং	ভৌত অংশ	পরিমাণ (দৈর্ঘ্য/সংখ্যা)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	নদীতীর প্রতিরক্ষা	৫.১৪৫ কিঃমিঃ	৭৯.১৪ %	৪টি প্যাকেজের কাজ চলমান। এ অর্থবছরেই সমাপ্ত হবে।
২	বীধ পুনরাকৃতিকরণ	২৫.০০ কিঃমিঃ	৪৪.৯৬ %	এ কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমাপ্ত করা হবে।
৩	খাল পুনঃখনন	৬.০০ কিঃমিঃ	৯০.৬৭ %	সমাপ্ত।
৪	রেগুলেটর মেরামত	৫.০০ টি	১০০.০০ %	সমাপ্ত।
৫	নদী ড্রেজিং	২৭.০০ কিঃমিঃ	৭১.৩৬ %	জেলা পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ পর্যায় সমাপ্ত করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৭৭.০০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ১১৮৮০.৮৮ লক্ষ টাকা।

১.২ প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা:

বীধ পুনরাকৃতিকরণ ৪টি প্যাকেজের কাজে বীধের উপর এলজিইডির কার্পেটিং রাস্তা এবং গাছ থাকায় শতভাগ কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। কাজটি বাস্তবায়নের জন্য ঠিকাদার কর্তৃক কাজটি শুরু করা হলে মাননীয় সংসদ সদস্য ৪৭, নওগাঁ-২ মহোদয় বীধের উপর বিদ্যমান বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা অপসারণ করে বীধ পুনঃরাকৃতিকরণ কাজটি বাস্তবায়ন না করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় বরাবর ডিও লেটার প্রদান করেন (সংযুক্তি-১)। তাছাড়া, ডিজাইন মোতাবেক কাজ বাস্তবায়নে কৃষকগণের ফসলী জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হচ্ছে, ফলে কাজ বাস্তবায়নে কৃষকরা বীধী সৃষ্টি করছে। এসব কারণে বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজের প্যাকেজ নং-Nao-W-7 এর সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য (৪.০ কিলোমিটার), প্যাকেজ নং-Nao-W-8 এর প্রায় ২.০ কিলোমিটার এবং প্যাকেজ নং-Nao-W-10 এর ১.০ কিলোমিটার বীধ রিসেকশনিং করা সম্ভব হচ্ছে না। এসব প্যাকেজের অবশিষ্ট অংশে বীধ ডিজাইন মোতাবেক রিসেকশনিং করা সম্ভব হচ্ছে না।

MR SKA OK only

১.৩ কমিটি গঠন:

বোর্ডের স্মারক নং-৪২.০১.০০০০.০৩২.০৬.০০১.২৩-২০৭, তারিখ: ১৩/১২/২৩ খ্রি: মোতাবেক “নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন ও আত্রাই নদীর ড্রেজিং সহ তীর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে আইএমইডি’র প্রতিনিধির সুপারিশের আলোকে কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার বাস্তবতার নিরীখে যাচাইয়ের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ বাপাউবো’র কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির চিত্র নিচে প্রদান করা হল।

ক্র: নং	কর্মকর্তাগণের নাম ও পদবী	কমিটিতে অবস্থান
১	জনাব নাসিমা জাহান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিজাইন সার্কেল-৭, বাপাউবো, ঢাকা।	আহ্বায়ক
২	জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রহিম রিপন, উপ-সচিব, পরিকল্পনা-৩ শাখা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, সচিবালয়, ঢাকা।	সদস্য
৩	জনাব মোঃ সাখাওয়াত হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, জয়পুরহাট পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, জয়পুরহাট।	সদস্য
৪	জনাব মোহাম্মদ আলী রুবেল, গবেষণা কর্মকর্তা (পরিবেশ ও বন), পরিকল্পনা পরিদপ্তর-১, বাপাউবো, ঢাকা।	সদস্য
৫	জনাব মো: ফাইজুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, নওগাঁ পওর বিভাগ, বাপাউবো, নওগাঁ।	সদস্য-সচিব

১.৩ কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) কমিটির সদস্যগণ প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন। স্থানীয় জনগণ এবং জনপ্রতিনিধির সাথে আলোচনাপূর্বক বাস্তবতার নিরীখে প্রস্তাবিত কার্যক্রমের যথার্থতা নিরূপণ করবেন।

(খ) বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বীধের উপর নির্মিত বিটুমিনাস কার্পেটিং রোড এবং বীধের কিছু অংশে গাছ অপসারণ করে বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে আইএমইডি’র প্রতিনিধির সুপারিশের আলোকে কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, তা যাচাইয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ/মতামত প্রদান করবেন।

(গ) বিবিধ।

২.১ কমিটির সাইট পরিদর্শন:

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ বাপাউবো’র কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি “নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিং সহ তীর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা, বাস্তবতার নিরীখে যাচাইয়ের লক্ষ্যে ১১/০১/২০২৪ তারিখে সকাল ১১:৩০ হতে দুপুর ০১:৩০ টা পর্যন্ত নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট ও মহাদেবপুর উপজেলায় বীধের সাইট পরিদর্শন করেন। এ সময় কমিটির সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া, এলাকার জনপ্রতিনিধি, গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

২.১.১ প্যাকেজ নং- Nao-W-7:

পরিদর্শন স্থানের নাম- পূর্বনন্দনপুর, ধামুইরহাট।

আত্রাই নদীর বামতীরে নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার অন্তর্গত ছিলিমপুর ছালিগ্রাম উপ-প্রকল্পের আওতায় কিঃমিঃ ০.০০০ হতে কিঃমিঃ ৪.০০০ = ৪.০০০ কিঃমিঃ বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ এ প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত। প্যাকেজটির চেইনেজ কিঃমিঃ ০.০০০ জগন্নাথপুর নামক স্থানে শুরু হয়ে কিঃমিঃ ৪.০০০ পূর্বনন্দনপুর নামক স্থানে শেষ হয়েছে। পরিদর্শন কালে প্যাকেজটির নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অবলোকন করা হয়ঃ

- Nao-W-7 প্যাকেজের ৪কিলোমিটার বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজের মধ্যে ৩.৭০৬ কিলোমিটার এলজিইডি’র বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা এবং ০.২৯৪ কিলোমিটার কীচা রাস্তা।
- প্যাকেজটির অধিকাংশ জায়গাতেই ভূমি অধিগ্রহণ না থাকার কারণে ডিজাইন অনুযায়ী বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়ন করতে গেলে বীধের টো-লাইন ব্যক্তি মালিকানাধীন ফসলি জমিতে চলে যাচ্ছে। ভূমি অধিগ্রহণ না থাকার কারণে ব্যক্তি মালিকানাধীন ফসলি জমিতে কাজটি বাস্তবায়ন করতে গেলে বীধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।
- পরিদর্শনকালে স্থানীয় জন সাধারণের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীধের বর্তমান বিদ্যমান উচ্চতায় নদীর পানি বন্যা কালীন সময়ে বীধ উপচিয়ে প্রকল্পের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না। এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তাটি স্থানীয় জনসাধারণের চলাচল ও মালামাল পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

NR skt OK ০৫/০১/২৪

- কাজটি বাস্তবায়নের জন্য ঠিকাদার কর্তৃক কাজটি শুরু করা হলে মাননীয় সংসদ সদস্য ৪৭, নওগাঁ-২ মহোদয় বীধের উপর বিদ্যমান বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা অপসারণ করে বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজটি বাস্তবায়ন না করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় বরাবর ডিও লেটার প্রদান করেন (সংযুক্তি-১)।

কমিটির সাইট পরিদর্শনের স্থিরচিত্র (প্যাকেজ নং-Nao-W-7):




চিত্র-১: বীধের উপর বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা।



চিত্র-১: বীধের উপর বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা।



চিত্র-৩: কমিটিকে স্থানীয় জনগণ সর্বোচ্চ পানি সমতল দেখিয়ে দিচ্ছে।

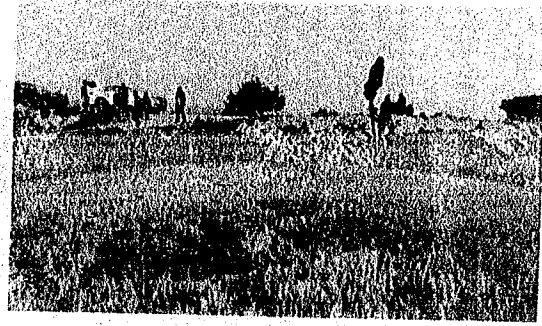

চিত্র-৪: বীধ সেতামতের জন্য জমি অধিগ্রহণ নেই।

২.১.২ প্যাকেজ নং-Nao-W-8:

পরিদর্শন স্থানের নাম-শিমুলতলী, ধামুইরহাট।

আত্রাই নদীর ডান তীরে নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার অন্তর্গত আত্রাই নদীর ডান তীর বীধ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় কিঃমিঃ ০.০০ হতে কিঃমিঃ ৫.০০ = ৫.০০০ কিঃমিঃ বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজটি প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত। প্যাকেজটির চেইনেজ কিঃমিঃ ০.০০০ শিমুলতলী নামক স্থানে শুরু হয়ে কিঃমিঃ ৫.০০০ পূর্বনন্দনপুর নামকস্থানে শেষ হয়েছে। পরিদর্শনকালে প্যাকেজটির নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অবলোকন করা হয়ঃ

- Nao-W-8 প্যাকেজের ৫.০০০ কিঃমিঃ বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজের মধ্যে ২.৯৬৬ কিঃমিঃ এলজিইডি কর্তৃক বিটুমিনাস কার্পেটিং (চেইনেজ কিঃমিঃ ০.০০০ হতে কিঃমিঃ ১.৮০৫ = ১.৮০৫ কিঃমিঃ এবং কিঃমিঃ ২.০১৭ হতে কিঃমিঃ ৩.৫৭৮ = ১.৫৬১ কিঃমিঃ) রাস্তা রয়েছে এবং ২.০৩৪ কিঃমিঃ বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা ছাড়া বাকী রয়েছে (চেইনেজ কিঃমিঃ ১.৮০৫ হতে কিঃমিঃ ২.০১৭ = ০.৬১২ কিঃমিঃ এবং কিঃমিঃ ৩.৫৭৮ হতে কিঃমিঃ ৫.০০০ = ১.৪২২ কিঃমিঃ)।
- প্যাকেজটির ৫.০০ কিঃমিঃ জুড়েই বীধের উভয় পাশে ঘন গাছ বিদ্যমান আছে। উক্ত গাছগুলোর মালিকানা নিয়ে বন বিভাগ, বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও ধামুইরহাট কল্যাণ ট্রাস্ট এর মধ্যে বিরোধ রয়েছে। বীধের উপর হতে গাছ অপসারণ ডকরার জন্য জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রাক্কলন প্রস্তুতের জন্য কমিটি কর্তৃক গাছ মার্কিং সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে, গাছ অপসারণ না করার জন্য সামাজিক বনায়নের সদস্য কর্তৃক পানি উন্নয়ন বোর্ডকে বিবাদী করে মামলা দায়ের করা হয়েছে। একই সাথে ধামুইরহাট কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক বন বিভাগের উপর মামলা চলমান রয়েছে। ডিজাইন অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করতে গেলে বীধের উভয় পাশে গাছ অপসারণ করা আবশ্যিক।
- প্যাকেজটির বাকী ও কার্পেটিং অংশে আংশিক কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নওগাঁ-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয় কাজ বাস্তবায়ন না করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় বরাবর ডিও লেটার (সংযুক্তি-১) প্রদান করেছেন।

MR SKH [Signature] ৪৫-

কমিটির সাইট পরিদর্শনের স্থিরচিত্র (প্যাকেজ নং-Nao-W-8):



চিত্র-১: ক্যারিড আর্থ দিয়ে রাস্তার উভয় পাশে বীধ সেরামতের প্রচেষ্টা।



চিত্র-২: ক্যারিড আর্থ দিয়ে বীধ সেরামতের চেষ্টা চালানো হচ্ছে।



চিত্র-৩: বীধের উভয়পাশে গাছ ও পাকা রাস্তা।



চিত্র-৪: বীধের উভয়পাশে গাছ ও পাকা রাস্তা।

২.১.৩ প্যাকেজ নং-Nao-W-9:

নওগাঁ জেলার পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলার অন্তর্গত পল্লীতলা উপ-প্রকল্পের আওতায় আত্মাই নদীর বামতীরে কিঃমিঃ ৫.০০০ হতে কিঃমিঃ ২৩.০০ এর মধ্যবর্তী স্থানে = ৯.০ কিঃমিঃ বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজটি এ প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত। প্যাকেজটির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যেই কাজ চলমান রয়েছে। পরিদর্শনকালে প্যাকেজটির নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অবলোকন করা হয়ঃ


- Nao-W-9 প্যাকেজের ৯.০ কিঃমিঃ বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজের দৈর্ঘ্যে ০৪ টি অংশ রয়েছে। তন্মধ্যে পল্লীতলা উপজেলায় চেইনেজ কিঃমিঃ ৬.৯০০ হতে কিঃমিঃ ৮.১০০ পর্যন্ত ১২০০ মিটার ও চেইনেজ কিঃমিঃ ৯.৩০০ হতে কিঃমিঃ ১০.৮০০ পর্যন্ত ১৫০০ মিটার এবং মহাদেবপুর উপজেলায় চেইনেজ কিঃমিঃ ১৪.০০০ হতে কিঃমিঃ ১৮.৮৭০ পর্যন্ত ৪৭০০ মিটার ও চেইনেজ কিঃমিঃ ২১.৫৭০ হতে কিঃমিঃ ২৩.০০০ পর্যন্ত ১৪৩০ মিটার রয়েছে।
- প্যাকেজটির ৯.০০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে কোন অংশে ভূমি অধিগ্রহণ না থাকার কারণে ডিজাইন সেকশন অনুযায়ী উচ্চতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হলেও স্লোপ করা সম্ভব হচ্ছে না। পল্লীতলা উপজেলার পলিগাড়া নামক স্থানে কিঃমিঃ ৯.৩০০ হতে ৯.৭০০ পর্যন্ত ৪০০ মিটার অংশে মন্দির ও বসতবাড়ি থাকায় ডিজাইন সেকশন অনুযায়ী Top Width & Height বাড়ানো হচ্ছে না। মহাদেবপুর উপজেলার কলোনিগাড়া নামকস্থানে কিঃমিঃ ২২.৩০০ হতে কিঃমিঃ ২৩.০০০ পর্যন্ত ৭০০ মিটার অংশে দেশকুলের দিকে বসতবাড়ি ও নদীকুলের দিকে নদী বীধের খুব সরিকটে হওয়ায় ডিজাইন সেকশন অনুযায়ী উক্ত অংশে Top Width & Height বাড়ানো হচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে প্যাকেজটির কিঃমিঃ ৫.০০০ হতে কিঃমিঃ ২৩.০০০ এর মধ্যবর্তী স্থানে = ৯.০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ডিজাইন সেকশন অনুযায়ী স্লোপের দৈর্ঘ্য বাস্তবায়ন ব্যতিত বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ করা হচ্ছে।

২.১.৪ প্যাকেজ নং-Nao-W-10:

নওগাঁ জেলার পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলার অন্তর্গত আত্মাই নদীর ডানতীর বীধ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় কিঃমিঃ ২৫.০০ হতে কিঃমিঃ ৩২.০০ = ৭.০ কিঃমিঃ বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজটি এ প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত। প্যাকেজটির চেইনেজ কিঃমিঃ ২৫.০০০ হতে কিঃমিঃ ২৮.৫৭৫ = ৩.৫৭৫ কিলোমিটার অংশে কাজ চলমান রয়েছে। পরিদর্শনকালে প্যাকেজটির নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অবলোকন করা হয়ঃ

Handwritten signature and initials.

- Nao-W-১০ প্যাকেজের ৭.০ কিঃমিঃ কিঃমিঃ বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজের মধ্যে চেইনেজ কিঃমিঃ ২৫.০০ হতে কিঃমিঃ ২৫.২৯০ পর্যন্ত ২৯০ মিটার কৌচা রাস্তা, কিঃমিঃ ২৫.২৯০ হতে কিঃমিঃ ২৫.৪৬৫ পর্যন্ত ১৭৫ মিটার এলজিইডি'র বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা, কিঃমিঃ ২৫.৪৬৫ হতে কিঃমিঃ ২৮.৫৭৫ পর্যন্ত ৩.১১০ কিলোমিটার কৌচা রাস্তা, কিঃমিঃ ২৮.৫৭৫ হতে কিঃমিঃ ৩১.১০০ পর্যন্ত ২৫২৫ মিটার এলজিইডি'র বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা, কিঃমিঃ ৩১.১০০ হতে কিঃমিঃ ৩১.৪২৫ পর্যন্ত ৩২৫ মিটার কৌচা রাস্তা এবং কিঃমিঃ ৩১.৪২৫ হতে কিঃমিঃ ৩২.০০ পর্যন্ত ৫৭৫ মিটার এলজিইডি'র বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা রয়েছে।
- প্যাকেজটিতে ৭.০ কিঃমিঃ বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজের মধ্যে ৩৭২৫ মিটার কৌচা এবং ৩২৭৫ মিটার এলজিইডি'র বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা রয়েছে। এছাড়া, প্যাকেজটির বেশির ভাগ অংশেই জমি অধিগ্রহণ নেই। ডিজাইন অনুযায়ী এলজিইডি'র বিটুমিনাস কার্পেটিং অংশে ডুমার্ক ইমব্যাংকমেন্ট রয়েছে এবং অনেক জায়গায় বীধের দুপাশে বাড়ি-ঘর রয়েছে। ফলে ৩.৭২৫ কিলোমিটার অংশে বীধের Top Width & Height বাড়ানো গেলেও অবশিষ্ট ৩.২৭৫ কিলোমিটার অংশে ডুমার্ক ইমব্যাংকমেন্ট করা হচ্ছে না। প্যাকেজটির ভূমি অধিগ্রহণ না থাকার কারণে ডিজাইন সেকশন অনুযায়ী স্লোপের দৈর্ঘ্য বাস্তবায়ন করাও হচ্ছে না।

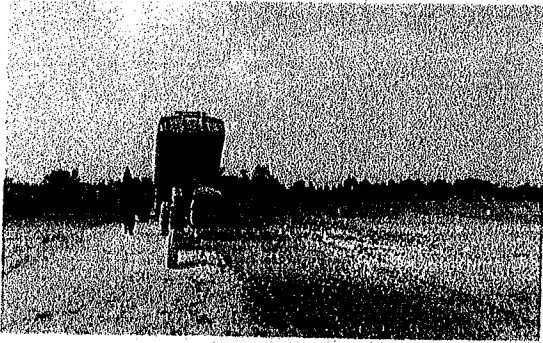

চিত্র-১: ক্যারিড আর্থ দিয়ে চলমান বীধ মেরামত কাজ।



চিত্র-২: ক্যারিড আর্থ দিয়ে চলমান বীধ মেরামত কাজ।

৩.০: পর্যবেক্ষন:

বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীধের উপর এলজিইডি'র বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা থাকায় বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজে বীধের উপর এলজিইডি'র বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তার কাজ করার পূর্বে মাঠ পর্যায়ে ছাড়পত্র (NOC) গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থাকা প্রয়োজন। বন বিভাগ কর্তৃক পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীধের স্লোডার ও স্লোপে সামাজিক বনায়নের আওতায় বৃক্ষরোপণ করায় ডিজাইন মোতাবেক বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। বন বিভাগ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর না করেই বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীধের ঢাল ও স্লোডারে উপর বৃক্ষ রোপন করেছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধিগ্রহণকৃত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীধের জমিতে বৃক্ষরোপণের পূর্বে বন বিভাগ ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর করা থাকলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বীধের উপর হতে গাছ অপসারণের জটিলতা পরিহার করা যেত।


৪.০ কমিটির সুপারিশ:

- (ক) Nao-W-৭ প্যাকেজের ৪কিলোমিটার বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজের মধ্যে ৩.৭০৬ কিলোমিটার এলজিইডি'র বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা এবং ০.২৯৪ কিলোমিটার কৌচা রাস্তা রয়েছে। বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা থাকায় এবং নতুন অনুযায়ী পূর্ণ ডিজাইনে বাধ নির্মাণ করার প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ না থাকায় এ প্যাকেজের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যে কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় বিধায়, এ প্যাকেজের কাজ রহিত করে সে মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- (খ) Nao-W-৮ প্যাকেজের ৫.০কিলোমিটার বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজের ২.৯৬৬ কিঃমিঃ অংশে (চেইনেজ কিঃমিঃ ০.০০০ হতে কিঃমিঃ ১.৪০৫ = ১.৪০৫ কিঃমিঃ এবং কিঃমিঃ ২.১০৭ হতে কিঃমিঃ ৩.৫৭৮ = ১.৫৬১ কিঃমিঃ) এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা থাকায় এই অংশে মাটির কাজ করা সম্ভব হবে না। এছাড়া, পুনরাকৃতিকরণ কাজের অবশিষ্ট ২.০৩৪ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য ব্যাপী বীধের দুই দিকের ঢালে বৃক্ষ থাকায় এই অংশে গাছের মাঝে ক্যারিড আর্থ দিয়ে মাটির কাজ বাস্তবায়ন করে এ প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত করা যেতে পারে।


APR 8/11


- (গ) Nao-W-৯ প্যাকেজের সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যে (৯.০ কিলোমিটার) বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়ন করে এ প্যাকেজের কাজ কাজ সমাপ্ত করা যেতে পারে।
- (ঘ) Nao-W-১০ প্যাকেজের ৭.০ কিলোমিটার এর মধ্যে ৮৭০.০ মিটার (চেইনেজ কিঃমিঃ ৩০.৩৩০ হতে কিঃমিঃ ৩১.১০০ = ৭৭০.০০ মিটার এবং কিঃমিঃ ৩১.৪২৫ হতে কিঃমিঃ ৩১.৫২৫ = ১০০ মিটার) অংশে এলজিইডি'র বিটুমিনাস কার্পেটিং রাস্তা থাকায় বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ করা সম্ভব নয়। অবশিষ্টাংশে বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়ন করে এ প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বীচা রাস্তা ও পাকা রাস্তার অ্যাপ্রোচ এমন ভাবে করতে হবে যাতে যানবাহন চলাচলে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়।
- (ঙ) ডবিষ্যতে জটিলতা পরিহারের লক্ষ্যে বাপাউবো'র বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীধের উপর এলজিইডি/সড়ক ও জনপথ রাস্তার নির্মাণ করার পূর্বে আবশ্যিকভাবে পানি উন্নয়ন বোর্ড এর নিকট হতে ছাড়পত্র (NOC) গ্রহণ এবং বন বিভাগ কর্তৃক পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধিগ্রহণকৃত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীধের জমিতে বৃক্ষরোপণের পূর্বে বন বিভাগ ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষর করা যেতে পারে।


০৭.০২.২৪
(মোহাম্মদ আলী নুবেল)
গবেষণা কর্মকর্তা (পরিবেশ ও বন)
পরিকল্পনা পরিদপ্তর-১
বাপাউবো, ঢাকা
ও সদস্য।



০৭.০২.২৪
(মোঃ সাখাওয়াত হোসেন)
নির্বাহী প্রকৌশলী
জয়পুরহাট পানি উন্নয়ন বিভাগ
বাপাউবো, জয়পুরহাট
ও সদস্য।


০৭.০২.২৪
(মোঃ ফাইজুর রহমান)
নির্বাহী প্রকৌশলী
নওগাঁ পওর বিভাগ
বাপাউবো, নওগাঁ।
ও সদস্য-সচিব।


০৮.০২.২০২৪
(মোহাম্মদ আব্দুর রহিম রিপন)
উপ-সচিব
পরিকল্পনা-৩ শাখা
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
সচিবালয়, ঢাকা
ও সদস্য।



০৮/০২/২০২৪
(নাসিমা জাহান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
ডিজাইন সার্কেল-৭
বাপাউবো, ঢাকা
ও আফায়ক।

Re-sectioning of embankment from km 0.00 to km. 4.000 = 4000.00 m. along the Left bank of Atrai river under Chilimpur-Saligram Project in Union- Alompur, in Upazila-Dhamoirhat, District Naogaon in c/w Rehabilitation of 3 nos Project in Upazila: Dhamoirhat, Panitola & Mohadevpur District: Naogaon and Bank Protection Project Including Dredging of Atrai River under Naogaon O & M Division BWDB, Naogaon During the FY-2020-21. (Package No: Nao-W-7)

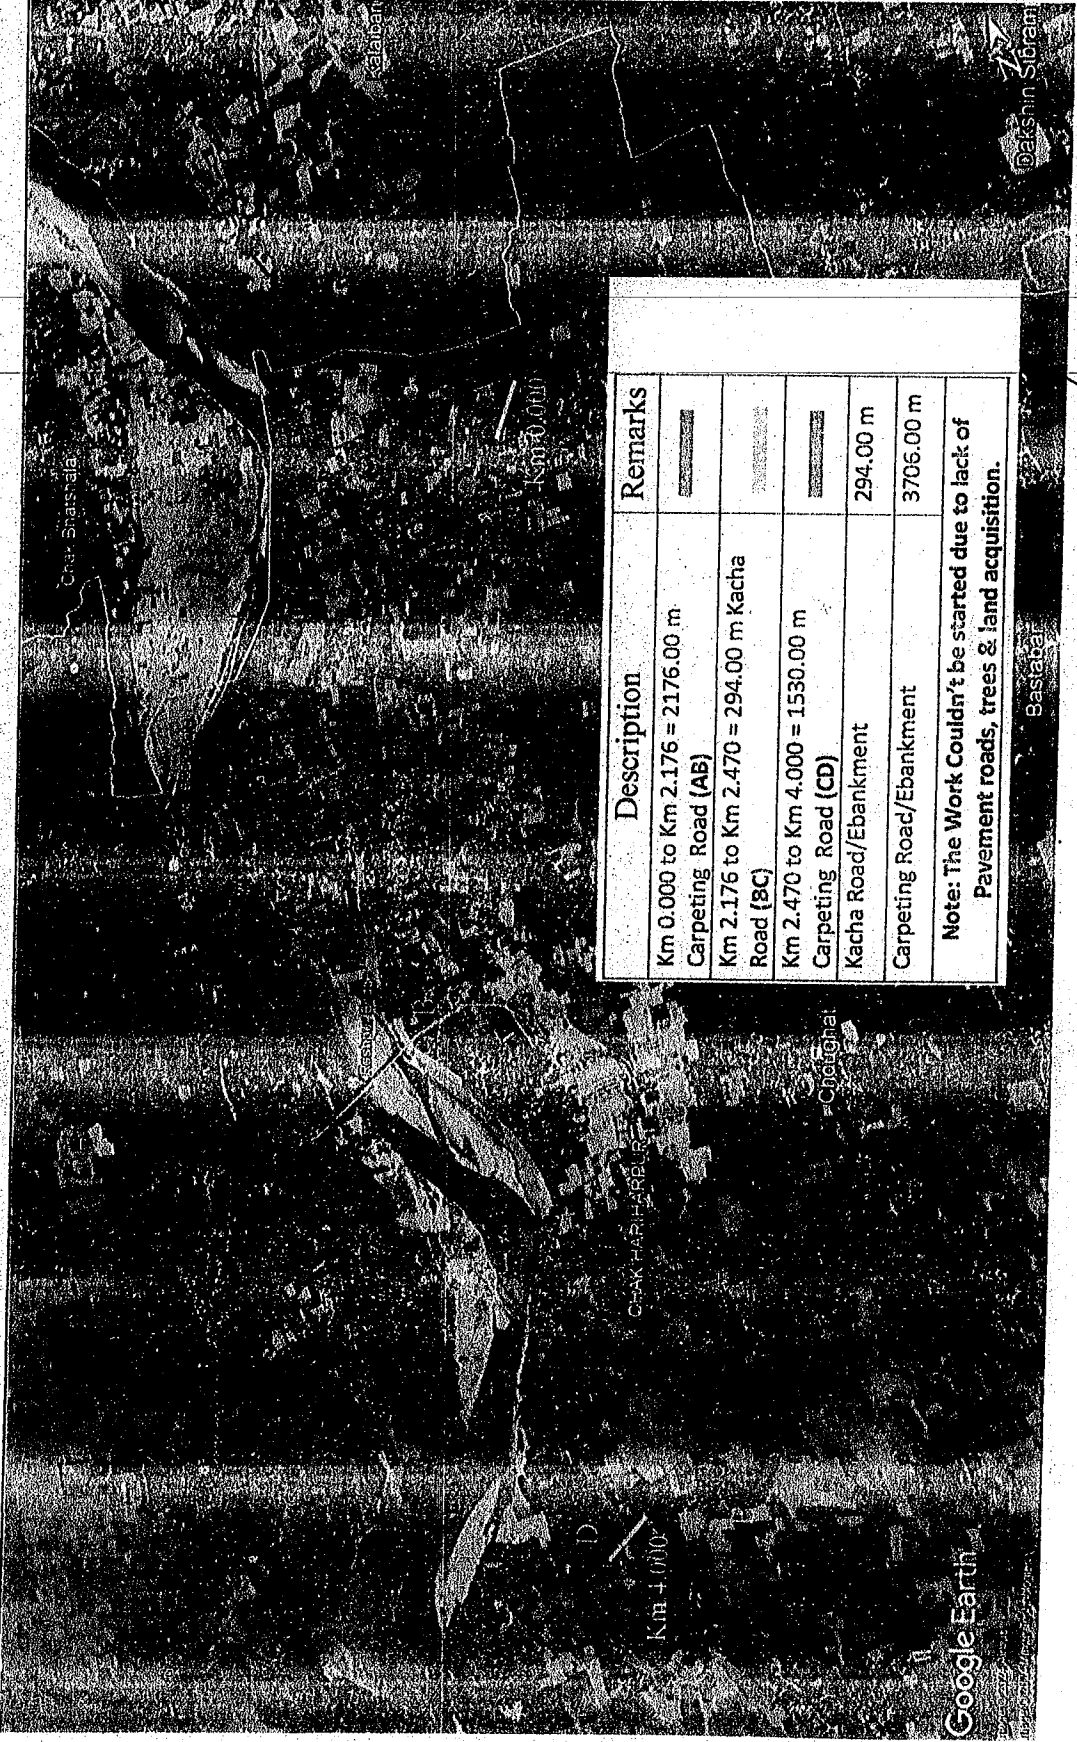


Description	Remarks
Km 0.000 to Km 2.176 = 2176.00 m Carpeting Road (AB)	=====
Km 2.176 to Km 2.470 = 294.00 m Kacha Road (BC)	=====
Km 2.470 to Km 4.000 = 1530.00 m Carpeting Road (CD) Kacha Road/Ebankment	=====
Carpeting Road/Ebankment	294.00 m
	3706.00 m
Note: The Work Couldn't be started due to lack of Pavement roads, trees & land acquisition.	

Re-sectioning of embankment from km. 0.00 to km. 5.000 = 5000.00 m. along the Right bank of Atrai river under Construction of Right Embankment of Atrai River Project in Union-Khelna, in Upazila-Dhamoirhat, District Naogaon in c/w Rehabilitation of 3 nos Project in Upazila: Dhamoirhat, Patitala & Mohadevpur District: Naogaon and Bank Protection Project Including Dredging of Atrai River under Naogaon O & M Division BWDB, Naogaon During the FY-2020-21. (Package No: Nao-W-8)

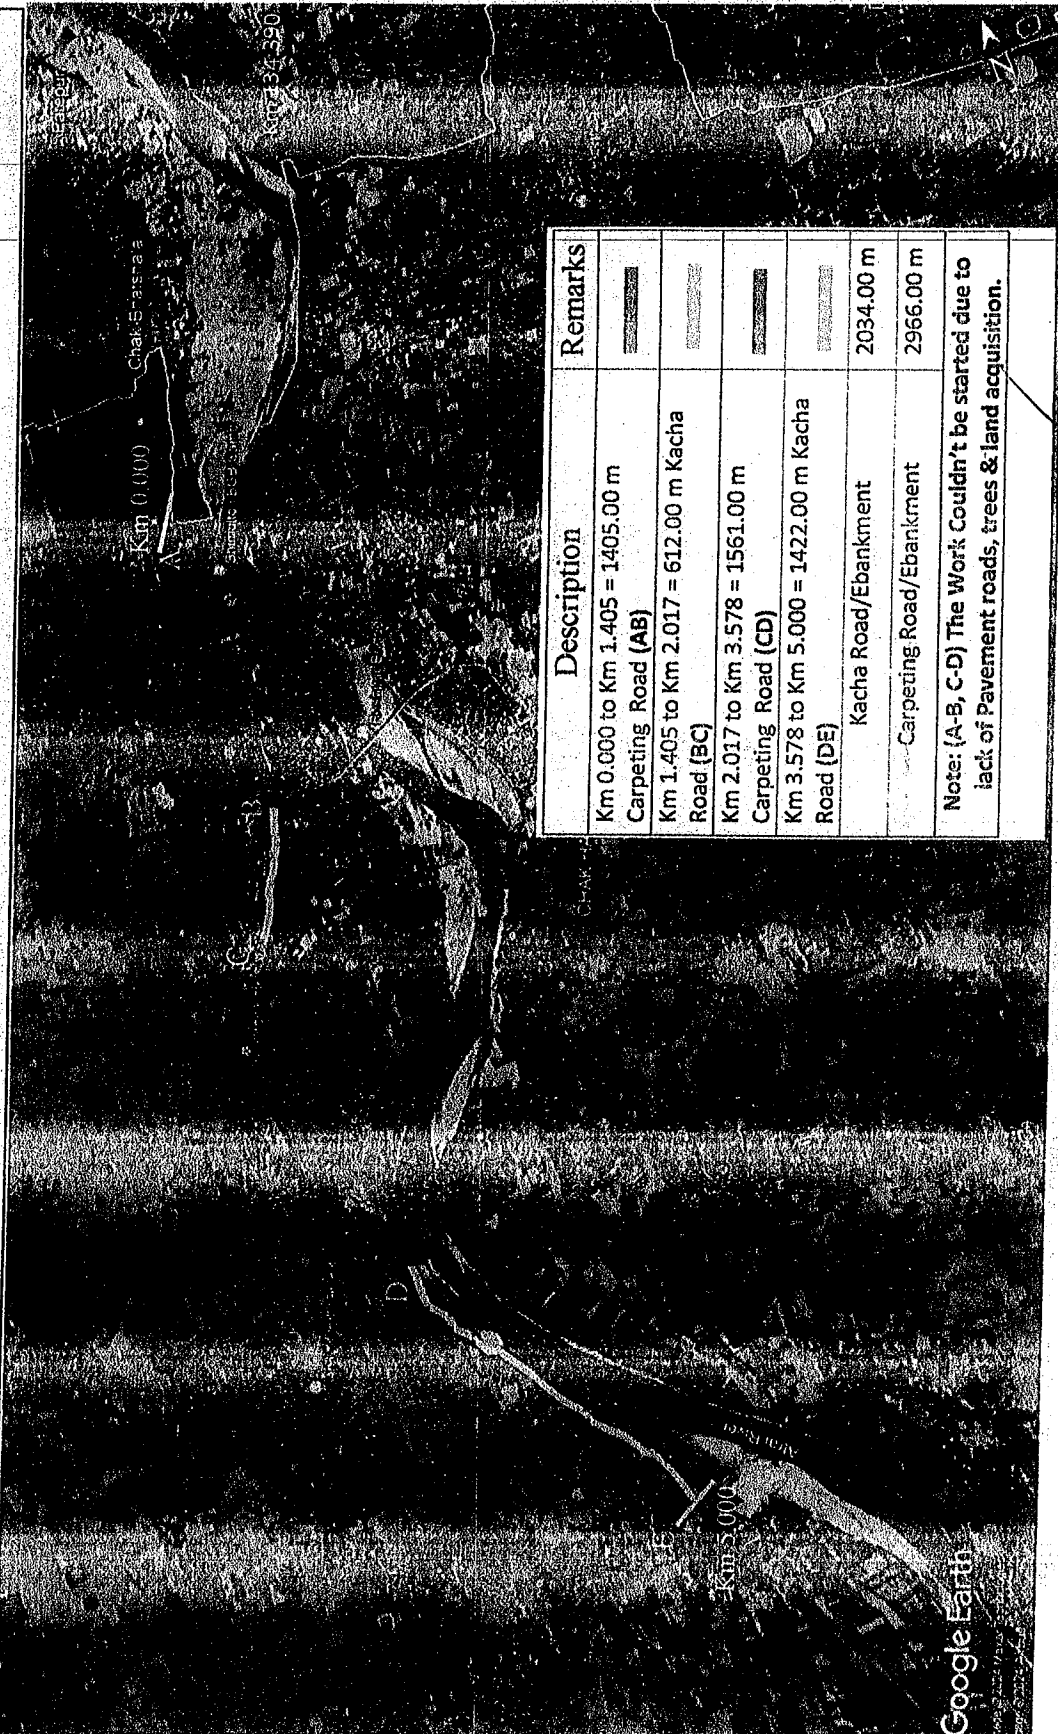


Description	Remarks
Km 0.000 to Km 1.405 = 1405.00 m Carpeting Road (AB)	■
Km 1.405 to Km 2.017 = 612.00 m Kacha Road (BC)	■
Km 2.017 to Km 3.578 = 1561.00 m Carpeting Road (CD)	■
Km 3.578 to Km 5.000 = 1422.00 m Kacha Road (DE)	■
Kacha Road/Embankment	2034.00 m
Carpeting Road/Embankment	2966.00 m
Note: (A-B, C-D) The Work Couldn't be started due to lack of Pavement roads, trees & land acquisition.	

“নত্যা জেলার খাইরহাট, পদ্মিতা ও মহাদেবপুর উপজেলায় ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আতাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ” দীর্ঘ প্রকল্পের আওতার বাস্তবায়নবীন নত্যা জেলার পদ্মিতা ও মহাদেবপুর উপজেলার অন্তর্গত পদ্মিতা উপ-প্রকল্পের আওতার বিধিঃ ৫.০০০ হতে কিঃমিঃ ২৩.০০০ এর মধ্যে স্থানে = ৯.০০০ কিঃমিঃ বীথ পুনরাকৃতির কাজ (Package No: Nao-W-9)।

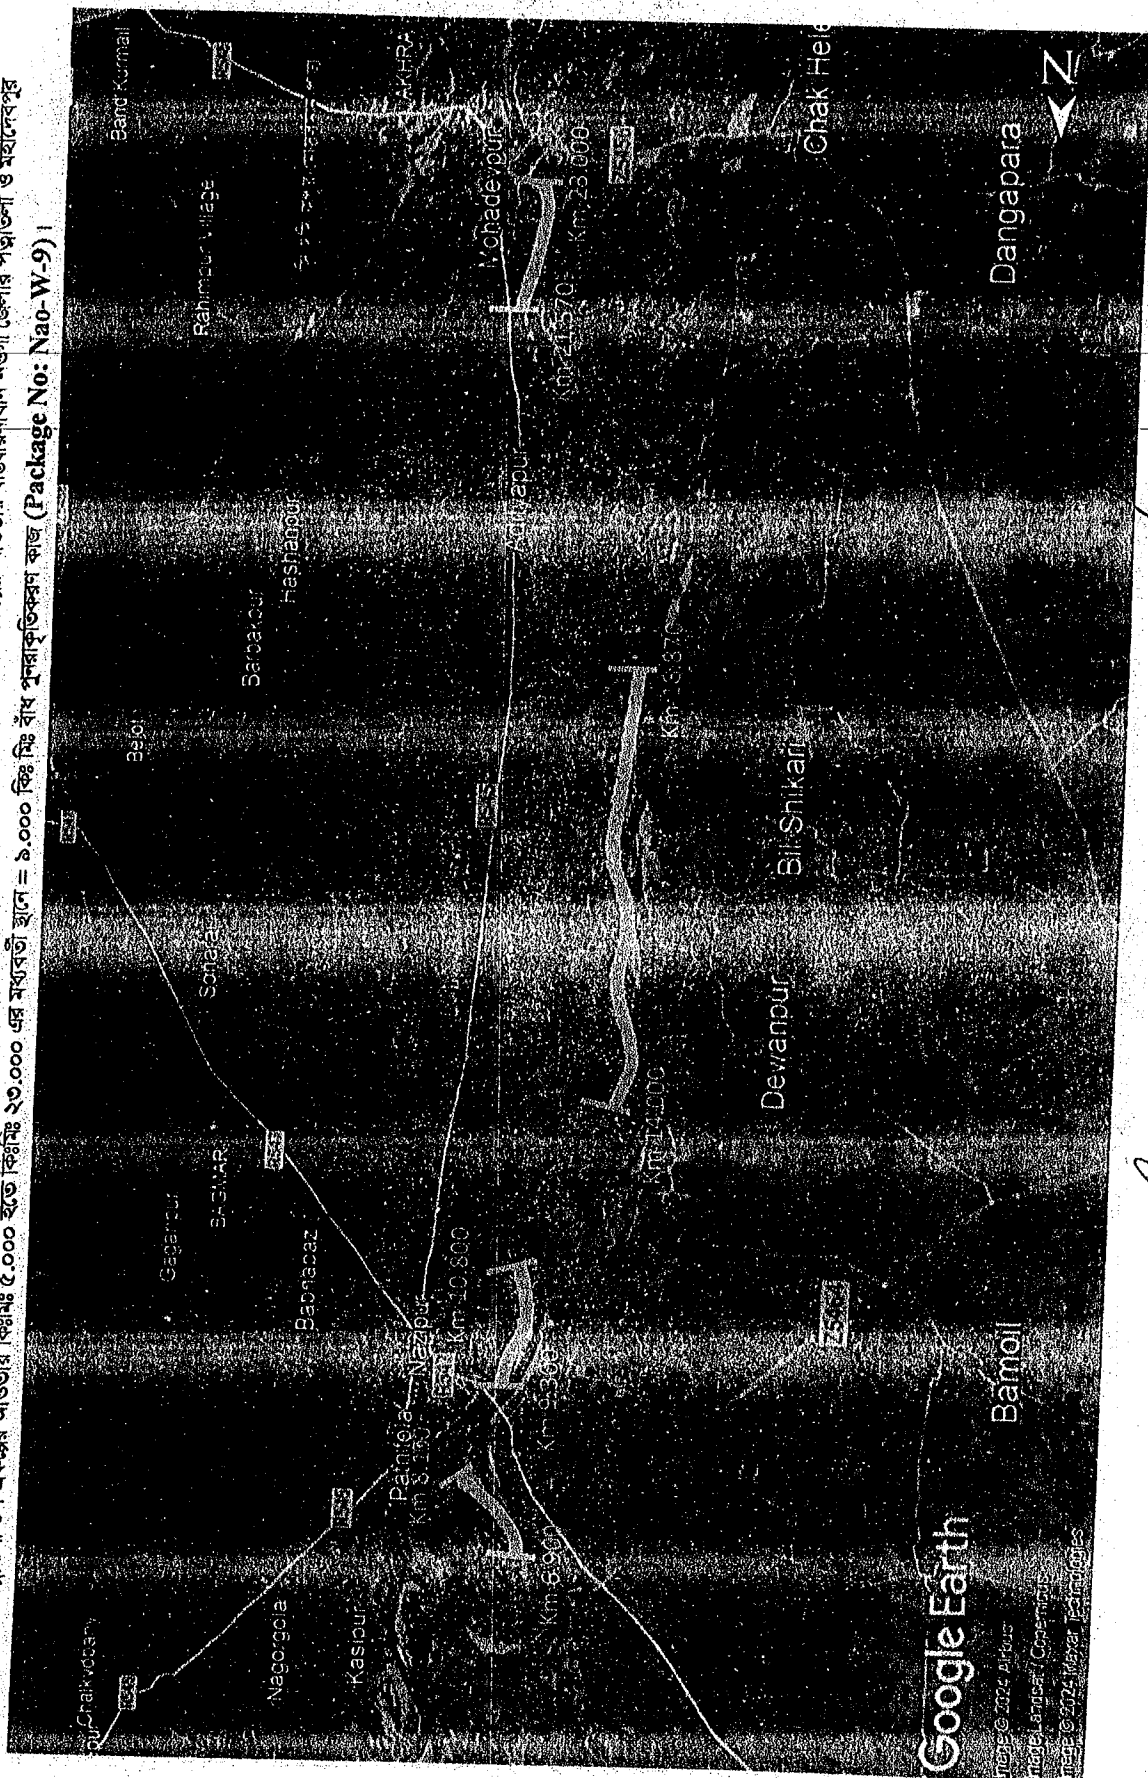

Proposed Re-sectioning of embankment from km. 0.00 to km. 5.000 = 5000.00 m. along the Right bank of Atrai river under Construction of Right Embankment of Atrai River Project in Union Khelna, in Upazila Dharmoirhat, District Naogaon in c/w Rehabilitation of 3 nos Project in Upazila: Dharmoirhat, Pamtala & Mohadevpur District: Naogaon and Bank Protection Project Including Dredging of Atrai River under Naogaon O & M Division BWDB, Naogaon During the FY-2020-21. (Package No. Nao-W-10)

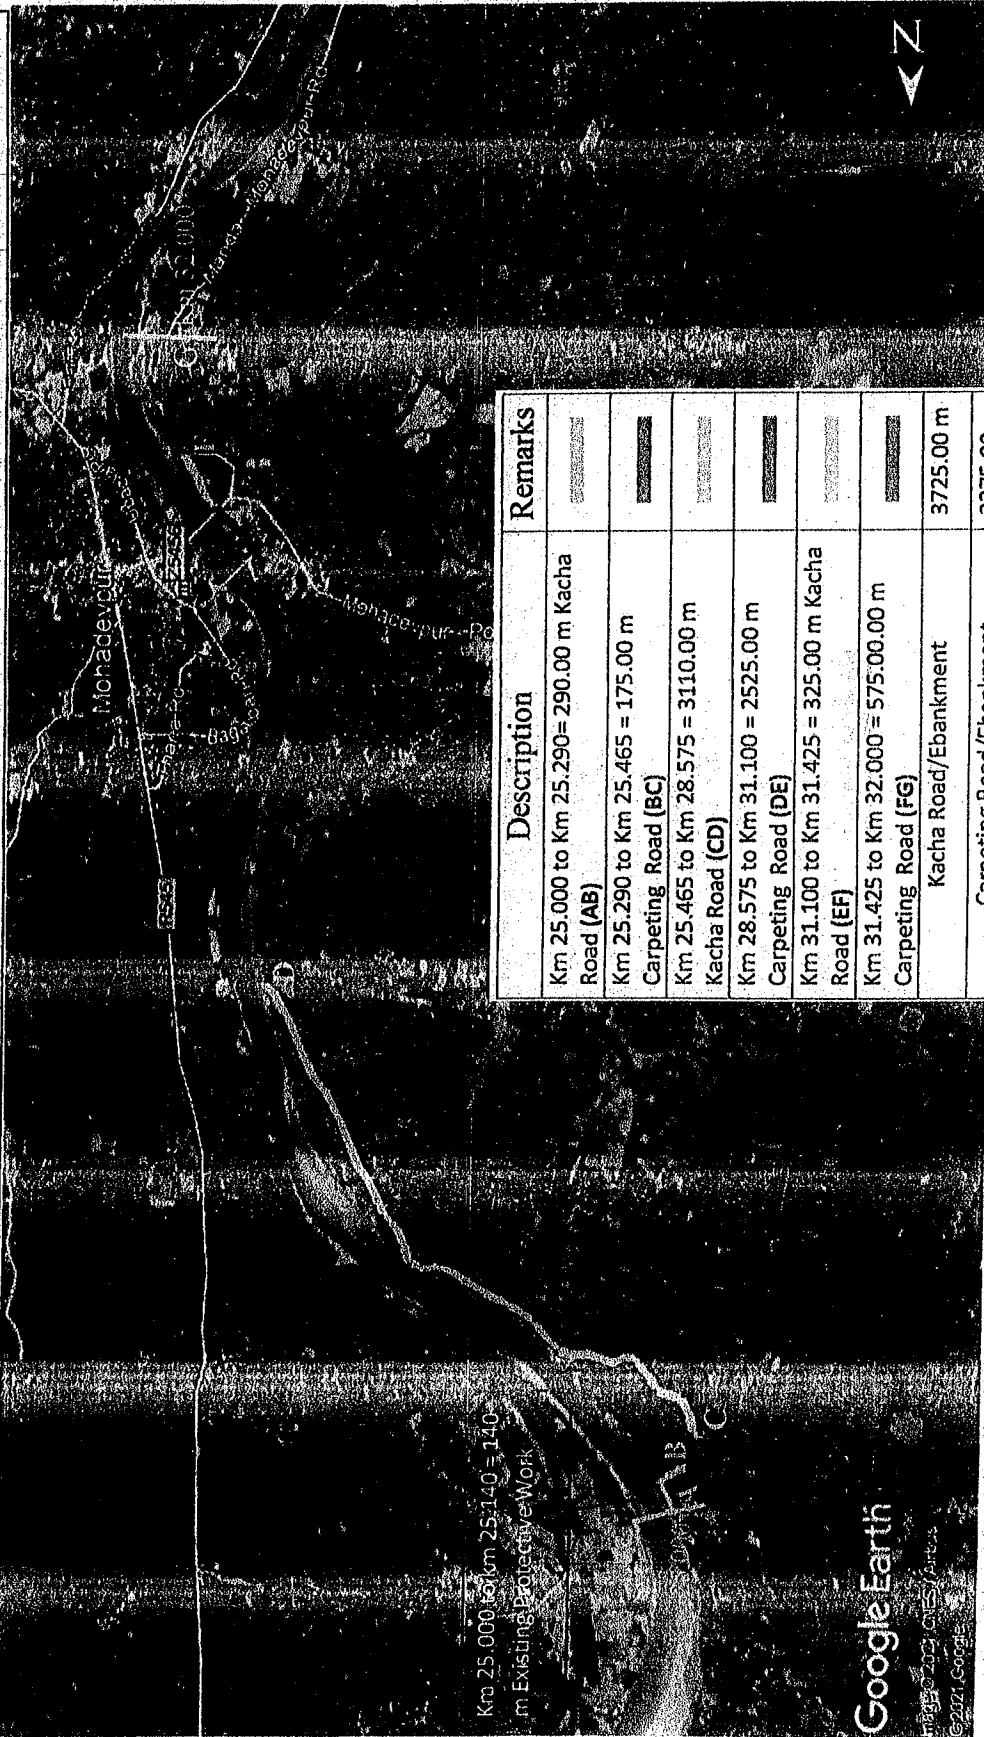

Description	Remarks
Km 25.000 to Km 25.290 = 290.00 m Kacha Road (AB)	—
Km 25.290 to Km 25.465 = 175.00 m Carpeting Road (BC)	—
Km 25.465 to Km 28.575 = 3110.00 m Kacha Road (CD)	—
Km 28.575 to Km 31.100 = 2525.00 m Carpeting Road (DE)	—
Km 31.100 to Km 31.425 = 325.00 m Kacha Road (EF)	—
Km 31.425 to Km 32.000 = 575.00.00 m Carpeting Road (FG)	—
Kacha Road/Embankment	3725.00 m
Carpeting Road/Embankment	3275.00 m

Note: (D-G) The Work Couldn't be started due to lack of Pavement roads & land acquisition.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
সেচ অনুবিভাগ

১১ শ্রাবন ১৪৩০ ব.

তারিখঃ


২৬ জুলাই ২০২৩ খি.

নং-২০.৩৫৮.০১৪.০১.০১.১৭.২০১৮/৩৬

বিষয়ঃ “নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি সংক্রান্ত।
সূত্রঃ (ক) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৯.১৭-৩৪৪, তারিখঃ ২৭-০৩-২০২৩ খি.
(খ) আইএমইডি’র স্মারক নং-২১.০০.০০০০.১২১.১৪.২৬৪.২২-১৩১, তারিখঃ ২২-০৬-২০২৩ খি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিশ্রেফিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পটির মেয়াদ জুন ২০২৩ এ সমাপ্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি অর্জিত না হওয়ায় নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পটির কার্যক্রম সচল রাখার সুবিধার্থে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আইএমইডি’র সুপারিশের পরিশ্রেফিতে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩ এর পরিবর্তে জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর নির্দেশক্রমে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলো। তবে শর্ত থাকে যে, প্রকল্পটি আবশ্যিকভাবে জুন ২০২৪-এ সমাপ্ত করতে হবে:

- (ক) প্রকল্পের আওতায় প্যাকেজ নং-Nao-W-7 ও প্যাকেজ-Nao-W-8 এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এলজিইডি কর্তৃক বাঁধের ওপর নির্মিত বিটুমিনাস কার্পেটিং রোডের অংশ অপসারণ করে বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়নের আদৌ প্রয়োজন আছে কি না তা উক্ত সংস্থা/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ একটি কারিগরি কমিটি গঠন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে;
- (খ) প্যাকেজ-Nao-W-8 সংশ্লিষ্ট বাঁধের কিছু অংশে গাছ রোপণে যা স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্রুত অপসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে;
- (গ) সকল অডিট আগতি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন; এবং
- (ঘ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয় প্রজাবিত বর্ধিত মেয়াদে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এতিপিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও যথাসময়ে অর্থছাড় এবং প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করবে।



হোসাইন হাসান হুসি
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোন- ১১৮০৭৫৯

সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

কার্যার্থে অনুলিপিঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ৭২ গ্রীণরোড, ঢাকা।

২। প্রকল্প পরিচালক, “নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্প, বাগডোবা, নওগাঁ।

-৫৮-

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
(পরিকল্পনা, নকশা ও গবেষণা) এর দপ্তর
ব্লক-এফ, লেভেল-৫, পানি ভবন,
৭২ গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫।
ফোনঃ ০২-২২২২৩০০৪০-৪২



adgpl.bwddb@gmail.com

Office of the Additional Director General
(Planning, Design & Research)
Block-F, Level-5, Pani Bhaban,
72 Green Road, Dhaka-1205
Phone: 02-222230040-42

স্মারক নং-৪২.০১.০০০০.০৩২.০৬.০০১.২৩-২০৭

তারিখ: ১৩/১২/২০২৩ খ্রিঃ

দপ্তরাদেশ

“নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ওটি প্রকল্পের পুনর্বাসন ও আতাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের বাধ পুনঃস্বাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে আইএমইডি এর প্রতিনিধির সুপারিশের আলোকে কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, তা বাস্তবতার নিরীখে যাচাইয়ের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন করে সুপারিশমালাসহ কারিগরি প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ বাপাউবো’র নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে সুনির্দিষ্ট কার্যপরিধির আওতায় একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হলো।


ক্রঃ নং	কর্মকর্তাগণের নাম ও পদবি	কমিটিতে অবস্থান
১।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিজাইন সার্কেল-৭, বাপাউবো, ঢাকা।	আইবায়ক
২।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা এর একজন উপস্থিত প্রতিনিধি।	সদস্য
৩।	নির্বাহী প্রকৌশলী, জয়পুরহাট পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, জয়পুরহাট।	সদস্য
৪।	জনাব মোহাম্মদ আলী রাবেল, গবেষণা কর্মকর্তা (পরিবেশ ও বন), পরিকল্পনা পরিদপ্তর-১, বাপাউবো, ঢাকা।	সদস্য
৫।	নির্বাহী প্রকৌশলী, নওগাঁ পওর বিভাগ, বাপাউবো, নওগাঁ।	সদস্য-সচিব

কমিটির কার্যপরিধি :

- ক) কমিটির সদস্যগণ প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন। স্থানীয় জনগণ ও জনপ্রতিনিধির সাথে আলোচনাপূর্বক বাস্তবতার নিরীখে প্রস্তাবিত কার্যক্রমের যথার্থতা নিরূপণ করবেন;
 - খ) বাস্তবায়নীয় প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাঁধের উপর নির্মিত বিটুমিনাস কার্পেটিং রোড এবং বাঁধের কিছু অংশে গাছ অপর্যাপক করে বাঁধ পুনঃস্বাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে আইএমইডি এর প্রতিনিধির সুপারিশের আলোকে কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা, তা যাচাইয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ/মতামত প্রদান করবেন;
 - গ) বিবিধ।
- ২। কমিটি প্রয়োজনে অন্য যে কোন কর্মকর্তাকে সদস্য হিসেবে কো-অর্ড করে পাবেন।
 - ৩। প্রস্তাবিত কমিটির কোন কর্মকর্তা বোর্ডের নির্দেশনার পরিকল্পিত বদলী বা অন্যত্র গমন করলে তার স্থলাভিষিক্ত কর্মকর্তা উক্ত কমিটির সংশ্লিষ্ট পদে প্রতিস্থাপিত হবেন এবং কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
 - ৪। কমিটি সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমসমূহের সুপারিশমালাসহ কারিগরি প্রতিবেদন এ আদেশ জারীর পরবর্তী ২১(একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে ০৩(তিন) প্রতে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নকশা ও গবেষণা) মহোদয়ের দপ্তরে দাখিল করবেন।

মহাপরিচালক, বাপাউবো মহোদয়ের সদয় অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারী করা হলো।


 এস, এম, হুমায়ুন কবীর
 উপ-পরিচালক (প্রশাসন)
 অতিঃ মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নকশা ও গবেষণা) এর দপ্তর,
 বাপাউবো, ঢাকা।
 ফোনঃ ০১৬৮৪-৪৯১৫৮১
 ই-মেইল: smhumayunk@gmail.com



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mowr.gov.bd



স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৯.১৭.১৬৫

তারিখ: ১৩ পৌষ ১৪৩০

২৮ ডিসেম্বর ২০২০

বিষয়: 'নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের বাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটিতে প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান।

সূত্র: বাপাউবো'র স্মারক নং-৪১৫-অমপ (পরি)-বাপাউবো/২০২০; তারিখ: ২১/১২/২০২০ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে, 'নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের বাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে আইএমইডি'র সুপারিশের আলোকে কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা বাস্তবতার নিরীখে যাচাইয়ের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে সুপারিশমালাসহ কারিগরি প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে নির্দেশক্রমে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তা-কে মনোনয়ন প্রদান করা হলো।

কর্মকর্তার নাম ও পদবী	ই-মেইল/মোবাইল নম্বর
জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রহিম রিপন উপসচিব, পরিকল্পনা-০৩ শাখা	01718554404 pla3.mowr@gmail.com

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

২৮-১২-২০২০

মোহাম্মদ আব্দুর রহিম রিপন

উপসচিব

ফোন: ২২৩৩৫৭২৩৪

ইমেইল: plan3.mowr@gmail.com

মহাপরিচালক

মহাপরিচালক-এর দপ্তর

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৯.১৭.১৬৫/১(৪)

তারিখ: ১৩ পৌষ ১৪৩০

২৮ ডিসেম্বর ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা, নক্সা ও গবেষণা), বাংলাদেশ

পানি উন্নয়ন বোর্ড

২) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২৫/০৬/২০২৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত 'জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি' সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি: জনাব মো: গোলাম মওলা
জেলা প্রশাসক
নওগাঁ।

স্থান: জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ: ২৫ জুন, ২০২৪ খ্রিঃ।
সময়: দুপুর ২:১৫ ঘটিকা।

(সভায় উপস্থিত সদস্য/প্রতিনিধিগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-ক দ্রষ্টব্য)

সভাপতি কর্তৃক উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। সভাপতি জানান পৃথিবীর তিনভাগ জল একভাগ স্থলা পৃথিবীর এই বিশাল জলরাশির ৯৭% লবনাক্ত সমুদ্রের পানি, যা সরাসরি ব্যবহার অনুপযোগী। অবশিষ্ট ৩% বিশুদ্ধ পানি। এই বিশুদ্ধ পানির ২% হিমরাহ, বরফ ও তুষার; ০.৯৫% ভূগর্ভস্থ পানি; ০.০১% ভূপরিষ্ক মিঠা পানি যা নদী-নালা, খাল, বিল ও হ্রদে রয়েছে এবং ০.০৪% পানি বাতাসে রয়েছে। পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক সুপেয় পানির যোগান দেয় এই ০.৮৫% ভূগর্ভস্থ পানি। বাংলাদেশে শতভাগ মানুষ খাবার পানি হিসাবে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে এবং ৮০% কৃষি কাজ ভূগর্ভস্থ পানিতেই হয়ে থাকে। অতি মূল্যবান এই ভূগর্ভস্থ পানির ভান্ডার এর টেকসই ব্যবহার, সংরক্ষণ, পরিপূর্ণ পুনঃভরন এর মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানি ভান্ডারের সুস্থিতি নিশ্চিত করা জরুরী। আমাদের দেশে ভূগর্ভস্থ পানিকে দূষনমুক্ত রাখা, লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ বন্ধ করা এবং সংরক্ষণ করে ভূপরিষ্ক পানির ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আগামী দিনে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সারা বিশ্বে তীব্র পানি সংকট মোকাবেলা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নির্বিচারে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার বন্ধে এখনই তৎপর হতে হবে, গ্রহণ করতে হবে কার্যকরী পদক্ষেপ। আগামী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ করে যেতে হবে অমূল্য অদৃশ্য ভূগর্ভস্থ এই পানি সম্পদ। তিনি আরও জানান মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূরপ্রসারী “বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান-২১০০” বাস্তবায়নের নিমিত্ত নিরাপদ, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিঘাতসহিষ্ণু সমৃদ্ধশালী ব-দ্বীপ গড়ে তোলা এবং পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ন্যায়সঙ্গত সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদে পানি ও খাদ্য নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত এবং অন্যান্য ব-দ্বীপ সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলা করা তথা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে পানি সম্পদ উন্নয়নে নওগাঁ জেলার ছোট নদী, খাল-বিল ও জলাশয় খনন কাজ করা এখন সময়ের দাবী।

সভাপতি এ জেলায় পানি সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সার্বিক কার্যক্রম অবহিত করণের জন্য 'জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি' এর সদস্য-সচিব, নির্বাহী প্রকৌশলী, নওগাঁ পওর বিভাগ, বাপাউবো, নওগাঁকে অনুরোধ করলে তিনি নিম্নবর্ণিতভাবে এ জেলায় পানি সম্পদের সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন।

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা নওগাঁ। নওগাঁ জেলা আদিকাল হতেই বৈচিত্রে ভরপুর। এ জেলায় মোট ১১টি উপজেলা রয়েছে। এ জেলার মোট আয়তন ৩৪৩৫.৬৭ বর্গকিলোমিটার, লোক সংখ্যা প্রায় ২৩.৮৫ লক্ষ, অবাদি জমির পরিমাণ প্রায় ২.৭৫ লক্ষ হেক্টর। এলাকার অধিকাংশই কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী। এ এলাকার জনগণের প্রধান আয়ের উৎস কৃষি ফসল এবং প্রধান ফসল ধান, তৈলবীজ, আলু, ডাল, গম, আম ও শাক-সবজি। অসংখ্য খাল-বিল ও নদী-নালায় লীলাক্ষেত্র এ নওগাঁ জেলা। এ জেলার উপর দিয়ে ছোট-বড় ১২ (বার) টি নদী প্রবাহিত হয়েছে। প্রধান প্রধান নদীগুলো হল-ছোট যমুনা নদী, আত্রাই নদী, শিব নদী, রাণী নদী (ফকিরনী নদী), নাগর নদী, তুলসীগঙ্গা নদী, পূর্ণভবা নদী ইত্যাদি। তনোয়া, আত্রাই ও পূর্ণভবা নদী দুটি আন্তঃসীমান্ত নদী। এ নদী গুলি অসংখ্য খাল, বিল ও জলাশয় দ্বারা সংযুক্ত। ইতিপূর্বে নওগাঁ জেলায় মোট ৭টি নদীর তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু, “বাংলাদেশের নদ-নদী সমূহের হালনাগাদকরণ ও তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস)' এর তথ্যানুসারে নওগাঁ জেলার উপর দিয়ে ১৩টি নদী প্রবাহিত হয়েছে। সিইজিআইএস প্রণীত ১৩টি নদীর তথ্য নিচে দেওয়া হল:

ক্রম নং	নদীর নাম	উৎসায়ুখ	পতিতায়ুখ	দৈর্ঘ্য (কি:মি:)
১	আত্রাই	করতোয়া	গুমানি	২৫৫
২	আত্রাই (নওগাঁ-নাটোর)	আত্রাই	আত্রাই	৩৫
৩	চিরি (দিনাজপুর-নওগাঁ)	নিম্নাঞ্চল	ছোট যমুনা	৩৮
৪	ছোট যমুনা	ইছামতি (দিনাজপুর)	আত্রাই	১৯৬
৫	গুকসী	ভারত	ছোট যমুনা	৪০
৬	ইরামতী	নিম্নাঞ্চল	আত্রাই (নওগাঁ-নাটোর)	৬১
৭	নাগর (রাজশাহী)	করতোয়া (নীলফামারী)	আত্রাই (নওগাঁ-নাটোর)	১১৭
৮	পূর্ণভবা	নিম্নাঞ্চল	মহানন্দা লোয়ার (নবাবগঞ্জ)	১৬৮

ক্রম নং	নদীর নাম	উৎসমুখ	পতিতমুখ	দৈর্ঘ্য (কিমিঃ)
৯	রানী (ফকিরনী)	আত্রাই	বার্নাই	৩১
১০	শীব	আত্রাই	বার্নাই	৬৭
১১	শিরমাখালী	আত্রাই	আত্রাই	২৪
১২	শীবা ভাড়ানী	নিম্নাঞ্চল	শীব	৯৫
১৩	তুলসীগঙ্গা	নিম্নাঞ্চল	ছোট যমুনা	১০৩

১৩টি নদীর বিষয়ে সভায় মতামত গ্রহণ প্রয়োজন। এর মধ্যে আত্রাই নদীর নাম দুইবার এসেছে। সভায় এটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। কয়েকটি নদীর উৎপত্তি ও পতিত স্থল স্পষ্টায়ন করা হয় নাই। কিছু কিছু নদীর দৈর্ঘ্য অসঙ্গতি রয়েছে। নদীর নাম, উৎপত্তি ও পতিত স্থল এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দেখে সকলে একমত হন যে, নওগাঁ জেলার উপর দিয়ে মোট ১২টি নদী প্রবাহিত হয়েছে।

এ জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত মোট ১২(বার) টি নদীর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৩৬.০০ কিলোমিটার। এ ১২টি নদী সিস্টেম এবং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল Water Body'র টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা গেলে নওগাঁ জেলার পানি নিষ্কাশন ও ভূ-পরিষ্কার পানির মাধ্যমে সেচের পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত হবে এবং জলাবদ্ধতা দূরীভূত হবে। এতে শস্য ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। একই সাথে ভূগর্ভস্থ পানির স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশের উন্নয়ন সহ অন্যান্য টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। এ সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত নওগাঁ জেলার ১২টি নদীর তথ্য নিচের ছকে প্রদান করা হলো :

নওগাঁ জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত ১২টি নদী:

ক্রম নং	নদীর নাম	মোট দৈর্ঘ্য (কিমিঃ)	নওগাঁ অংশে দৈর্ঘ্য (কিমিঃ)	গড় প্রস্থতা (মিটার)	উৎপত্তি	পতিত
১	আত্রাই নদী	২৬৯.০০	১২১.০০	১৭৭.০০	ভারতের হিমালয় পর্বত হতে করতোয়া নামে।	গুমানী নদী
২	ছোট যমুনা নদী	১৯৫.০০	৯৩.০০	৮৫.০০	দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার বড় চড়িপুর বিল হতে ইছামতি নামে।	আত্রাই নদী
৩	পুনর্ভবা নদী	২২৩.০০	৩৮.০০	৩৩.০০	দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ উপজেলার নিম্নাঞ্চল হতে।	মহানন্দা নদী
৪	তুলসীগঙ্গা নদী	১০৩.০০	২৮.০০	২২.০০	দিনাজপুর জেলার নওয়াবগঞ্জ উপজেলার নিম্নাঞ্চল হতে।	ছোট যমুনা নদী
৫	রাণী (ফকিরনী) নদী	৩১.০০	১৫.০০	৩০.০০	নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার নুরুল্লাহবাদ ইউনিয়নের জোতবাজার নামক স্থানে আত্রাই নদী হতে।	বার্নাই নদী
৬	শিব নদী	৭১.০০	৪০.০০	৪০.০০	নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার ভালাইন ইউনিয়নের বৈদ্যপুর নামক স্থানে আত্রাই নদী হতে।	বার্নাই নদী
৭	নাগর নদী	১২০.০০	৬৮.০০	২৯.০০	বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় করতোয়া নদী হতে।	আত্রাই নদী
৮	চিরি নদী	৭০.০০	১৭.০০	১৮.০০	দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলায় একুইর খাল হতে।	ছোট যমুনা নদী
৯	গুকসী নদী	৪০.০০	৪০.০০	১৫.০০	ভারতে নিম্নাঞ্চল হতে উৎপত্তি হয়ে ধামুইরহাট উপজেলায় বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।	ছোট যমুনা নদী
১০	ইরামতী নদী	৬১.০০	৫০.০০	১৭.০০	বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া উপজেলার চামরুল ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল হতে।	আত্রাই নদী
১১	শিরমাখালী (এলঙ্গা নদী) নদী	২৪.০০	২৪.০০	১৫.০০	নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার প্রসাদপুর ইউনিয়নে আত্রাই নদী হতে।	আত্রাই নদী
১২	শীবাভাড়ানী নদী (মাটিয়াপার নদী)	১০২.০০	১০২.০০	১৫.০০	নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলার আখাখিওন ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল হতে।	শিব নদী
	মোট =	১৩০৯.০০	৬৩৬.০০			

নওগাঁ জেলার খালের তথ্য :

ক্রম নং	উপজেলার নাম	ছোট নদী/খাল এর সংখ্যা (টি)	দৈর্ঘ্য (কিমি:)
১	আড়াই	১০ টি	৬২.৬০
২	রাণীনগর	৪ টি	২১.০০
৩	নওগাঁ সদর	১০ টি	৯০.৫০
৪	মান্দা	১২ টি	৯৮.৪৭
৫	মহাদেবপুর	৬ টি	৪১.৮০
৬	বদলগাছী	২ টি	২৮.০০
৭	ধামইরহাট	৩ টি	২৮.০০
৮	পত্নীতলা	৮ টি	২৫.৪০
৯	নিয়ামতপুর	২ টি	১২.০০
১০	সাপাহার	৪ টি	১৬.০০
১১	পোরশা	৩ টি	১৭.০০
	মোট =	৬৪ টি	৪৪০.৭৭

সদস্য-সচিব আরও জানান, ২০১৮-২০২২ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলের বার্ষিক বৃষ্টিপাত কখনও ১,৪০০ মিলিমিটার অতিক্রম করেনি, যা জাতীয় গড় বৃষ্টিপাত ২,৫৫০ মিলিমিটার থেকে ৪৫% কম। গত বছর অবশ্য, এই অঞ্চলে ১৮০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাটোল ও গোমস্তাপুর; রাজশাহীর তানোর ও গোদাগাড়ী এবং নওগাঁর পোরশা, সাপাহার ও নিয়ামতপুর সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কমপক্ষে ৪৫ মিটার উঁচু। তবে এই তিন জেলায় এমন কিছু অঞ্চল রয়েছে যেগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১০ মিটার উঁচু। ধান চাষের জন্য কেবল ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার এই উঁচু ও শুকনো অঞ্চলে পানীয় জল দুপাশ্য করে তুলতে পারে। বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ধান উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশে সেচের জন্য যে পানি ব্যবহার করে তার ৮০ শতাংশই ভূগর্ভস্থ পানি। ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে ভূগর্ভস্থ পানি স্তর পোরশা, সাপাহার ও নিয়ামতপুর উপজেলায় ভূপৃষ্ঠের ৮০ ফুট নিচে, যেটা ২০১৮ সালে ১০৭ ফুট নিচে এবং ২০২৩ সালে ১৫০ ফুট নিচে অবস্থান করে। বরেন্দ্র অঞ্চলে পানির স্তর নিচে নামা এখনো অব্যাহত আছে। প্রতি সেচ মৌসুমের শেষে পানির স্তরটি কখনো কখনো ১৭০-২০০ ফুট পর্যন্ত নিচে চলে যায়। তাই, ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে এখনই সুচিন্তিত জরুরি পদক্ষেপ প্রয়োজন।

ভূগর্ভস্থ পানির উপরে সবার সমান অধিকার আছে এবং পানির সর্বোত্তম টেকসই ব্যবহার এটি নিশ্চিত করতে পারে। বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা ২০১৮ এই অধিকারগুলি নিশ্চিত করে। সরকার এখন পানি সম্পদগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো সুরক্ষার জন্য আইন প্রয়োগ করা এবং সেগুলোর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ লক্ষ্যে সম্প্রতি, ওয়ারপো রাজশাহীতে একটি অফিস স্থাপন করে এবং রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার সরদহ ইউনিয়নে একটি পানি মডেলিং প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় ওয়ারপো পানির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে ভূগর্ভস্থ ও ভূপরিষ্ক পানি সম্পদের মানচিত্র তৈরি করবে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে পানির প্রাপ্যতা ও পর্যাপ্ততা পরিমাপ করবে। এটি ব্যক্তিগত, কৃষি ও শিল্প খাতে পানির চাহিদা নির্ধারণ করে ভূগর্ভস্থ পানির নিরাপদ উত্তোলন সীমা চিহ্নিত করবে। এ প্রকল্পের অধীনে হাইড্রোলজিকাল তদন্তের সময় কোনো অঞ্চলকে পানি সংকটাপন্ন এলাকা (water stressed area) হিসেবে ঘোষণা করবে। অর্থাৎ, একটি একুইফারে মোট প্রাপ্য পানির ৮০% বা এর অধিক ব্যবহার হলেই সেটি water stressed area হিসেবে বিবেচিত হবে। এটিই দেশে প্রথম পানি শাসন। আমরা যখন ভূগর্ভস্থ পানির পরিস্থিতি সঠিকভাবে জানব তখন আমরা আমাদের কৃষি ও শিল্প বিকাশের জন্য সঠিক ও টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারব।

উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানান এক কেজি বোরো ধান উৎপাদন করতে প্রায় ৩০০০ লিটার এবং প্রতি কেজি গম ও ডুট্টা উৎপাদনে প্রায় ৪০০-৬০০ লিটার পানির প্রয়োজন হয়। বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য সেচ কাজে ভূপৃষ্ঠের ভূপরিষ্ক পানি ব্যবহার করা উচিত। এছাড়া, কম সেচ লাগে এমন ফসল এবং সবজি চাষ এই অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানি খাবার জন্য সংরক্ষণে সহায়তা করতে পারে।

সদস্য-সচিব এবং নওগাঁ পানি উন্নয়ন বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান, সত্তরের দশকে এই অঞ্চলের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর মাত্র ৩০ ফুট নিচে ছিল যখন কৃষকরা সেচের জন্য শুধু নদী-খাল-বিল, হ্যাড টিউবওয়েল এবং বুটির পানি ব্যবহার করতেন। নব্বইয়ের দশকে বিএমডিএ গভীর নলকূপ স্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকরা বছরে তিনটি ফসলের চাষ শুরু করেন। বিএমডিএর কার্যক্রম অনুসরণ করে সচল কৃষক, ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা নিজস্ব গভীর নলকূপ স্থাপন করতে শুরু করেন। যার ফলে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল দেশের অন্যতম প্রধান শস্য-উৎপাদনকারী অঞ্চলে পরিণত হয়। যখন বিএমডিএ নতুন করে গভীর নলকূপ স্থাপন করা থেকে সরে এসে ভূপৃষ্ঠের পানির দিকে মনোনিবেশ করতে শুরু করে, বেসরকারি গভীর নলকূপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কৃষি ও শিল্পে অপরিহার্য হতে থাকে। তিনি আরও জানান বরেন্দ্র অঞ্চলের বার্ষিক ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের পরিমাণ ১৩,৭১০ মিলিয়ন ঘনমিটার যার প্রায় ৭০ শতাংশই বেসরকারি গভীর নলকূপ দিয়ে উত্তোলিত হচ্ছে।

সদস্য-সচিব আরও জানান যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূরপ্রসারী “ব-দ্বীপ পরিকল্পনা/২১০০” বাস্তবায়নের লক্ষ্যে “৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পটি বিগত ২৬/১২/২০১৮ তারিখে সারা দেশব্যাপী একযোগে উদ্বোধন করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ে ৮টি খাল এবং প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের ২য় সংশোধনে অপর ৬টি অর্থাৎ মোট ১৪টি খাল/নদীর হাতিখোজা, সোয়রকাটা, খুদিয়াভাঙ্গা, জাত-আমরুল, তুলসীগঙ্গা (পুরাতন) নদী, রাণী নদী (ফকিরনী নদী) পুনঃখনন করা হয়েছে।

এ প্রকল্পের আওতায় ১৪টি খাল/নদীর ৭৮.২৭ কিঃমিঃ পুনঃখনন কাজ সমাপ্ত হওয়ায় খাল/নদীর পার্শ্ববর্তী কৃষকেরা শুষ্ক মৌসুমেও চাষাবাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ভূপরিষ্কৃত পানি পাচ্ছেন। কিএমডিএ এবং কৃষকরা নদী ও খালের উভয় পাড়ে পাম্প স্থাপন করে ইরি/বরো খানে সেচ প্রদান করছেন। খননকৃত এসব নদী/খালের ভূ-পরিষ্কৃত পানি ব্যবহার করে কৃষকগণ ব্যাপকভাবে উপকৃত হচ্ছেন। নদী ও খালের পানিতে সেচ কাজের পাশাপাশি দেশীয় জাতের মাছ চাষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভূ-পরিষ্কৃত পানি ব্যবহারের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমছে। এতে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের উঠা-নামা হ্রাস পাওয়ায় আর্সেনিকের প্রাদুর্ভাব কমছে। তাছাড়া, পরিবেশ-প্রতিবেশের ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় খননকৃত খালের তথ্য নিম্নরূপ।

নওগাঁ জেলায় “৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় খননকৃত খালের তালিকা:

ক্রম নং	খালের নাম	উপজেলা	খালের খনন দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ)	মন্তব্য
১	শুটকীপাছা খাল	আত্রাই	৮.০০	সমাপ্ত
২	তুলসীগঙ্গা (পুরাতন) নদী	নওগাঁ সদর	১০.০০	সমাপ্ত
৩	মাহমুদপুর খাল	পত্নীতলা	২.০০	সমাপ্ত
৪	গোয়ালমাদা খাল	মান্দা	০.৫৭	সমাপ্ত
৫	মহিষবাথান খাল	মহাদেবপুর	০.৮০	সমাপ্ত
৬	কুজাইল খাল	রাণীনগর	৬.৫০	সমাপ্ত
৭	ছাওর হাসুড়া খাল	পোরশা	৩.০০	সমাপ্ত
৮	মাইলবিল-বড়ালবিল খাল	সাপাহার	৩.০০	সমাপ্ত
৯	হাতিখোজা খাল	পোরশা	১০.০০	সমাপ্ত
১০	সোয়রকাটা খাল	সাপাহার	৩.০০	সমাপ্ত
১১	খুদিয়াভাঙ্গা খাল	মান্দা	২.০০	সমাপ্ত
১২	জাত-আমরুল খাল	আত্রাই	৯.০০	সমাপ্ত
১৩	তুলসীগঙ্গা (পুরাতন) নদী	নওগাঁ সদর	৬.০০	সমাপ্ত
১৪	রাণী নদী (ফকিরনী নদী)	মান্দা	১৪.৪০	সমাপ্ত
মোট =			৭৮.২৭	

কমিটির সদস্য সচিব আরও জানান যে, “৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন (২য় পর্যায়)” শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পে নওগাঁ জেলার ১১টি উপজেলার ৪৩টি ছোট নদী/খাল/জলাশয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে আত্রাই উপজেলায় ৮টি, রাণীনগর উপজেলায় ৪টি, নওগাঁ সদর উপজেলায় ৯টি, বদলপাছী উপজেলায় ২টি, মহাদেবপুর উপজেলায় ৫টি, পত্নীতলা উপজেলায় ৪টি, ধামইরহাট উপজেলায় ২টি, মান্দা উপজেলায় ৯টি, নিয়ামতপুর উপজেলায় ২টি, সাপাহার উপজেলায় ১টি এবং পোরশা উপজেলায় ১টি সহ মোট ৪৭টি প্যাকেজে ৪৩টি ছোট নদী/খাল/জলাশয় প্রস্তাবিত এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির জন্য দাখিল করা হয়েছে।

নওগাঁ জেলায় “নওগাঁ জেলার ধামইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩ টি প্রকল্পের পূর্নবাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্প:

প্রকল্পটি জুলাই, ২০২০ সালে শুরু হয় এবং জুন, ২০২৪ সালে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

এ প্রকল্পের আওতায় ৫.১৪৫ কিঃমিঃ নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ, ২১ কিঃমিঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনঃরাকৃতিকরণ কাজ, ২৭ কিঃমিঃ নদী ড্রেজিং কাজ, ৬ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন কাজ, ৫টি রেগুলেটর মেরামত কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পের পরিমাণ ও গুণগত মান মার্চ দপ্তরের পাশাপাশি টাঙ্কফোর্স কর্তৃক মনিটর করা হয়েছে। প্রকল্পের ৫টি অঙ্গের ভৌত কাজের মধ্যে ৪টি প্যাকেজের ২৫ কিলোমিটার বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়নে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। সমস্যা সমাধানে আইএমইডি’র সুপারিশের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক জুন, ২০২৪ এর মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির জন্য বাঁধের উপর এলজিইডি’র বিটুমিনাস কাপেটিং রাস্তা ও বন বিভাগ ও ধামইরহাট কল্যান ট্রাস্টের মধ্যে গাছ নিয়ে বিরোধ এবং জমি অধিগ্রহণের সামগ্রিক বিষয় বাস্তবতার ভিত্তিতে সমাধানের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ বাপাউবোর কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কারিগরি কমিটি প্রকল্পের বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা, বাস্তবতার নিরীখে এলজিইডি কর্তৃক কাপেটিং রাস্তা থাকায় এবং সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যে ভূমি অধিগ্রহণ না থাকায় কারণে প্যাকেজ নং-Nao-W-07 এর ৪.০০ কিলোমিটার কাজ রহিতকরণ, প্যাকেজ নং-Nao-W-08 এর ৫.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের মধ্যে ২.০৩৪ কিঃমিঃ অংশে ক্যারিড আর্থ দিয়ে, প্যাকেজ নং-Nao-W-09 এর সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য এবং প্যাকেজ

নং-Nao-W-10 এর ৭.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের মধ্যে ০.৮৭০ কিঃমিঃ ব্যতিত অবশিষ্টাংশে কাজ বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশ করেছেন। সে মোতাবেক ২৫ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজের মধ্যে (৯+২.০৩৪+৬.১৩০) বা ১৭.১৬৪ কিলোমিটার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ১৭.১৬৪ কিলোমিটার বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজটি বাস্তবায়ন করতে নানাবিধ সমস্যায় পড়তে হয়। বিশেষ করে ডুমার্ক এমবেকমেন্ট এ কাজ বাস্তবায়ন করতে হালকা বৃষ্টিতেই এমবেকমেন্টের মাটি কার্পোটিং রাস্তায় এসে পিচ্ছিল জনিতকারনে যানবাহন চলাচলে দুর্ঘটনার সৃষ্টি হয়, তাছাড়া, বাঁধের উপর ১০/১২ জায়গায় বৈদ্যুতিক লাইন ক্রস করায় উচ্চতাজনিক কারণে দুর্ঘটনার সৃষ্টির আশংকায় স্থানীয়রা ডিজাইন মোতাবেক বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধিতে বাঁধা প্রদান করেন। এ বিষয়ে স্থানীয় সাংসদ এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রী পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় মহোদয় অবহিত রয়েছেন। কমিটির সর্বসম্মতিক্রমে প্রকল্পটিকে এ পর্যায়ে সমাপ্ত ঘোষণা করা প্রয়োজন।

বাস্তবায়িত প্রকল্পের সার্বিক চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো :

ক্রম নং	কাজের নাম	উপজেলা	দৈর্ঘ্য (কিঃমিঃ)	মন্তব্য
১	পূর্বনন্দনপুর নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে ৫০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	ধামুইরহাট	০.৫০০	সমাপ্ত।
২	পূর্ব পাটিচড়া নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে ১০০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	পত্নীতলা	১.০০০	সমাপ্ত।
৩	আত্রাই নদীর বামতীরে নুরপুর নামক এলাকায় ৩০০ মিটার এবং কলোনীপাড়া নামক স্থানে ৫৩০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	মহাদেবপুর	০.৮৩০	সমাপ্ত।
৪	মাহমুদপুর ও ইছাপুর নামক স্থানে আত্রাই নদীর ডানতীরে ৭২০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	পত্নীতলা	০.৭২০	সমাপ্ত।
৫	উদয়শ্রী নামক স্থানে আত্রাই নদীর ডানতীরে ২০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	ধামুইরহাট	০.২০০	সমাপ্ত।
৬	বৈরাগীপোতা নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে ৫৫০ মিটার এবং মহাশাশান নামক স্থানে ২০০ মিটার সর্বমোট ৭৫০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	পত্নীতলা	০.৭৫০	সমাপ্ত।
৭	ছিলিমপুর ছানিমাম উপপ্রকল্পের আওতায় কিঃমিঃ ০.০০ হতে কিঃমিঃ ৪.০০ = ৪.০০ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ।	ধামুইরহাট	৪.০০০	কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ প্রকল্পের কাজ রহিত করা হয়েছে।
৮	আত্রাই নদীর ডানতীর বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় কিঃমিঃ ০.০০ হতে কিঃমিঃ ৫.০০ = ৫.০০ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ।	ধামুইরহাট	২.০৩৪	কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।
৯	পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলার অন্তর্গত পত্নীতলা উপপ্রকল্পের আওতায় কিঃমিঃ ৫.০০ হতে কিঃমিঃ ২৩.০০ এর মধ্যবর্তী স্থানে = ১৮.০০ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ।	পত্নীতলা ও মহাদেবপুর	১৮.০০০	এ
১০	পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলার অন্তর্গত আত্রাই নদীর ডানতীর বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় কিঃমিঃ ২৫.০০ হতে কিঃমিঃ ৩২.০০ = ৭.০০ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ।	মহাদেবপুর	৬.১৩০	এ
১১	পত্নীতলা উপজেলার অন্তর্গত কাশিপুর, বড় চাঁদপুর, ছোট চাঁদপুর, রাজপাথ এবং উজিরপুর নামক স্থানে ০৫টি রেগুলেটর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	পত্নীতলা	০৫ টি	সমাপ্ত।
১২	কাশিপুর ১ ডেক্ট, উজিরপুর ১ ডেক্ট, ছোট চাঁদপুর ২ ডেক্ট, বড় চাঁদপুর ১ ডেক্ট, রাজপাথ ১ ডেক্ট কাঠামোর ৬টি লিফ্ট গেট, ৫টি ফ্লাপ গেট ও ৬টি হোয়েস্ট সরবরাহ এবং স্থাপন কাজ।	পত্নীতলা	১৭ টি	সমাপ্ত।
১৩	পত্নীতলা উপজেলার অন্তর্গত কাশিপুর খাল, বড় চাঁদপুর খাল, ছোট চাঁদপুর খাল, রাজপাথ খাল এবং উজিরপুর খাল মোট ৬.০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন কাজ।	পত্নীতলা	৬.০	সমাপ্ত।
১৪	আত্রাই নদীর কিঃমিঃ ২০.০০ হতে কিঃমিঃ ২৯.০০ = ৯.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং কাজ।	মহাদেবপুর ও পত্নীতলা	৯.০	সমাপ্ত।
১৫	আত্রাই নদীর কিঃমিঃ ১১.০০ হতে কিঃমিঃ ২০.০০ = ৯.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং কাজ।	পত্নীতলা	৯.০	সমাপ্ত।
১৬	আত্রাই নদীর কিঃমিঃ ২.০০ হতে কিঃমিঃ ১১.০০ = ৯.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ড্রেজিং কাজ।	ধামুইরহাট	৯.০	সমাপ্ত।
১৭	নওগাঁ জেলার বাপাউবোর বিভিন্ন বাঁধে বনায়ন কাজ	নওগাঁ জেলা	১৬৯০টি	সমাপ্ত।
১৮	পত্নীতলা উপজেলার বাদপাইয়া শিমুলতলী শ্রাশানঘাট নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে ১০০ মিটার ও মহাদেবপুর উপজেলার বুড়াশিবতলা নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে ১০০ মিটার সর্বমোট ২০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	পত্নীতলা ও মহাদেবপুর	০.২০০	সমাপ্ত।
১৯	ধামুইরহাট উপজেলার অন্তর্গত রাঙ্গামাটি নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে ৪৯০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	ধামুইরহাট	০.৪৯০	সমাপ্ত।
২০	ধামুইরহাট উপজেলার রাঙ্গামাটি নামক স্থানে আত্রাই নদীর বামতীরে ৩১০ মিটার এবং উদয়শ্রী নামক স্থানে আত্রাই নদীর ডানতীরে ১৪৫ মিটার সর্বমোট ৪৫৫ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	ধামুইরহাট	০.৪৫৫	সমাপ্ত।

পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত প্রকল্পের তথ্য:

নওগাঁ জেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক এ পর্যন্ত ১৬টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এ সব প্রকল্পের আওতায় ৪৮৯টি হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার, ১৬৯.৯০ কিলোমিটার খাল খনন, ৭৫টি রেগুলেটর, ৪৯১.০৭ কিলোমিটার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, ১৫.৯৪ কিলোমিটার প্রতিরক্ষা কাজ সহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। নওগাঁ শহরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ছোট যমুনা নদী। প্রতি বছর বন্যার পানিতে নওগাঁ শহর প্রাণিত হতো। নওগাঁ শহরকে বন্যার পানি হতে রক্ষার জন্য ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৭৭৪২.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয় 'নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প'। নওগাঁ জেলায় বর্ষাকালে কৃষকদের ফসলি জমিসহ লোকালয় নদী ভাঙ্গন ও বন্যার পানি হতে রক্ষার্থে বাস্তবায়িত হয় পোন্ডার-১, পোন্ডার-সি, পোন্ডার-ডি উপ-প্রকল্প। নওগাঁ জেলার বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রেগুলেটরগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রেগুলেটরগুলো হলোঃ কাশিয়াবাড়ি রেগুলেটর (১০ ভেন্ট), শ্রীমতখালী রেগুলেটর (৬ ভেন্ট), বড়ধর রেগুলেটর (১২ ভেন্ট), পারসোমবাড়ি রেগুলেটর (৬ ভেন্ট), খরমোতী রেগুলেটর (৬ ভেন্ট), সালিগ্রাম রেগুলেটর (৩ ভেন্ট), শুটকিগাছা রেগুলেটর (৮ ভেন্ট), বিলপবনী রেগুলেটর (৫ ভেন্ট), হাপানিয়া রেগুলেটর (১৪ ভেন্ট)। পরিচালন ব্যয় খাতের বাজেট স্বল্পতার কারণে বাস্তবায়িত অবকাঠামো সমূহ যথাযথভাবে মেরামত ও রক্ষাবেক্ষন তথা পুনর্বাসন করা সম্ভব হয় না। পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন।

নওগাঁ জেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি :

ক্রম নং	সমাপ্ত প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়িত প্রকল্পের অঙ্গসমূহ	রেগুলেটর সংখ্যা (টি)	বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের দৈর্ঘ্য (কিমিঃ)	তীর প্রতিরক্ষা কাজ (কিমিঃ)	খাল খনন (কিমিঃ)
১	রক্তদহ-লোহাচুড়া নিষ্কাশন স্কীম	১৯৭২-৭৯	বাঁধ নির্মাণ = ৩৫.০০ কিমিঃ রেগুলেটর নির্মাণ = ৫টি খাল খনন = ৩৭.৮৪ কিমিঃ ইনলেট/ আউটলেট = ৮টি	৫	৩৫.০০	-	৩৭.৮৪
২	নওগাঁ পোন্ডার-১ উপ-প্রকল্প	১৯৮৫-৯৪	বাঁধ নির্মাণ = ৬৬.৫৭ কিমিঃ রেগুলেটর নির্মাণ = ০৪টি ক্রস রেগুলেটর নির্মাণ = ০৪টি খাল খনন = ৭৪.৪০ কিমিঃ ইনলেট/ আউটলেট = ১৫৯টি ড্রেনেজ সুইচ = ৫টি ব্রিজ /কালভার্ট = ৮টি ব্রিক ম্যাট্রিং ও রিভেটমেন্ট = ৬৪০০০ বর্গমিঃ ও ৭৫১০ ঘনমিঃ অন্যান্য (অফিস ভবন/খালসী সেড ইত্যাদি) = খালসী সেড ৩টি, অফিস ভবন ১টি	১৪	৬৬.৫৭	-	৭৪.৪০
৩	তুলসীগঙ্গা উপ-প্রকল্প	১৯৮৫-৮৬	বাঁধ নির্মাণ = ৬২.০০ কিমিঃ রেগুলেটর নির্মাণ = ১২টি খাল খনন = ২৩.৬০ কিমিঃ ইনলেট/আউটলেট = ২৪টি	৯	৪৩.৫০	-	২৩.৬০
৪	নাগর ভ্যালাী উপ-প্রকল্প	২০০৪-০৫	বাঁধ নির্মাণ = ৫৮.০০ কিমিঃ রেগুলেটর নির্মাণ = ৭টি ইনলেট/আউটলেট = ৫০টি নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ = ১.৫০ কিমিঃ।	৭	৫৮.০০	১.৫০	-
৫	আপার নাগরভ্যালাী উপ-প্রকল্প	১৯৯৪-৯৫	বাঁধ নির্মাণ = ২৫.৫৫ কিমিঃ রেগুলেটর নির্মাণ = ০৭টি খাল খনন = ৪.৫০ কিমিঃ ইনলেট/আউটলেট = ২৬টি	৭	২৫.৫৫	-	৪.৫০
৬	পোন্ডার-সি প্রকল্প	১৯৮৫-৮৬	বাঁধ নির্মাণ = ৫৮.০০ কিমিঃ রেগুলেটর নির্মাণ = ০৫ টি	৫	৫৮.০০	-	-
৭	পোন্ডার-ডি প্রকল্প	১৯৮৮-৮৯	বাঁধ নির্মাণ = ৫৫.০০ কিমিঃ রেগুলেটর নির্মাণ = ০৫টি	৭	৫৫.০০	-	-
৮	সিনিমপুর-ছালিগ্রাম উপ- প্রকল্প	১৯৯৪-৯৫	বাঁধ নির্মাণ = ১০.২৭ কিমিঃ রেগুলেটর নির্মাণ = ০৩টি	৩	১০.২৭	-	-
৯	পত্নীতলা উপ-প্রকল্প	১৯৯৪-৯৫	বাঁধ নির্মাণ = ২৬.১০ কিমিঃ রেগুলেটর নির্মাণ = ০৫টি অন্যান্য অবকাঠামো = ৩১টি	৫	২৬.১০	-	-
১০	তুলসীগঙ্গা বামতীর বাঁধ	১৯৯৪-৯৫	বাঁধ নির্মাণ = ১৪.৩১ কিমিঃ	১	১৪.০৩১	-	-

ক্রম নং	সমাপ্ত প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	বাস্তবায়িত প্রকল্পের অঙ্গসমূহ	রেগুলেটর সংখ্যা (টি)	বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের দৈর্ঘ্য (কিমিঃ)	তীর প্রতিরক্ষা কাজ (কিমিঃ)	খাল খনন (কিমিঃ)
	নির্মাণ উপ-প্রকল্প		রেগুলেটর নির্মাণ = ০১টি ইনলেট/আউটলেট = ২২টি				
১১	আত্রাই নদীর ডানতীরে বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	২০০৫-০৬	বাঁধ নির্মাণ = ৫১.৩০ কিমিঃ রেগুলেটর নির্মাণ = ০৫টি ইনলেট/আউটলেট = ৩৫টি নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ = ১.২৩ কিমিঃ	৫	৫১.৩০	১.২৩	-
১২	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প	২০১০-১৬	নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ = ৭.৭৬ কিমিঃ ইনলেট/আউটলেট = ৯০টি আরসিসি-ফ্লাড-ওয়াল = ৬.৯৮৪ কিমিঃ ঘাট ও সিঁড়ি = ২০টি	-	-	৭.৭৬	-
১৩	বদলগাছী বন্যা নিয়ন্ত্রণ উপ-প্রকল্প	১৯৯৩-৯৪	বাঁধ নির্মাণ = ৩৭.৭৫ কিমিঃ রেগুলেটর নির্মাণ = ০৬টি ইনলেট/ আউটলেট = ৩০টি	৬	৩৭.৭৫	-	-
১৪	আত্রাই নদীর ডানদিক হতে নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার ৩টি এলাকায় তীর সংরক্ষণ এবং মান্দা উপজেলার পলাশবাড়ী খাল পুনঃখনন প্রকল্প	২০১৬-১৮	নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ=১.৩০ কিমিঃ, খাল পুনঃখনন = ১২.০১ কিমিঃ	-	-	১.৩০	১২.০১
১৫	নওগাঁ জেলার সাপাহার ও পোরশা উপজেলাধীন জবাইবিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	২০১৬-২০	বাঁধ নির্মাণ = ১০.০০ কিমিঃ রেগুলেটর নির্মাণ = ০১টি ইনলেট নির্মাণ = ১০টি খাল পুনঃখনন = ১৭.৫৫০ কিমিঃ বাঁধ প্রতিরক্ষা কাজ = ০.৮০০ কিমিঃ	১	১০.০০	০.৮০	১৭.৫৫
১৬	সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	২০০৪-০৫	নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ = ৩.৩৫০ কিমিঃ	-	-	৩.৩৫	-
			সর্বমোট =	৭৫টি	৪৯১.০৭১	১৫.৯৪	১৬৯.৯০

নওগাঁ জেলায় নদী ডানদিক প্রবন এবং বাঁধ ভাঙনের স্পর্শকাতর এলাকা:

সভাপতি মহোদয় নওগাঁ জেলার নদী ডানদিক প্রবন এবং বাঁধ ভাঙনের স্পর্শকাতর এলাকা সম্পর্কে জানতে চাইলে সদস্য-সচিব তথা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান নওগাঁ জেলার মান্দা ও আত্রাই উপজেলাধীন আত্রাই নদীর বামতীর ও ডানতীর বরাবর নুরুল্যাবাদ, জোকাহাট, মালিপুর, ফতেহপুর, বৈঠাখালি, বিষ্ণুপুর, দাসপাড়া, সৈয়দপুর, বান্দাইখাড়া, কালিকাপুর, বানডুবি, নিমবাড়িয়া, গোসাইপুর, কালিকাপুর, পোস্তার-সি ও পোস্তার-১ এর বিভিন্ন পর্যায়ে বর্ষা মৌসুমে ভাঙনের তীব্রতা অনেক বেশী। অন্যদিকে ছোট যমুনা নদীর বামতীরবর্তী বদলগাছী উপজেলার কদমগাছী, রাণীনগর উপজেলার নান্দাইবাড়ি, কুজাইল, আত্রাই উপজেলার মির্জাপুর, রসুলপুরসহ বিভিন্ন পর্যায়ে বর্ষা মৌসুমে ভাঙনের তীব্রতা অনেক বেশী। আসন্ন বর্ষায় স্পর্শকাতর স্থানগুলিতে জরুরী ভিত্তিতে কাজ বাস্তবায়ন করার জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের দুর্বল স্থান এবং নদীতীরের তালিকা এবং কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বাজেট চাহিদা বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে। কাজ বাস্তবায়নের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেলে জরুরী ভিত্তিতে কাজ বাস্তবায়ন করা হবে। কাজের তালিকা নিচে প্রদান করা হলো:

(ক) নদী ডানদিক প্রবন এলাকা:

ক্রম নং	প্রস্তাবিত অরক্ষিত নদীতীরের মেরামত কাজ (চৌইনেজ সহ)	কাজের অবস্থান (জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন)	কাজের দৈর্ঘ্য (মিটার)	সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১	নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলার আধাইল ইউনিয়নের অন্তর্গত ৯নং ওয়ার্ডের বৈঠাখালি এলাকায় ছোট যমুনা নদীর বামতীর বাঁধের কিমিঃ ৩৫.৬৫০ হতে কিমিঃ ৩৬.১৫০ = ৫০০ মিটার অংশে প্রতিরক্ষামূলক কাজের মাধ্যমে তীর প্রতিরক্ষা কাজ।	নওগাঁ/বদলগাছী/বৈঠাখালি	৫০০.০০	৩০০.০০
২	নওগাঁ পুর বিভাগ, বাপাউবো, নওগাঁ এর আওতাধীন "নাগরভাঙ্গা উপ-প্রকল্প" এর অধীনে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এর কিমিঃ ০.৫০০ হতে কিমিঃ ৫.০০ এর মধ্যে বর্তী ৫০০.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ।	নওগাঁ/আত্রাই/পাঁচপুর	৫০০.০০	৭৫০.০০
৩	নওগাঁ পুর বিভাগ, বাপাউবো, নওগাঁ এর আওতাধীন "নাগরভাঙ্গা উপ-প্রকল্প" এর অধীনে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এর কিমিঃ ৮.৪৯৫ হতে কিমিঃ ৮.৫৫৫ এর	নওগাঁ/আত্রাই/পাঁচপুর	৬০.০০	১৫০.০০

ক্রঃ নং	প্রস্তাবিত অরক্ষিত নদীতীর মেরামত কাজ (চেইনেজ সহ)	কাজের অবস্থান (জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন)	কাজের দৈর্ঘ্য (মিটার)	সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ টাকা)
৪	মধ্যেবর্তী ৬০ মিটার দৈর্ঘ্যের তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ। নওগাঁ পওর বিভাগ, বাপাউবো, নওগাঁ এর আওতাধীন “নাগরভাঙ্গা উপ-প্রকল্প” এর অধীনে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এর কিঃমিঃ ৮.৫৫৫ হতে কিঃমিঃ ৮.৬১৫ এর মধ্যেবর্তী ৬০ মিটার দৈর্ঘ্যের তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ।	নওগাঁ/আত্রাই/পাঁচপুর	৬০.০০	১৪৫.০০
৫	নওগাঁ পওর বিভাগ, বাপাউবো, নওগাঁ এর আওতাধীন “রক্তদহ-লোহাচুড়া বিল নিষ্কাশন স্কিম” এর কিঃমিঃ ৭.৫০০ হতে কিঃমিঃ ৯.০০ এর মধ্যেবর্তী স্থানে ৩০০ মিটার নদীর তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ।	নওগাঁ/রাণীনগর/নগরব্রীজ	৩০০.০০	১০০.০০
৬	নওগাঁ পওর বিভাগ, বাপাউবো, নওগাঁ এর আওতাধীন “রক্তদহ-লোহাচুড়া বিল নিষ্কাশন স্কিম” এর ছোট যমুনা নদীর ডানতীর বরাবর কিঃমিঃ ০.৪০০ হতে ০.৮০০ = ৪০০ মিটার এর স্থায়ী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ।	নওগাঁ/রাণীনগর/আট্টামাম	৪০০.০০	৪০০.০০
৭	নওগাঁ পওর বিভাগ, বাপাউবো, নওগাঁ এর আওতাধীন “রক্তদহ-লোহাচুড়া বিল নিষ্কাশন স্কিম” এর কিঃমিঃ ১৫.১৫০ হতে ১৬.৫০০ এর মধ্যেবর্তী স্থানে ৩০০ মিটার নদীর তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ।	নওগাঁ/আত্রাই/নান্দাইবাড়ী	৩০০.০০	১০০.০০
৮	নওগাঁ পওর বিভাগ, বাপাউবো, নওগাঁ এর আওতাধীন আত্রাই নদীর ডানতীরে “চলনবিল প্রকল্প পোন্ডার-সি” দাশপাড়া নামক স্থানে কিঃমিঃ ৪.৪৮০ হতে কিঃমিঃ ৪.৬৮০ মোট ২০০.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ।	নওগাঁ/মান্দা/বিষ্ণুপুর	২০০.০০	৭৫০.০০
৯	নওগাঁ পওর বিভাগ, বাপাউবো, নওগাঁ এর আওতাধীন নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলার বলদিয়াঘাট (কলমুড়াঙ্গা) নামক স্থানে পুনর্ভবা নদীর ডানতীরে কিঃমিঃ ১১.২৪০ হতে কিঃমিঃ ১১.৪৪০ = ২০০ মিটার তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ।	নওগাঁ/সাপাহার/পাতাড়ি	২০০.০০	৩০০.০০
		সর্বমোট =	২৫২০.০০	২৯৯৫.০০

এসব নদী ভাঙ্গন রোধকল্পে (১) ‘নওগাঁ জেলার আত্রাই নদীর ভাঙ্গন হতে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রক্ষার্থে নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ’, (২) ‘নওগাঁ জেলার মান্দা, রাণীনগর ও আত্রাই উপজেলাধীন ৪টি প্রকল্পের পুনর্বাসন ও আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণমূলক প্রকল্প’ (৩) ‘রক্তদহ-লোহাচুড়া বিল ড্রেনেজ স্কিম পুনর্বাসন প্রকল্প’ (৪) ‘নওগাঁ জেলার বদলগাছী উপজেলায় ছোট যমুনা নদীর উভয়তীর সংরক্ষণ প্রকল্প’ এবং (৫) ‘নওগাঁ জেলার সদর উপজেলায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং নদীর তীর সংরক্ষণ’ শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোর ডিপিপি প্রস্তুতকরণের লক্ষ্যে যাচাই কমিটির সুপারিশের আলোকে Feasibility Study এর জন্য প্রস্তাবনা দাখিল করা হয়েছে। নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার আত্রাই নদীর পাড় বাড়ুবা থেকে হাট পাঠাগাটা পর্যন্ত, কালিকাপুর বাজার থেকে গোসাইপুর মোড় হয়ে ফেরিঘাট পর্যন্ত পশ্চিম পার্শে, পার-আত্রাই নদীর পাড় বাড়ুবা থেকে হাট পাঠাগাটা পর্যন্ত, কালিকাপুর বাজার থেকে গোসাইপুর মোড় হয়ে ফেরিঘাট পর্যন্ত পশ্চিম পার্শে, পার-কালিকাপুর ঘাট থেকে ফেরিঘাট টোল পর্যন্ত, খুদিয়াডাঙ্গা পূর্ব পাড়, তালপাতিলা পূর্বপাড়, তেগাড়াহাট আত্রাই নদীর ডানতীর ও বামতীর বরাবর বিদ্যমান “চলন বিল প্রকল্প পোন্ডার-সি”, “চলন বিল প্রকল্প পোন্ডার-ডি” ও “নওগাঁ পোন্ডার-১” উপ-প্রকল্পের বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের স্লোপ মেরামত ও উচ্চতা বৃদ্ধিকরণ কাজ এর জন্য ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রস্তাবনা বাপাউবোর পরিকল্পনা দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাঁধ ভাঙ্গনের স্পর্শকাতর এলাকা:

ক্রঃ নং	প্রস্তাবিত দুর্বল বাঁধ মেরামত কাজ (চেইনেজ সহ)	কাজের অবস্থান (জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন)	প্রস্তাবিত মেরামত কাজের দৈর্ঘ্য (মিটারে)	সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১	নাগরভাঙ্গা উপ-প্রকল্প এর অধীনে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এর কিঃমিঃ ০.৫০০ হতে কিঃমিঃ ৭.০০০ এর মধ্যেবর্তী ৫০০০.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের বাঁধ মেরামত কাজ।	নওগাঁ/আত্রাই/পাঁচপুর	৫০০০.০০	১৫০.০০
২	নাগরভাঙ্গা উপ-প্রকল্প এর অধীনে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এর কিঃমিঃ ২১.২৩০ হতে কিঃমিঃ ২১.৭০০ মোট = ৪৭০.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের বাঁধ মেরামত কাজ।	নওগাঁ/আত্রাই/বিশা	৪৭০.০০	৮৬.৫৪
৩	রক্তদহ-লোহাচুড়া বিল নিষ্কাশন স্কিম কিঃমিঃ ২.০০০ হতে কিঃমিঃ ৫.১৬০ এর মধ্যেবর্তী স্থানে ১০০০ মিঃ বাঁধ মেরামত কাজ।	নওগাঁ/নওগাঁ সদর/চন্ডিপুর	১০০০.০০	৭৫.০০
৪	রক্তদহ-লোহাচুড়া বিল নিষ্কাশন স্কিম এর কিঃমিঃ ১০.০০০ হতে কিঃমিঃ ১১.০০০ এর মধ্যেবর্তী স্থানে ৪০০ মিঃ বাঁধ মেরামত কাজ।	নওগাঁ/রাণীনগর/কাশিমপুর	৪০০.০০	২৭.০০
৫	রক্তদহ-লোহাচুড়া বিল নিষ্কাশন স্কিম এর কিঃমিঃ ১৩.৫০০ হতে ১৪.০০০ এর মধ্যেবর্তী স্থানে ৪০০ মিঃ বাঁধ মেরামত কাজ।	নওগাঁ/রাণীনগর/গোনা	৪০০.০০	২৭.০০
৬	রক্তদহ-লোহাচুড়া বিল নিষ্কাশন স্কিম এর কিঃমিঃ ১৭.৭০০ হতে ১৮.২০০ এর মধ্যেবর্তী স্থানে ৪০০ মিঃ বাঁধ মেরামত কাজ।	নওগাঁ/আত্রাই/সাহাগোলা	৪০০.০০	২৪.০০
৭	রক্তদহ-লোহাচুড়া বিল নিষ্কাশন স্কিম এর কিঃমিঃ ১৮.৩০০ হতে ১৯.২০০ এর মধ্যেবর্তী স্থানে ৬০০ মিঃ বাঁধ মেরামত কাজ।	নওগাঁ/আত্রাই/সাহাগোলা	৬০০.০০	৩৬.০০
৮	রক্তদহ-লোহাচুড়া বিল নিষ্কাশন স্কিম এর কিঃমিঃ ১৯.৫০০ হতে ২০.৫০০ এর মধ্যেবর্তী স্থানে ৬০০ মিঃ বাঁধ মেরামত কাজ।	নওগাঁ/আত্রাই/ভোপাড়া	৬০০.০০	৩৭.০০
৯	রক্তদহ-লোহাচুড়া বিল নিষ্কাশন স্কিম এর কিঃমিঃ ২১.০০০ হতে ২১.৫০০ এর মধ্যেবর্তী স্থানে ৩০০ মিঃ বাঁধ মেরামত কাজ।	নওগাঁ/আত্রাই/ভোপাড়া	৩০০.০০	১৮.০০


ক্র. নং	প্রস্তাবিত দুর্বল বাঁধ মেরামত কাজ (চেইনেজ সহ)	কাজের অবস্থান (জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন)	প্রস্তাবিত মেরামত কাজের দৈর্ঘ্য (মিটারে)	সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১০	তুলসীগঙ্গা উপ-প্রকল্প এর কিঃমিঃ ২.০০০ হতে ৮.০০০ এর মধ্যবর্তী স্থানে ১৫০০.০০ মিঃ বাঁধ মেরামত কাজ।	নওগাঁ/বদলগাছী/নওগাঁ সদর	১৫০০.০০	৮০.০০
১১	চলনবিল প্রকল্প পোস্তার-সি এর অধীনে নুরুল্যাবাদ হতে হাটকাপাড়া নামক স্থানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এর কিঃমিঃ ১৩৪.০০ হতে কিঃমিঃ ১৪৭.০০ এর মধ্যবর্তী মোট ২৫০০.০০ মিটার দৈর্ঘ্যে বাঁধ পুনরাকৃতিরকরণ কাজ।	নওগাঁ/মান্দা/বিশ্বপুত্র	২৫০০.০০	২৪০.০০
১২	চলনবিল প্রকল্প পোস্তার-ডি এর কিঃমিঃ ৯৭.০০ হতে কিঃমিঃ ১১০.০০ এর মধ্যবর্তী বিভিন্ন স্থান।	নওগাঁ/মান্দা/ভারশো, তেতুলিয়া	৬০০০.০০	২৪০.০০
১৩	চলনবিল প্রকল্প পোস্তার-ডি এর কিঃমিঃ ০৭.০০ হতে কিঃমিঃ ২০.০০ এর মধ্যবর্তী বিভিন্ন স্থান।	নওগাঁ/মান্দা/কালিকাপুর, নুরুল্যাবাদ, কসব, বিশ্বপুত্র	৫০০০.০০	১৫০.০০
১৪	আত্রাই নদীর ডানতীর বাঁধ নির্মাণ উপ-প্রকল্প এর কিঃমিঃ ১৩.০০ হতে ২০.০০ এর মধ্যবর্তী বিভিন্ন স্থান।	নওগাঁ/পত্নীতলা/পত্নীতলা সদর, কৃষ্ণপুর	৪০০০.০০	১৬০.০০
১৫	আত্রাই নদীর ডানতীর বাঁধ নির্মাণ উপ-প্রকল্প এর বার্থের কিঃমিঃ ৪৫.০০ হতে কিঃমিঃ ৫১.৩০০ = ৬.৩০০ কিঃমিঃ বাধ পুনরাকৃতিরকরণ কাজ।	নওগাঁ/মান্দা	৬৩০০.০০	৫১৮.৫০
		সর্বমোট =	৩৪৪৭০.০০	১৮৬৯.০৪

পরিশেষে সভাপতি জানান যে, খাল ও নদী খনন কাজের সাথে বিভিন্ন সংস্থা জড়িত থাকায় খনন কাজে দ্বৈততা পরিহারের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিকট হতে অনাপত্তি পত্র গ্রহণ করা আবশ্যিক। তাছাড়া, মান্দা, আত্রাই ও রাণীনগর উপজেলায় যে সব বাঁধ নিচু আছে যেসব বাঁধ মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বিস্তারিত আলোচনার পর সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- নওগাঁ জেলার উপর দিয়ে ১২টি নদী প্রবাহিত হয়েছে [ছোট যমুনা নদী, আত্রাই নদী, শিব নদী, রাণী নদী, নাগর নদী, তুলসীগঙ্গা নদী, পূর্ণভবা নদী, চিরি নদী, গুরুস নদী, ইরামতী নদী, শিরমাখালী নদী ও শীবাড়াডানি নদী]। নিয়মিত ১২টি নদী পুনঃখনন করে নদীর প্রবাহ ঠিক রাখতে হবে।
- নওগাঁ জেলায় “নওগাঁ জেলার ধামইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেশপুর উপজেলাধীন ৩ টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পটি এ পর্যায় সমাপ্ত ঘোষণা করা হল। প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন দাখিলের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- নওগাঁ জেলার বন্যা প্রবণ স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে জরুরী ভিত্তিতে বাঁধ মেরামত ও নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষে, আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 (মোঃ গোলাম মওলা)
 জেলা প্রশাসক

ও

সভাপতি

‘জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি’।




স্মারক নং-৪২.০১.৬৪০০.৪০৫.১৪.০০৫.২৪-৩৩৩৫, তারিখঃ ৩০/০৬/২০২৪ খ্রি:।

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (পদমর্যাদা/জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে) :

১। মাননীয় সংসদ সদস্য, নওগাঁ-১/নওগাঁ-২/নওগাঁ-৩/নওগাঁ-৪/নওগাঁ-৫/নওগাঁ-৬, উপদেষ্টা, নওগাঁ জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি।

২। অতিরিক্ত মহাপটিলাক (পশ্চিম রিজিয়ন), বাপাউবো, পানি ভবন, ঢাকা।

৩। অতিরিক্ত মহাপটিলাক (পরিকল্পনা, নকশা ও গবেষণা), বাপাউবো, পানি ভবন, ঢাকা।

৪। প্রধান প্রকৌশলী, মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, পানি ভবন, ঢাকা।

৫। প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, রাজশাহী।

৬। প্রধান প্রকৌশলী, পরিকল্পনা এর দপ্তর, বাপাউবো, পানি ভবন, ঢাকা।

৭। জেলা প্রশাসক, নওগাঁ জেলা, নওগাঁ।

৮। পুলিশ সুপার, নওগাঁ জেলা, নওগাঁ।

৯। প্রকল্প পরিচালক, '৬৪টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় পুনঃখনন', বাপাউবো, ঢাকা।

১০। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী পওর সার্কেল, বাপাউবো, রাজশাহী।

১১। একান্ত সচিব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা। প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় দ্রষ্টব্যের জন্য।

১২। একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, সচিবালয় ঢাকা। সচিব মহোদয়ের সদয় দ্রষ্টব্যের জন্য।

১৩। সিএসও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, পানি ভবন, ঢাকা। মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় দ্রষ্টব্যের জন্য।

১৪। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), নওগাঁ জেলা, নওগাঁ।

১৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, নওগাঁ।

১৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, নওগাঁ।

১৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নওগাঁ।

১৮। নির্বাহী প্রকৌশলী (ক্ষুদ্র সেচ), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, নওগাঁ।

১৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রিজিয়ন-১/২, নওগাঁ।

২০। নির্বাহী প্রকৌশলী, জেলা পরিষদ, নওগাঁ।

২১। উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, নওগাঁ।


২২। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, নওগাঁ।

২৩। জেলা পরিবেশ কর্মকর্তা, নওগাঁ।

২৪। জেলা বন কর্মকর্তা, নওগাঁ।

২৫। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, নওগাঁ সদর/রানীনগর/আত্রাই/বদলগাছী/মহাদেবপুর/পত্নীতলা/ধামইরহাট/মহাদেবপুর/মান্দা/নিয়ামতপুর/সাপাহার/পোরশা, নওগাঁ।

২৬। উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, নওগাঁ পওর উপ-বিভাগ-১/২/৩, বাপাউবো, নওগাঁ।


(মোঃ ফারুকুর রহমান)
৩০/৬/২৪

নির্বাহী প্রকৌশলী

বাপাউবো, নওগাঁ

ও

সদস্য-সচিব

জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি।

- ৬৫ -



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

পরিচালকের কার্যালয়

অর্থ পরিদপ্তর

পানি ভবন (৯ম তলা), ফ্ল-এ, ৭২ ব্রীজরোড, ঢাকা।

Email: dir.finance@bwdb.gov.bd

www.bwdb.gov.bd



অর্থ বৎসর ২০২০-২০২১

মহুরী নং-৪৪

ক্রমিক নং-

স্মারক নং- পাউবো (অর্থ) উনাত/ ৭০৮

তারিখ: ০৬/০৬/২০২১ খ্রিঃ।

ব্যানহাণ্ডল,
সোনালী ব্যাংক লি.,
সোনালগাঁও হোটেল শাখা,
ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ব্যাংকে গচ্ছিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের "নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ত্রি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আতাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ শীর্ষক প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০) প্রকল্পের হিসাব নম্বর এসএনডিএস-০১২৩০০৩০০০০৫৫ হতে নিম্নবর্ণিত হিসাবে মোট: ২৮,৫০,০০০.০০ (আটাল লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মাত্র আতাই স্থানান্তর করা হইয়া অনুপ্রদান করা হলো।

অফিসের নাম	ব্যাংক শাখা	হিসাব নং	টাকার পরিমাণ
১। হিসাব রক্ষণ অফিসার: আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাংলাউবো, রাজশাহী।	আঞ্চলিক ব্যাংক লি., গুণাগুণা (ইরি) শাখা, সুপুর্না, রাজশাহী।	এসএনডি-০১২৩০০০০৪১০৬২৯১	টাক ২৮,৫০,০০০.০০

প্রকল্প- "নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ত্রি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আতাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০)।

ক) প্রকল্প বিলি (১ম ও ২য় কিউ) = ২৮,৫০,০০০.০০ (1211-F2000-224319200-00001)

৩১১১৩৩২-সম্মানী ভাতা	৫০,০০০.০০
৩২১১১০৯-অর্থিক মঞ্জুরি	-
৩২১১১২৫-বিজ্ঞাপন	-
৩২৪১১০১-ক্রয় ব্যয়	৫০,০০০.০০
৩২৪৩১০১-পেট্রোল ও নুত্রিকেল	৩,০০,০০০.০০
৩২৫৫১০২-স্থল ও বাধাই	৫০,০০০.০০
৩২৫৫১০৪-সিল ও স্ট্যান্ডার্ড	১,০০,০০০.০০
৩২৫৫১০৪-সার্ভে	২,৫০,০০০.০০
৩২৫৮১০১-মোটর	৩,৫০,০০০.০০
মোট আবর্তক ব্যয়:	১১,৫০,০০০.০০
৪১১১৩২১-প্রতিরক্ষা কাজ	-
৪১১১১০১-মোটরযান	৪,০০,০০০.০০
৪১১২২০২-কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (ল্যাপটপ)	৪,৫০,০০০.০০
৪১১২৩০৪-প্রকৌশল সরঞ্জাম (সিসিএস, লেজেল মেশিন)	৩,৫০,০০০.০০
৪১১২৩১০-অফিস সরঞ্জাম	১,৫০,০০০.০০
৪১১২৩১৪-আসনাবরণ	৪,০০,০০০.০০
মোট স্থলধার ব্যয়:	১৭,৫০,০০০.০০
সর্বমোট ব্যয়:	২৮,৫০,০০০.০০

বিলিকৃত অর্থ প্রদানের হতে জারীকৃত বিভাজনের সংশ্লিষ্ট কোড নম্বরযুক্ত প্রকল্প/খাত/উপখাত ব্যতিত অন্য কোন প্রকল্প/খাত/উপখাতে খরচ করা যাবে না। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যয়কারীকে PPA, PPR, আর্থিক কন্ট্রোল ও বিবি বিধানপত্র বোর্ড ও পাসম এর অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল বিধি-বিধান ও নিয়ন্ত্রণের অধীনস্থিত কর্তৃত্ব এ অর্থ ব্যয় করতে হবে।

(স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর)

অতিরিক্ত পরিচালক, অর্থ

বাংলাউবো, ঢাকা।

মোবাইল নং-০১৭২৬২০৬৬০৭

আপনার সিদ্ধান্ত

সর্বমোট: ২৮,৫০,০০০.০০
(আটাল লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)।

(স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর)

পরিচালক, অর্থ

বাংলাউবো, ঢাকা।

মোবাইল নং-০১৯৫৫৫২২২৯৯

চলমান পাতা-২/

স্বাক্ষর

২৫৭-

www.bwch.gov.bd

202

॥ २० ॥

১৯৪৭
 ১৯৪৮
 ১৯৪৯
 ১৯৫০

SECRET

[illegible]

কর্মসম্পন্ন সময়	কর্মসম্পন্ন স্থান	কর্মসম্পন্ন ব্যক্তি	কর্মসম্পন্ন পরিমাণ
১৯৭০-৭১	১. কলকাতা, ২. মুম্বাই, ৩. চেন্নাই, ৪. বোম্বে, ৫. কলকাতা, ৬. মুম্বাই, ৭. চেন্নাই, ৮. বোম্বে, ৯. কলকাতা, ১০. মুম্বাই, ১১. চেন্নাই, ১২. বোম্বে	১. কলকাতা, ২. মুম্বাই, ৩. চেন্নাই, ৪. বোম্বে, ৫. কলকাতা, ৬. মুম্বাই, ৭. চেন্নাই, ৮. বোম্বে, ৯. কলকাতা, ১০. মুম্বাই, ১১. চেন্নাই, ১২. বোম্বে	১. ১০,০০,০০০.০০, ২. ১০,০০,০০০.০০, ৩. ১০,০০,০০০.০০, ৪. ১০,০০,০০০.০০, ৫. ১০,০০,০০০.০০, ৬. ১০,০০,০০০.০০, ৭. ১০,০০,০০০.০০, ৮. ১০,০০,০০০.০০, ৯. ১০,০০,০০০.০০, ১০. ১০,০০,০০০.০০, ১১. ১০,০০,০০০.০০, ১২. ১০,০০,০০০.০০

[illegible]

07. 2018-19-2019-20-2020-21-2021-22-2022-23-2023-24-2024-25-2025-26-2026-27-2027-28-2028-29-2029-30-2030-31-2031-32-2032-33-2033-34-2034-35-2035-36-2036-37-2037-38-2038-39-2039-40-2040-41-2041-42-2042-43-2043-44-2044-45-2045-46-2046-47-2047-48-2048-49-2049-50-2050-51-2051-52-2052-53-2053-54-2054-55-2055-56-2056-57-2057-58-2058-59-2059-60-2060-61-2061-62-2062-63-2063-64-2064-65-2065-66-2066-67-2067-68-2068-69-2069-70-2070-71-2071-72-2072-73-2073-74-2074-75-2075-76-2076-77-2077-78-2078-79-2079-80-2080-81-2081-82-2082-83-2083-84-2084-85-2085-86-2086-87-2087-88-2088-89-2089-90-2090-91-2091-92-2092-93-2093-94-2094-95-2095-96-2096-97-2097-98-2098-99-2099-100-2100-101-2101-102-2102-103-2103-104-2104-105-2105-106-2106-107-2107-108-2108-109-2109-110-2110-111-2111-112-2112-113-2113-114-2114-115-2115-116-2116-117-2117-118-2118-119-2119-120-2120-121-2121-122-2122-123-2123-124-2124-125-2125-126-2126-127-2127-128-2128-129-2129-130-2130-131-2131-132-2132-133-2133-134-2134-135-2135-136-2136-137-2137-138-2138-139-2139-140-2140-141-2141-142-2142-143-2143-144-2144-145-2145-146-2146-147-2147-148-2148-149-2149-150-2150-151-2151-152-2152-153-2153-154-2154-155-2155-156-2156-157-2157-158-2158-159-2159-160-2160-161-2161-162-2162-163-2163-164-2164-165-2165-166-2166-167-2167-168-2168-169-2169-170-2170-171-2171-172-2172-173-2173-174-2174-175-2175-176-2176-177-2177-178-2178-179-2179-180-2180-181-2181-182-2182-183-2183-184-2184-185-2185-186-2186-187-2187-188-2188-189-2189-190-2190-191-2191-192-2192-193-2193-194-2194-195-2195-196-2196-197-2197-198-2198-199-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-27

[illegible][illegible]

~~SECRET~~ 2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

[illegible]

100

[illegible]

1990

Figure 1

12-00000

1980

THE

SECRET

1994



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

नविष्ठागृह्यकार्याग्नय

ଅର୍ଥ ପରିଦତ୍ତ

পানি উন্নয়ন (৯ম উদ্ভা), ব্লক-এ, ৭২ খাঁজব্রাড, ঢাকা।

Email: dir.finance@bwdb.gov.bd

www.bwdb.gov.bd



वर्ष २०२१-२०२२

पृथ्वी नं.-४४

अधिक नर-२

पत्रक नं- पाठवे (अर्थ) उवाच/ १०७

তারিখ : ২৩/০৯/২০২১ খ্রি।

ব্যবহাৰক,
সোনালী ব্যাংক লি.,
সোনারগাঁও হোটেল শাখা,
ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ব্যাংকে গচ্ছিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নবগাঁ জেলার বামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের গুনগামান এবং অতীত নদীর ড্রেজিংসহ জীর সংরক্ষণ কার্যক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০) প্রকল্পের বিগান নম্বর এমএনজিএস-০১২৩০০৩০০০০৫৫ হতে নিম্নবর্ণিত হিসাবে মোট: ১০,০০,০০,০০০.০০ (দশ কোটি) টাকা মাত্র অদাই হানাহস্ত করার জন্য অনুরোধ করা হল।

	অফিসের নাম	ব্যাংক শাখা	হিসাব নং	টাকার পরিমাণ
১।	হিসাব বন্ধন অফিসার, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাপাউবো, রাজশাহী।	অন্যদী ব্যাংক লিম. ওয়াশা (ইটি) শাখা, সপ্তদা, রাজশাহী।	এনএনডি-০২০০০০৪১০৬২৯১	টাক ১০,০০,০০,০০০.০০

প্রকর :- "নওগাঁ জেলায় খামুইরথট, গঙ্গীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলায় ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং
 ডাঙাই নদীর ডেল্টা অংশে ৩টি সার্কুলার খাঁড় (প্রকল্প কোড নং-১২৪৩১৯২০০)।

ग) एकत्र निधि (१५ दिनि) = १०,००,००,०००.०० (1211-F2000-224319200-00001)

৩১১৩৩২-সামানী ডাভা	
৩২১১০৮-প্রায়িক যন্ত্রি	১,৫০,০০০.০০
৩২১১২৫-বিদ্যাপন	
৩২৪১১০১-ইয়ুগ ব্যাং	
৩২৪৩১০১-মোট্রল ও নুরিলেট	৫০,০০০.০০
৩২৫৪১০২-মুদ্রণ ও কাগজ	৫০,০০০.০০
৩২৫৫১০৪-পিন ও বিন্দালস	১,০০,০০০.০০
৩২৫৭১০৪-সার্ভে	১,০০,০০০.০০
৩২৫৮১০১-মোট্রর	১,০০,০০০.০০
	মোট আবর্তক ব্যয়:
৩২৫৮১১৪-হেরলেটর মেগারড	৫,৫০,০০০.০০
৪১১১৩১০-নদী ভেঁটিং	
৪১১১৩১০-বনন/খাদ পুনঃবনন	৩,০০,০০,০০০.০০
৪১১১৩২১-প্রতিরক্ষা কাজ	২০,০০,০০০.০০
৪১১১৩২১-বাধ পুনঃপ্রতিকরণ	২,৯৪,৫০,০০০.০০
৪১১১৩২২-বৃক্ষ, শস্য ও উদ্ভিদ সম্পদ উৎপাদনকারী আবর্তক পদ্ধতি	৪,০০,০০,০০০.০০
	মোট আর্থিক ব্যয়:
	১০,০০,০০,০০০.০০

বিলকৃত অর্থ মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত বিভাজনের শ্রেণিষ্ট কোড নকশায়ুক্ত প্রকল্প/খাত/
উপখাত ব্যতিত অন্য কোন প্রকল্প/খাত/উপখাতে খরচ করা যাবে না। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে
ব্যয়সীমিত PPA, PPR আর্থিক ক্ষমতা ও বিধি বিধানসহ বোর্ড ও শাসন এয়র অন্যান্য
প্রয়োজনীয় সকল বিধি-বিধান ও নিয়মাবলি প্রতিপালন করতঃ এ অর্থ ব্যয় করতে হবে।

আপনার বিশ্বাস,

(নেত্রী একরামুল কবির)
আজি পরিচালক, অর্থ
সাপাইবো, ঢাকা।
মোবাইল নং-০১৭২৬২০৬৬০৭

সর্বমোটঃ ১০,০০.০০,২০০.০০
(দশ কোটি টাকা মাত্র)।

(যোঃ কবির আহমদ)
পরিচালক, অর্থ
সাপাইকো, ঢাকা।
মোবাইল নং-০১৯৫৫৫২২৯৯

চলমান প্রাপ্ত-২/

বাংলাদেশ গানি উন্নয়ন বোর্ড

भारतवासी दार्शनिक
पर्व भविष्य

Email: dir.finance@bwdb.gov.bd

www.bvdb.gov.bd



वर्ष २०२१-२०२२

पृष्ठ नं-४३

अधिक नं- 282

স্মারক নং-পাউবো (অর্থ) উবাড/৬৮০

ব্যবহৃত,
সোনালী ব্যাক নিঃ,
সোনারগাঁও হোটেল দাখা,
ঢাকা।

তারিখ: ২৬/১১/২০২১ খ্রি।

क्षिप्रं प्रवृत्तम्,

[illegible]

अस्मिन्नाय -

कारण गाथा

विश्वं नर

টালার পরিচয়

১। হিয়াব বকুল প্রমিটার, জয়ধী বাহক সি, এসএনটি-০২০০০০০০০২১১ টক ৯,৯৭,০০,০০০.০০
আঞ্চলিক হিয়াব কেন্দ্র, গুয়াপদা (ইডি) দাখা,
বাংলাউবা, বাঙ্গালী। সপ্তাঃ বাঙ্গালী।

প্রকল্প ১- "নগরী জেলায় ধানুইরহাট, গদািতসা ও মহেন্দ্রনগর উপজেলায় ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাণন এবং জখাই নদীর ড্রেজিংর আর সংরক্ষণ নীর্বাণ (একক কোড নং-২২৪৩১২০০)।

७) अक्षय विमि (२४ सिद्धि) = ०,०१,००,०००.०० (1211-F3000-224319200-00001)

0311002- अन्नगो-छात्र	₹ 0,000.00
0311003- वारिक बख्ति	
0311004- विद्यालय	
0311005- वसुधाय	₹ 1,00,000.00
0311006- वनखोल व मृत्तिका	₹ 1,00,000.00
0311007- वृत्त व बांधवे	
0311008- विद्या व न्याय	
0311009- विद्या	
0311010- विद्या	
0311011- विद्यालय	
0311012- विद्यालय	
0311013- विद्यालय	
0311014- विद्यालय	
0311015- विद्यालय	
0311016- विद्यालय	
0311017- विद्यालय	
0311018- विद्यालय	
0311019- विद्यालय	
0311020- विद्यालय	
0311021- विद्यालय	
0311022- विद्यालय	
0311023- विद्यालय	
0311024- विद्यालय	
0311025- विद्यालय	
0311026- विद्यालय	
0311027- विद्यालय	
0311028- विद्यालय	
0311029- विद्यालय	
0311030- विद्यालय	
0311031- विद्यालय	
0311032- विद्यालय	
0311033- विद्यालय	
0311034- विद्यालय	
0311035- विद्यालय	
0311036- विद्यालय	
0311037- विद्यालय	
0311038- विद्यालय	
0311039- विद्यालय	
0311040- विद्यालय	
0311041- विद्यालय	
0311042- विद्यालय	
0311043- विद्यालय	
0311044- विद्यालय	
0311045- विद्यालय	
0311046- विद्यालय	
0311047- विद्यालय	
0311048- विद्यालय	
0311049- विद्यालय	
0311050- विद्यालय	
0311051- विद्यालय	
0311052- विद्यालय	
0311053- विद्यालय	
0311054- विद्यालय	
0311055- विद्यालय	
0311056- विद्यालय	
0311057- विद्यालय	
0311058- विद्यालय	
0311059- विद्यालय	
0311060- विद्यालय	
0311061- विद्यालय	
0311062- विद्यालय	
0311063- विद्यालय	
0311064- विद्यालय	
0311065- विद्यालय	
0311066- विद्यालय	
0311067- विद्यालय	
0311068- विद्यालय	
0311069- विद्यालय	
0311070- विद्यालय	
0311071- विद्यालय	
0311072- विद्यालय	
0311073- विद्यालय	
0311074- विद्यालय	
0311075- विद्यालय	
0311076- विद्यालय	
0311077- विद्यालय	
0311078- विद्यालय	
0311079- विद्यालय	
0311080- विद्यालय	
0311081- विद्यालय	
0311082- विद्यालय	
0311083- विद्यालय	
0311084- विद्यालय	
0311085- विद्यालय	
0311086- विद्यालय	
0311087- विद्यालय	
0311088- विद्यालय	
0311089- विद्यालय	
0311090- विद्यालय	
0311091- विद्यालय	
0311092- विद्यालय	
0311093- विद्यालय	
0311094- विद्यालय	
0311095- विद्यालय	
0311096- विद्यालय	
0311097- विद्यालय	
0311098- विद्यालय	
0311099- विद्यालय	
0311100- विद्यालय	

[illegible]

ଆମନାର ବିହୀନ

(ସୋ. ଦ୍ଵିତୀୟାୟନ କବିତା)

ଦାଢ଼ିଆ ପ୍ରମିତାମୟ, ଭବ୍ୟ

ব্যাঙভিষ্য, ঢাকা।

दयावार्डिंग नं-०११२७२०७७०१

নবমোক্ত্য ৪,৯৭,০০,০০০ টকা

(নয় কোটি সাতানব্বই লক্ষ টাকা মাত্র)।

(স্বল্প ব্যক্তি প্রায়শ্চিন্ত)

मंत्रिगणप, अर्थ

বাগাউকে, ঢাক।

सोपारिन नं-०१७६२६२२७७

ଆହୁର ନାମ:- ୨/



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

পরিচালকের কার্যালয়

অর্থ পরিদপ্তর

পানি ভবন (৯ম তলা), ব্লক-এ, ৭২ গ্রীণরোড, ঢাকা।

Email: dir.finance@bwdb.gov.bd



অর্থ বছর ২০২১-২০২২

মহুদী নং-৪৪

ক্রমিক নং- ৬০৭

www.bwdb.gov.bd

স্মারক নং- পাউবো (অর্থ) উবাত/ ৫৪৩

তারিখ: ২৬/০৩/২০২২ খ্রি।

ব্যবস্থাপক,
সোনালী ব্যাংক লি.,
সোনালগাঁও মেটেল শাখা,
ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ব্যাংকে গচ্ছিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের "নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাবেনদপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আম্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০) প্রকল্পের হিসাব নকর এসএনডিএস-০১২০০০০০০০০৫৫ হতে নিম্নবর্ণিত হিসাবে মোট: ১০,০০,০০,০০০.০০ (দশ কোটি) টাকা মাত্র অদমাই স্থানান্তর করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অফিসের নাম	ব্যাংক শাখা	হিসাব নং	টাকার পরিমাণ
১। হিসাব রক্ষণ অফিসার, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাগাউবো, রাজশাহী।	অমণী ব্যাংক লি., গুয়াপদা (ইরি) শাখা, সপুরা, রাজশাহী।	এসএনডি-০২০০০০৪১০৬২৯১	টঃ ১০,০০,০০,০০০.০০

প্রকল্প :- "নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাবেনদপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আম্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০)।

ক) প্রকল্প বিলি (৩য় কিস্তি) = ১০,০০,০০,০০০.০০ (1211-F2000-224319200-00001)

০১১৩৩২- সম্মানী ভাতা	২,০০,০০০.০০
০২১১০৯- মাসিক মজুরি	-
০২১১২৫- বিজ্ঞাপন	১,০০,০০০.০০
০২৪১০১- ভ্রমণ ব্যয়	১,০০,০০০.০০
০২৪৩১০১- পেট্রোল ও মটরসেই	১,৫০,০০০.০০
০২৫৫১০২- খুদ্র ও বাঁধাই	-
০২৫৫১০৪- সিল ও স্ট্যাম্পস	-
০২৫৭১০৪- সার্ভে	-
০২৫৮১০১- মোটর	-
মোট প্রাপ্যকৃত ব্যয়:	৫,৫০,০০০.০০
০২৫৮১১৪- রেজিস্টার মেরামত	৪০,০০,০০০.০০
৪১১৩১০- নদী ড্রেজিং	৩,৫০,০০,০০০.০০
৪১১৩১০- খনন/খাল পুনঃখনন	১০,০০,০০০.০০
৪১১৩২১- প্রতিরক্ষা কাজ	৫,৫৪,৫০,০০০.০০
৪১১৩২১- বাধ পুনরাকৃতিকরণ	৪০,০০,০০০.০০
৪১১৩১০২- বুক, শস্য ও উদ্ভিদ সম্পদ উৎপাদনকারী আবর্তক পদ্য	-
মোট মূলধন ব্যয়:	৯,৯৪,৫০,০০০.০০
সর্বমোট ব্যয়:	১০,০০,০০,০০০.০০

বিলিকৃত অর্থ মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত বিভাজনের সংশ্লিষ্ট কোড নম্বরযুক্ত প্রকল্প/খাত / উপখাত ব্যতিত অন্য কোন প্রকল্প/ খাত/ উপখাতে খরচ করা যাবে না। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যয়কারীকে PPA,PPR আর্থিক কন্ট্রোল ও বিধি বিধানসহ বোর্ড ও পাসম এর অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল বিধি-বিধান ও নির্দেশনা প্রতিপালন করতঃ এ অর্থ ব্যয় করতে হবে।

আপনার বিশ্বস্ত,

(মোঃ একরামুল কবির)

অতিরিক্ত পরিচালক, অর্থ

বাগাউবো, ঢাকা।

মোবাইল নং-০১৭২৬২০৬৬০৭

সর্বমোট: ১০,০০,০০,০০০.০০

(দশ কোটি টাকা মাত্র)

(মোঃ কবির আহাম্মদ)

পরিচালক, অর্থ

বাগাউবো, ঢাকা।

মোবাইল নং-০১৯৫৫৫২২২৯৯

চলমান পাতা-২/



www.bwdb.gov.bd

বাংলাদেশ ফাইন্যান্স বোর্ড
পরিচালকের কার্যালয়
অর্থ পরিচালনা
পানি উন্নয়ন (৯ম তলা), ব্লক-এ, ৭২ জিএমও, ঢাকা।
Email: dir.finance@bwdb.gov.bd



অর্থ বঙ্গবন্ধু ২০২১-২০২২
মজুরী নং-৪৪
ক্রমিক নং-৪২৭

স্মারক নং- পাউবো (অর্থ) উবাত/ ২০২০
ব্যবস্থাপক,
সোনালী ব্যাংক লি.,
সোনামারগাঁও ঘোড়েশ শাখা,
ঢাকা।

তারিখ: ২৭/০৬/২০২২ খ্রি।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ব্যাংকে গচ্ছিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের "নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্মাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০) প্রকল্পের হিসাব নথর এসএমডি-০১২৩০০৩০০০০৫৫ হতে নিম্নবর্ণিত হিসাবে মোট: ১০,০৩,০০,০০০.০০ (দশ কোটি ডিম লক্ষ) টাকা মাত্র অদায়ে হুমাস্তর করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অফিসের নাম	ব্যাংক শাখা	হিসাব নং	টাকার পরিমাণ
১। হিসাব রক্ষন অফিসার, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাগাউবো, রাজশাহী।	৩৩৭৭ী ব্যাংক শিঃ, ওয়াপদা (ধরি) শাখা, গপুরা, রাজশাহী।	এসএমডি-০২০০০০৪১০৬২৯১	টাক ১০,০৩,০০,০০০.০০

প্রকল্প :- "নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্মাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০)।

৩। প্রকল্প বিলি (২য় কিস্তির অশিষ্টাংশসহ ৪র্থ কিস্তি) = ১০,০৩,০০,০০০.০০ (1211-F2000-224319200-00001)

৩১১১৩৩২-স্বাক্ষরী ভাতা	৭,০০,০০০.০০
৩২১১১২৫-বিজ্ঞাপন	-
৩২৪১১০১-প্রমদ ব্যয়	-
৩২৪৩১০১-শেডুল ও নুত্রিক্ট	-
৩২৫৫১০২-মুদ্রণ ও বাঁধাই	-
৩২৫৫১০৪-সিল ও স্ট্যাম্পস	-
৩২৫৭১০৪-সার্ভে	১,০০,০০০.০০
৩২৫৮১০১-মোটর	৫০,০০০.০০
মোট আবর্তক ব্যয়:	৮,৫০,০০০.০০
৩২৫৮১১৪-রেগুলেটর মেরামত	১৫,০০,০০০.০০
৪১১১৩১০-নদী ড্রেজিং	৪,৫০,০০,০০০.০০
৪১১১৩১০-খনন/খাল পুনঃখনন	-
৪১১১৩২১-প্রতিরক্ষা কাজ	৫,২৯,৫০,০০০.০০
৪১১১৩২১-বাধ পুনরাকৃতিকরণ	-
মোট মুদ্রণ ব্যয়:	৯,৯৪,৫০,০০০.০০
সর্বমোট ব্যয়:	১০,০৩,০০,০০০.০০

বিলিকৃত অর্থ মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত বিভাজনের সংশ্লিষ্ট কোড নথরযুক্ত প্রকল্প/খাত/উপখাত ব্যতিত অন্য কোন প্রকল্প/খাত/উপখাতে খরচ করা যাবে না। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যয়কারীকে PPA, PPR আর্থিক ক্ষমতা ও সিপি বিধানসহ বোর্ড ও পাসম এর অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল বিধি-বিধান ও নিয়মচক্র প্রতিপালন করতঃ এ অর্থ ব্যয় করতে হবে।

মাথ্য।

(মোঃ একরামুল কবির)
অতিরিক্ত পরিচালক, অর্থ
বাগাউবো, ঢাকা।
মোবাইল নং-০১৭২৬২০৬৬০৭

আপনার বিশ্বস্ত,

পূর্ণেন্দু মন্ডল

সর্বমোট: ১০,০৩,০০,০০০.০০
(দশ কোটি ডিম লক্ষ টাকা)

(মোঃ কবির আহমদ)
পরিচালক, অর্থ
বাগাউবো, ঢাকা।
মোবাইল নং-০১৭৫৫৫২২২৯৯

চলমান পাতা-২/

- 98 -

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৩৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০৫০.২১-৩২৭

তারিখ: ১৫ আষাঢ় ১৪২৯
২৯ মে ২০২২

প্রেরক: মোহাম্মদ মোবাসশেরুল ইসলাম
উপসচিব

প্রাপক: চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২য় ১২তলা ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয়: ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত 'নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পরীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ (২২৪৩১৯২০০)' শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের বিতরণ আদেশ জারি প্রসঙ্গে।

আদিষ্ট হয়ে বর্তমান ২০২১-২২ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটের মঞ্জুরী নং-৪৪, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কোড নং-১৪৭, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কোড নং-১৪৭০১ এবং প্রকল্প কোড নং ২২৪৩১৯২০০ এর অধীনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের 'নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পরীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ (২২৪৩১৯২০০)' শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দকৃত ৪০০০.০০ (চব্বিশ কোটি) লক্ষ টাকার নিম্নোক্ত বিভাজনের সরকারি অনুমোদন আশন করছি।

(লক্ষ টাকায়)

ক্র.সং.	বিবরণ	ক) আনুমানিক ব্যয়:	উন্নয়ন	সংরক্ষণ	অন্যান্য	মোট
৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা	১১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১.০০
৩২১১১২৫	বিস্মাণন	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১.০০
৩২৪১১০১	ভ্রমণ ব্যয়	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২.০০
৩২৪৩১০১	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩.০০
৩২৫১১০২	মুদ্রণ ও বীখাই	০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৫০
৩২৫১১০৪	সিল ও স্ট্যাম্পস	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১.০০
৩২৫১১০৪	সার্ভে	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২.০০
৩২৫১১০১	মোট	১.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	১.৫০
মোট রাজস্ব ব্যয়:		২২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২২.০০
(খ) মূলধন ব্যয়:						
৩২৫৮১১৪	রেগুলেটর মেরামত	৫৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫৫.০০
৪১১১৩১০	নদী ড্রেজিং	১৪৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৪৫০.০০
	খনন/খাল পুনঃখনন	৫৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫৫.০০
৪১১১৩২১	প্রতিরক্ষা কাজ	২৩৬৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৩৬৮.০০
	বীধ পুনরাকৃতিকরণ	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫০.০০
মোট মূলধন ব্যয়:		৩৯৭৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৯৭৮.০০
সর্বমোট ব্যয়:		৪০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৪০০০.০০

তবে শর্ত থাকে যে,

- ১। বর্ণিত খাত ব্যতীত অন্য কোন খাতে এ অর্থ ব্যয় করা যাবে না;
- ২। অনুমোদিত প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অনুমোদিত ব্যয়ের মধ্যে সীমিত থেকে বিভাজিত অর্থ ব্যয় করতে হবে।

(মোহাম্মদ মোবাসশেরুল ইসলাম)
উপসচিব

ফোন: ২২৩৩৫৭২৩৪

ইমেইল: plan3.mowr@gmail.com

- ১। সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ.আ. উপসচিব, বাজেট অধিশাখা-১১)।
- ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি ভবন (লেভেল-৫, ব্লক-এ), ৭২, গ্রিন রোড, ঢাকা-১২১৫।
- ৩। পরিচালক, অর্থ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি ভবন (৯ম তলা, ব্লক-এ), ৭২, গ্রিন রোড, ঢাকা-১২১৫।
- ৪। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৫। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। মাস্টার নথি/ সংশ্লিষ্ট নথি।



www.bwdb.gov.bd

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
পরিচালকের কার্যালয়
অর্থ পরিদপ্তর
ওয়ার্ডা গারন (৮ম তলা), মতিঝিল, বা/এ, ঢাকা
ফোন : ৯৫৫১৫৪৭, ৯৫১২৭৬৭
Email: dir.finance@bwdb.gov.bd



অর্থ বর্ষ ২০২২-২০২৩
মুদ্রা নং-৪৪

স্মারক নং- পাউবো (অর্থ) উবাত/১১২৮

তারিখ :- ২৬/০৬/২০২৩ খ্রিঃ

হিসাব রক্ষণ অফিসার,
আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র,
বাণাউবো, রাজশাহী।

বিষয়ঃ- "নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলায়ীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্মাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০) প্রকল্পের বিপরীতে ১ম হতে ৪র্থ কিছিতে স্থানান্তরিত তহবিলের অর্থনৈতিক কোডভিত্তিক সংশোধন প্রসঙ্গে।

- সূত্রঃ- (১) একক পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী, নওগাঁ পওর বিভাগ, বাণাউবো, নওগাঁ এর স্মারক নং-২৯২৮; তারিখঃ-২৬-০৬-২০২৩ খ্রিঃ।
(২) পাসম স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০৫০.২১-৩৬০; তারিখঃ- ০২-০৫-২০২৩ খ্রিঃ (সংশোধিত বিভাজন);
(৩) তহবিল স্থানান্তরাদেশ নং- পাউবো (অর্থ) উবাত/৯২; তারিখঃ-১১-০৯-২০২২ খ্রিঃ।
(৪) তহবিল স্থানান্তরাদেশ নং- পাউবো (অর্থ) উবাত/২৩৫; তারিখঃ-১০-১১-২০২২ খ্রিঃ।
(৫) তহবিল স্থানান্তরাদেশ নং- পাউবো (অর্থ) উবাত/৪৪৪; তারিখঃ-২২-০২-২০২৩ খ্রিঃ।
(৬) তহবিল স্থানান্তরাদেশ নং- পাউবো (অর্থ) উবাত/৬৩৯; তারিখঃ-২৪-০৪-২০২৩ খ্রিঃ।
(৭) তহবিল স্থানান্তরাদেশ নং- পাউবো (অর্থ) উবাত/৯৪০; তারিখঃ-২৪-০৬-২০২৩ খ্রিঃ।

বিষয়োক্ত প্রকল্পের অনুকূলে সূত্রোক্ত ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ নং স্মারক মূলে যথাক্রমে ১ম হতে ৪র্থ কিছিতে স্থানান্তরিত তহবিল পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত আরএডিপি'র বরাদ্দের সংশোধিত বিভাজন আদেশ এবং প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী, নওগাঁ পওর বিভাগ, বাণাউবো, নওগাঁ এর সূত্রোক্ত ০১ নং স্মারকের আলোকে নিম্নবর্ণিত ভাবে অর্থনৈতিক কোড অনুযায়ী সংশোধিত বিলি হিসাবে হিসাবভুক্ত করে প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অর্থনৈতিক কোড	১ম হতে ৪র্থ কিছিতে বিনিক্ত
৩২১১১০৯-প্রমিত মজুরি (সরকারী কর্মচারী ব্যতীত)	
৩২৪৩১০১-পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৩১,০০০.০০
মোট আবর্তক ব্যয়:	৩১,০০০.০০
৩২৫৮১১৪-রেজুলেটর মেরামত	৪৬,০০০.০০
৪১১১৩১০-নদী ড্রেজিং	২১,৬০,৫৪,০০০.০০
৪১১১৩১০-বনন/খাল পুনঃবনন	২,৫৭,০০০.০০
৪১১১৩২১-প্রতিরক্ষা কাজ	৩২,১২,২৮,০০০.০০
৪১১১৩২১-বাধ পুনরাকৃতিকরণ	৬,২৩,১৫,০০০.০০
৪১১৩১০২-বৃক্ষ, শস্য ও উদ্ভিদ সম্পদ উৎপাদনকারী আবর্তক পন্য	
মোট মূলধন ব্যয়:	৫৯,৯৯,০০,০০০.০০
সর্বমোট ব্যয়:	৫৯,৯৯,৩১,০০০.০০

বিলিকৃত অর্থ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত বিভাজনের সংশ্লিষ্ট অর্থ কোড অনুযায়ী ডিপি'র ব্যত উপর্যুক্ত ব্যতিকে অন্য কোন ব্যত / উপব্যত্রে বরচ করা যাবে না। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যয়কারীকে PPA, PPR আর্থিক ক্ষমতা ও বিধি বিধানসমূহ বোর্ড ও পাসম এর অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল বিধি-বিধান ও নিয়মচার প্রতিপালন করতঃ এ অর্থ ব্যয় করতঃ হবে।

(স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর)
পরিচালক, অর্থ, অর্থনৈতিক নথি
বাণাউবো, ঢাকা



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

পরিচালকের কার্যালয়

অর্থ পরিদপ্তর

পানি ভবন (৯ম তলা), ব্লক-এ, ৭২ গ্রীণরোড, ঢাকা।

Email: dir.finance@bwdb.gov.bd



অর্থ বৎসর ২০২২-২০২৩

মহুরী নং-৪৪

ক্রমিক নং-২৬

www.bwdb.gov.bd

স্মারক নং- পাউবো (অর্থ) উবাত/১১২

তারিখঃ ২২/০৯/২০২২ খ্রিঃ।

বাবস্থাপক,
সোনালী ব্যাংক লি.,
সোনারগাঁও হোটেল শাখা,
ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ব্যাংকে গচ্ছিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের "নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্মাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০) প্রকল্পের হিসাব নথর এসএনডিএস-০১২৩০০৩০০০০৫৫ হতে নিম্নবর্ণিত হিসাবে মোটঃ ১২,১৫,৯৩,৭০০.০০ (বার কোটি পনের লক্ষ তিরানকই হাজার সাতশত) টাকা মাত্র অদ্যই স্থানান্তর করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অফিসের নাম	ব্যাংক শাখা	হিসাব নং	টাকার পরিমাণ
১। হিসাব রক্ষন অফিসার, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাণাউবো, রাজশাহী।	আঞ্চলিক ব্যাংক লি., ওয়াপদা (ইরি) শাখা, সপুন্না, রাজশাহী।	এসএনডি-০২০০০০৪১০৬২৯১	টঃ ১২,১৫,৯৩,৭০০.০০

প্রকল্পঃ- "নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্মাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০)।

ক) প্রকল্প বিলি (১ম কিস্তি) = ১২,১৫,৯৩,৭০০.০০ (1211-F2000-224319200-00001)

৩২৪১১০১-জমিন ব্যয়	-
৩২৪৩১০১-পেট্রোল ও নুত্রিকেন্ট	-
৩২৫৫১০২-মুদ্রণ ও বাধাই	-
৩২৫৫১০৪-সিল ও স্ট্যাম্পস	-
৩২৫৭১০৪-সার্ভে	-
৩২৫৮১০১-মোটর	-
মোট আবর্তক ব্যয়ঃ	-
৩২৫৮১১৪-রেজল্টের মেরামত	৪৬,২৬০.০০
৪১১১৩১০-নদী ডেজিং	৩,৭৫,৪৭,৪৪০.০০
৪১১১৩২১-প্রতিরক্ষা কাজ	৮,০০,০০,০০০.০০
৪১১১৩২১-বাধ পুনরাকৃতিকরণ	৪০,০০,০০০.০০
৪১১৩১০২-বৃক্ষ, শস্য ও উদ্ভিদ সম্পদ উৎপাদনকারী আবর্তক পন্য	-
মোট মূলধন ব্যয়ঃ	১২,১৫,৯৩,৭০০.০০
সর্বমোট ব্যয়ঃ	১২,১৫,৯৩,৭০০.০০

বিলিকৃত অর্থ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে জরীকৃত কিজাজনের সংশ্লিষ্ট অর্থ কোড অনুযায়ী তিনিশির খাত / উপখাত ব্যতিত অন্য কোন খাত/ উপখাতে খরচ করা যাবেনা। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যয়কারীকে PPA,PPR আর্থিক ক্ষমতা ও বিধি বিধানসহ বোর্ড ও পাসম এর অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল বিধি-বিধান ও নিয়মাদার প্রতিপালন করতঃ এ অর্থ ব্যয় করতে হবে।

(মোঃ একরামুল কবির)
অতিঃ পরিচালক, অর্থ
বাণাউবো, ঢাকা।
মোবাইল নং-০১৭২৬২০৬৬০৭

আপনার বিশ্বস্ত,

(স্বাক্ষর)

সর্বমোটঃ ১২,১৫,৯৩,৭০০.০০

(বার কোটি পনের লক্ষ তিরানকই হাজার সাতশত টাকা মাত্র)।

(মোঃ কবির আহমদ)

পরিচালক, অর্থ

বাণাউবো, ঢাকা।

মোবাইল নং-০১৯৫৫৫২২২৯৯

চলমান পাতা-২/

২য় কিস্তি



www.bwdb.gov.bd

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

পরিচালকের কার্যালয়
অর্থ পরিদপ্তর

পানি ভবন (৯ম তলা), ব্লক-এ, ৭২ ব্রিগেড, ঢাকা।

Email: dir.finance@bwdb.gov.bd



অর্থ বছর ২০২২-২০২৩

মহুরী নং-৪৪

ক্রমিক নং- ৭৬

স্মারক নং- পাউবো (অর্থ) উবাত/ ২৬৬

তারিখ: ২০/১১/২০২২ খ্রিঃ।

ব্যবস্থাপক,
সোনালী ব্যাংক লিঃ,
সোনারগাঁও হোটেল শাখা,
ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ব্যাংকে গচ্ছিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের "নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০) প্রকল্পের হিসাব নম্বর এসএনডিএস-০১২৩০০৩০০০০৫৫ হতে নিম্নবর্ণিত হিসাবে মোট: ১২,১৪,৩০,৩০০.০০ (বার কোটি চৌদ্দ লক্ষ ত্রিশ হাজার তিনশত) টাকা মাত্র অদ্যই স্থানান্তর করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অফিসের নাম	ব্যাংক শাখা	হিসাব নং	টাকার পরিমাণ
১। হিসাব রক্ষন অফিসার, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাগাউবো, রাজশাহী।	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, ওয়াপদা (ইরি) শাখা, সগুরা, রাজশাহী।	এসএনডি-০২০০০০৪১০৬২৯১	টঃ ১২,১৪,৩০,৩০০.০০

প্রকল্প ২- "নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০)।

ক) প্রকল্প বিলি (২য় কিস্তি) = ১২,১৪,৩০,৩০০.০০ (1211-F2000-224319200-00001)

৩২৪১১০১-অমন ব্যয়	
৩২৪৩১০১-পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	৩১,০০০.০০
৩২৫৫১০২-মুদ্রণ ও বাঁধাই	-
৩২৫৫১০৪-সিল ও স্ট্যাম্পস	-
৩২৫৭১০৪-সার্ভে	-
৩২৫৮১০১-মোটর	-
মোট আবর্তক ব্যয়:	৩১,০০০.০০
৩২৫৮১১৪-রেগুলেটর মেরামত	-
৪১১১৩১০-নদী ড্রেজিং	৩,৫০,০০,০০০.০০
৪১১১৩২১-প্রতিরক্ষা কাজ	৬,৬৩,৯৯,৩০০.০০
৪১১১৩২১-বাঁধ পুনরাকৃতিরকরণ	২,০০,০০,০০০.০০
৪১১৩১০২-বৃক্ষ, শস্য ও উদ্ভিজ্জ সম্পদ উৎপাদনকারী আবর্তক পন্য	-
মোট মূলধন ব্যয়:	১২,১৩,৯৯,৩০০.০০
সর্বমোট ব্যয়:	১২,১৪,৩০,৩০০.০০

বিলিকৃত অর্থ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত বিভাজনের সংশ্লিষ্ট অর্থ কোড অনুযায়ী ডিপিপি'র খাত / উপখাত ব্যতিত অন্য কোন খাত/ উপখাতে খরচ করা যাবেনা। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যয়কারীকে PPA,PPR আর্থিক ক্রমতা ও বিধি বিধানসহ বোর্ড ও পাসম এর অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল বিধি-বিধান ও নিয়মাত্মক প্রতিপালন করতঃ এ অর্থ ব্যয় করতে হবে।

সর্বমোটঃ ১২,১৪,৩০,৩০০.০০

(বার কোটি চৌদ্দ লক্ষ ত্রিশ হাজার তিনশত টাকা মাত্র)।

আপনার বিশ্বস্ত,
(ফরিদ আহমেদ খান)
উপ-পরিচালক, অর্থ (উবাত)
বাগাউবো, ঢাকা।

(মোঃ একরামুল কবির)
পরিচালক, অর্থ (অঃ দাঃ)
বাগাউবো, ঢাকা।

চলমান পাতা-২/

- ৭৫ -



www.bwdb.gov.bd

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

পরিচালকের কার্যালয়
অর্থ পরিচালক

পানি ভবন (১ম তলা), রক এ, ৭২ জিএলএফ, ঢাকা।

Email: dir.finance@bwdb.gov.bd



মুজিব
মহাস্থান

অর্থ বছর ২০২১-২০২৩

মাস্তুলী নং ১১৮

ক্রমিক নং ১৮৭

৩য় কিস্তি

স্মারক নং: পাউবো (অর্থ) উসাত/৪৪৪

তারিখ ১১/০৩/২০২৩ খ্রিঃ।

বাবস্থাপক

সোনালী ব্যাংক লি:

সোনারগাঁও হোটেল শাখা,

ঢাকা।

জিয় মহোদয়,

আপনার ব্যাংকে গচ্ছিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের "নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আতাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০) প্রকল্পের হিসাব নথন একত্রীকরণ-০১২৩০০৩০০০০০৫৫ হতে নিম্নবর্ণিত হিসাবে মোট: ১২,১৫,০০,০০০.০০ (বার কোটি পনের লক্ষ) টাকা মাত্র খসড়া ট্রানজার করা হইয়া অনুমোদন করা হলো।

অফিসের নাম	ব্যাংক শাখা	হিসাব নং	টাকার পরিমাণ
১। হিসাব রক্ষণ অফিসার, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাগাউবো, রাজশাহী।	আগাখী বঙ্গবন্ধু লিঃ, ওয়াপসা (ইরি) শাখা, সপুড়া, রাজশাহী।	এসএনডি-০২০০০০৪১০৬২৯১ (রাউটিং নং-০১০৮১২৪১৭)	টক ১২,১৫,০০,০০০.০০

প্রকল্প :- "নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আতাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০)।

ক) প্রকল্প বিলি (৩য় কিস্তি) = ১২,১৫,০০,০০০.০০ (1211-F2000-224319200-00001)

৩২৪১১০১-ভ্রমণ ব্যয়	-
৩২৪৩১০১-পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	-
৩২৫৫১০২-মুদ্রণ ও বাধাই	-
৩২৫৫১০৪-সিল ও স্ট্যাম্পস	-
৩২৫৭১০৪-সার্ভে	-
৩২৫৮১০১-মোটর	-
মোট আবর্তক ব্যয়:	-
৩২৫৮১১৪-রেজলিটের মোরামত	-
৪১১১৩১০-নদী ড্রেজিং	৩,০২,৫৭,০০০.০০
৪১১১৩২১-প্রতিরক্ষা কাজ	৫,১২,৪৩,০০০.০০
৪১১১৩২১-বায়ু পুনরাকৃতিকরণ	৪,০০,০০,০০০.০০
৪১১৩১০২-বৃক্ষ, শস্য ও উদ্ভিদ সম্পদ উৎপাদনকারী আবর্তক পন্য	-
মোট মূলধন ব্যয়:	১২,১৫,০০,০০০.০০
সর্বমোট ব্যয়:	১২,১৫,০০,০০০.০০

বিলিকৃত অর্থ-পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত বিভাগের সনদিত অর্থ কোড অনুযায়ী ডিপিপি'র খাত / উপখাত ব্যতিত অন্য কোন খাত/ উপখাতে খরচ করা যাবে না। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যয়কারীকে PPA, PPR আর্থিক ক্ষমতা ও বিধি বিধানসহ বোর্ড ও পাসম এর অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল বিধি-বিধান ও নিয়মাদার প্রতিপালন করতঃ এ অর্থ ব্যয় করতে হবে।

সর্বমোট ১২,১৫,০০,০০০.০০
(বার কোটি পনের লক্ষ টাকা মাত্র)।

১২.২.২০২৬
(যেহ একরামুল করিম)
অতিরিক্ত পরিচালক, অর্থ
বাগাউবো, ঢাকা।
মোবাইল নং-০১৭২৬২০৬৬০৭

আপনার বিত্ত

১২.২.২০২৬
(মোঃ কবির আহম্মদ)
পরিচালক, অর্থ
বাগাউবো, ঢাকা।
মোবাইল নং-০১৯৫৫৫২২২৯৯

চলমান পাতা ২




বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

পরিচালকের কার্যালয়
অর্থ পরিদপ্তর

পানি ভবন (৯ম তলা), ব্লক-এ, ৭২ খ্রীশ্রোড, ঢাকা।
Email: dir.finance@bwdb.gov.bd

www.bwdb.gov.bd



অর্থ বৎসর ২০২২-২০২৩

মঞ্জুরী নং-৪৪

ক্রমিক নং-২৪০

স্মারক নং- গাউবো (অর্থ) উবাত/৩৬৭

তারিখঃ- ২৪/ ৪/২০২৩ খ্রিঃ।

ব্যবস্থাপক,
সোনালী ব্যাংক লিঃ,
সোনালীগাঁও হোটেল শাখা,
ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ব্যাংকে গচ্ছিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের "নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্মাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০) প্রকল্পের হিসাব নম্বর এসএনডিএস-০১২৩০০৩০০০০৫৫ হতে নিম্নবর্ণিত হিসাবে মোট: ৮,৫৪,৩২,০০০.০০ (আট কোটি চুয়ান্ন লক্ষ বত্রিশ হাজার) টাকা মাত্র অদ্যই স্থানান্তর করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অফিসের নাম	ব্যাংক শাখা	হিসাব নং	টাকার পরিমাণ
১। হিসাব রক্ষন অফিসার, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাগাউবো, রাজশাহী।	অগ্নী ব্যাংক লিঃ, ওয়ারাপদা (ইরি) শাখা, সপুরা, রাজশাহী।	এসএনডি-০২০০০০৪১০৬২৯১ (রাউটিং নং-০১০৮১২৪১৭)	টাকা ৮,৫৪,৩২,০০০.০০

প্রকল্প :- "নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্মাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০)।

ক) প্রকল্প বিলি (১ম-৩য় কিস্তির অবশিষ্টাংশ) = ৮,৫৪,৩২,০০০.০০ (1211-F2000-224319200-00001)

৩২১১১০৯-শ্রমিক মজুরি (সরকারী কর্মচারী ব্যতীত)	-
৩২৪৩১০১-পেট্রোল, ওয়েল ও মটরসেইট	-
মোট আবর্তক ব্যয়:	
৩২৫৮১১৪-রেগুলেটর মেরামত	-
৪১১১৩১০-নদী ড্রেজিং	২,০০,০০,০০০.০০
৪১১১৩১০-খনন/খাল পুনঃখনন	-
৪১১১৩২১-প্রতিরক্ষা কাজ	৫,০০,০০,০০০.০০
৪১১১৩২১-বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ	১,৫৪,৩২,০০০.০০
৪১১৩১০২-বৃক্ষ, শস্য ও উদ্ভিদ সম্পদ উৎপাদনকারী আবর্তক পণ্য	-
মোট মূলধন ব্যয়:	৮,৫৪,৩২,০০০.০০
সর্বমোট ব্যয়:	৮,৫৪,৩২,০০০.০০

বিস্তৃত অর্থ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত বিভাজনের সংশ্লিষ্ট অর্থ কোড অনুযায়ী ডিপিপি'র খাত / উপখাত ব্যতিত অন্য কোন খাত/ উপখাতে খরচ করা যাবেনা। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যয়কারীকে PPA,PPR আর্থিক ক্ষমতা ও বিধি বিধানসহ বোর্ড ও পাসম এর অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল বিধি-বিধান ও নিয়মাদির প্রতিপালন করতঃ এ অর্থ ব্যয় করতে হবে।

২৪.৪.২৬
(সোঃ একরামুল কবির)
অতিঃ পরিচালক, অর্থ
বাগাউবো, ঢাকা।
মোবাইল নং-০১৭২৬২০৬৬০৭

আপনার বিশ্বস্ত,

হেড নং-৩৬

সর্বমোটঃ ৮,৫৪,৩২,০০০.০০
(আট কোটি চুয়ান্ন লক্ষ বত্রিশ হাজার টাকা মাত্র)।

২৪.৪.২৩
(মোঃ কবির আহম্মদ)
পরিচালক, অর্থ
বাগাউবো, ঢাকা।
মোবাইল নং-০১৯৫৫৫২২২৯৯

চলমান পাতা-২



www.bwddb.gov.bd

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
পরিচালকের কার্যালয়
অর্থ পরিচালক
পানি ভবন (৯ম তলা), রক্ত-এ, ৭২ জি.এস. রোড, ঢাকা।
Email: dir.finance@bwddb.gov.bd



অর্থ বৎসর ২০২২-২০২৩
স্মারক নং-৪৪
তারিখ নং-৬৬

স্মারক নং পাউবো (অর্থ) উজাড/২৪০

তারিখ: ২৪/০৬/২০২৩ খ্রি:

বাণিজ্যিক,
সোনালী ব্যাংক লি.,
কোম্পারগাঁও হোটেল শাখা,
ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ব্যাংকে গচ্ছিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের "নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহম্মদপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আমদাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০) প্রকল্পের হিসাব নম্বর এসএনডিএস-০১২০০০০০০০৫৫ হতে নিম্নবর্ণিত হিসাবে মোট: ১৪,৯৯,৭৫,০০০.০০ (চৌদ্দ কোটি নিরানব্বই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা মাত্র অদাই স্থানান্তর করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অফিসের নাম	ব্যাংক শাখা	হিসাব নং	টাকার পরিমাণ
১: হিসাব রক্ষণ অফিসার, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাণাউবো, রাজশাহী।	অগ্রাধী ব্যাংক লি., ওরাপসা (ইরি) শাখা, সপুয়া, রাজশাহী।	এসএনডি-০২০০০০৪১০৬২৯১ (রাউটিং নং-০১০৮১২৪১৭)	টক ১৪,৯৯,৭৫,০০০.০০

প্রকল্প ১- "নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহম্মদপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আমদাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০)।

ক) প্রকল্প বিলি (৪র্থ কিস্তি) = ১৪,৯৯,৭৫,০০০.০০ (1211-F2000-224319200-00001)

৩২১১১০৯-অর্থিক মজুরি (সরকারী কর্মচারী ব্যতীত)	-
৩২৪৩১০১-পেট্রোল, গ্যাস ও পুত্রিকেন্ট	-
মোট আবর্তক ব্যয়:	-
৩২৫৮১১৪-রেজলেন্টের মেয়ামত	-
৪১১১০১০-নদী ড্রেজিং	৯,০০,০০,০০০.০০
৪১১১০১০-খনন/খাল পুনঃখনন	-
৪১১১০২১-প্রতিরক্ষা কাজ	৫,২৫,০০,০০০.০০
৪১১১০২১-বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ	৭৫,৭৫,০০০.০০
৪১১১০২২-বৃক্ষ, লস্যা ও উদ্ভিদ সম্পদ উৎপাদনকারী আবর্তক পন্য	-
মোট সম্পদ ব্যয়:	১৪,৯৯,৭৫,০০০.০০
সর্বমোট ব্যয়:	১৪,৯৯,৭৫,০০০.০০

কিনিকৃত অর্থ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত বিভাজনের সংশ্লিষ্ট অর্থ কোড অনুযায়ী ভিন্ভিনির খাত / উপখাত ব্যতীত অন্য কোন খাত/ উপখাতে খরচ করা যাবে না। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যয়কারীকে PPA,PPR আর্থিক কমতা ও বিধি বিধানসহ বোর্ড ও পাসম এর অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল বিধি-বিধান ও নিয়মাদির প্রতিপালন করতঃ এ অর্থ ব্যয় করতে হবে।

২৪/০৬/২০২৬

(করিশ আব্দেদ খান)
উপ-পরিচালক, অর্থ
বাণাউবো, ঢাকা।

আপনার বিশ্বস্ত,

২৪/০৬/২০২৬

সর্বমোট: ১৪,৯৯,৭৫,০০০.০০
(চৌদ্দ কোটি নিরানব্বই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা মাত্র)।

(মোঃ একরামুল কবির)
পরিচালক, অর্থ (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাণাউবো, ঢাকা।

সম্মান পাতা-২/

৬৫০



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

পরিচালকের কার্যালয়

অর্থ পরিদপ্তর

পানি ভবন (৯ম তলা), ব্লক-এ, ৭২ গ্রীণরোড, ঢাকা।

Email: dir.finance@bwddb.gov.bd



অর্থ বৎসর ২০২৩-২০২৪

যজুরী নং-৪৪

ক্রমিক নং- ০৪

www.bwddb.gov.bd

স্মারক নং- পাউবো (অর্থ) উনাত/ ০৪০

তারিখ ২৬/০৯/২০২৩ খ্রিঃ।

বাবস্থাপক,

সোনালী ব্যাংক লিঃ,

সোনারগাঁও হোটেল শাখা,

ঢাকা।

শ্রিয় মহোদয়,

আপনার ব্যাংকে গচ্ছিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের “নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্মাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০) প্রকল্পের হিসাব নথর এসএনডিএস-০১২৩০০৩০০০০৫৫ হতে নিম্নবর্ণিত হিসাবে মোট: ৯,০০,০০,০০০.০০ (নয় কোটি) টাকা মাত্র অদ্যই স্থানান্তর করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অফিসের নাম	ব্যাংক শাখা	হিসাব নং	টাকার পরিমাণ
১। হিসাব রক্ষন অফিসার, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাপাউবো, রাজশাহী।	অম্বী ব্যাংক লিঃ, ওয়াপদা (ইরি) শাখা, সপুরা, রাজশাহী।	এসএনডি-০২০০০০৪১০৬২৯১ (রাউটিং নং-০১০৮১২৪১৭)	টঃ ৯,০০,০০,০০০.০০

প্রকল্প ১- “নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্মাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০)।

ক) প্রকল্প বিলি (১ম কিস্তি) = ৯,০০,০০,০০০.০০ (1211-F2000-224319200-00001)

৩২৪৩১০১-পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	১,২৫,০০০.০০
৩২৫৫১০৪-সিল ও স্ট্যাম্প (স্টেশনারীসহ)	৫০,০০০.০০
৩১১১৩৩২- সম্মানী ভাতা (পিএসসি, পিআইসি, টিইসি, ডিপিইসি ইত্যাদি)	২৫,০০০.০০
৩২৫৭১০৪-জরিপ	২৫,০০০.০০
৩২৫৮১০১-মোটরযানে (বিদ্যমান যানবাহনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ-৫টি)	২৫,০০০.০০
মোট আবর্তক ব্যয়:	২,৫০,০০০.০০
৪১১১৩১০-নদী ড্রেজিং কাজ (২৭.০০ কিঃমিঃ)	৩,০০,০০,০০০.০০
৪১১১৩২১- তীর প্রতিরক্ষা কাজ (৫.১৪৫ কিঃমিঃ)	৫,৩৭,৫০,০০০.০০
৪১১১৩২১-বঁধ পুনরাকৃতিকরণ (২৫.০০ কিঃমিঃ)	৫০,০০,০০০.০০
৪১১৩১০২-বৃক্ষ, শস্য ও উদ্ভিজ্জ সম্পদ উৎপাদনকারী আবর্তক পন্য	১০,০০,০০০.০০
মোট মূলধন ব্যয়:	৮,৯৭,৫০,০০০.০০
সর্বমোট ব্যয়:	৯,০০,০০,০০০.০০

বিলিকৃত অর্থ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত বিভাজনের সংশ্লিষ্ট অর্থ কোড অনুযায়ী ডিপিপি খাত / উপখাত ব্যতিত অন্য কোন খাত/ উপখাতে খরচ করা যাবেনা। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যয়কারীকে PPA,PPR আর্থিক ক্ষমতা ও বিধি বিধানসহ বোর্ড ও পাসম এর অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল বিধি-বিধান ও নিয়মাদার প্রতিপালন করতঃ এ অর্থ ব্যয় করতে হবে।

•• অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের স্মারক নং- নং-০৭,১০১,০২০,০০,০০,০০৯,২০২২-০১; তারিখঃ ০২/০৭/২০২৩ খ্রিঃ এর নির্দেশনায় উল্লিখিত আবর্তক খাতের ব্যয় সমূহ হ্রাসকৃত হারে সম্পাদন করতে হবে এবং মূলধন খাতের ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ব্যয় সম্পাদনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের পূর্বনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। ইহা ছাড়া এই নির্দেশনার অন্যান্য শর্তাবলীও অনুসরণ করতে হবে।

২৬/০৯/২০২৩
(ফরিদ আহমেদ খান)
উপ-পরিচালক, অর্থ
বাপাউবো, ঢাকা।

আপনার বিশ্বস্ত,

২৬/০৯/২০২৩

সর্বমোট = ৯,০০,০০,০০০.০০

(নয় কোটি টাকা মাত্র)

(মোঃ কবির আহম্মদ)
পরিচালক, অর্থ
বাপাউবো, ঢাকা।

চলমান পাতা-২/



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
পরিচালকের কার্যালয়
অর্থ পরিদপ্তর
পানি ভবন (৯ম তলা), ব্লক-এ, ৭২ গ্রীণরোড, ঢাকা।
Email: dir.finance@bwdb.gov.bd



অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪
মন্ত্রীর নং-৪৪
ক্রমিক নং- ২০৬

www.bwdb.gov.bd

স্মারক নং- পাউবো (অর্থ) উবাত/ ৬০০

তারিখ :- ০৭/১১/২০২৩ খ্রিঃ।

বাবস্থাপক,
সোনালী ব্যাংক লি.,
সোনারগাঁও হোটেল শাখা,
ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ব্যাংকে গচ্ছিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের "নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০) প্রকল্পের হিসাব নম্বর এসএনডিএস-০১২৩০০৩০০০০৫৫ হতে নিম্নবর্ণিত হিসাবে মোট: ৮,৯৯,৫০,০০০.০০ (আট কোটি নিরানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মাত্র অদ্যই স্থানান্তর করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অফিসের নাম	ব্যাংক শাখা	হিসাব নং	টাকার পরিমাণ
১। হিসাব রক্ষন অফিসার, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাণাউবো, রাজশাহী।	অগ্রণী ব্যাংক লি., গোপদা (ইরি) শাখা, সপুরা, রাজশাহী।	এসএনডি-০২০০০০৪১০৬২৯১ (রাউটিং নং-০১০৮১২৪১৭)	টাক: ৮,৯৯,৫০,০০০.০০

প্রকল্প :- "নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০)।

ক) প্রকল্প বিলি (২য় কিস্তি) = ৮,৯৯,৫০,০০০.০০ (1211-F2000-224319200-00001)

৩২৪৩১০১-পেট্রোল, গ্যোল ও লুব্রিকেন্ট	৭৫,০০০.০০
৩২৫৫১০৪-সিল ও স্ট্যাম্প (স্টেশনারীসহ)	২৫,০০০.০০
৩১১১৩৩২- সম্মানী ভাতা (পিএসসি, পিআইসি, টিএসি, ডিপিএসি ইত্যাদি)	৬৭,০০০.০০
৩২৫৭১০৪-জরিপ	৮,০০০.০০
৩২৫৮১০১-মোটরযান (বিদ্যমান যানবাহনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ-৫টি)	২৫,০০০.০০
মোট আবর্তক ব্যয়:	২,০০,০০০.০০
৪১১১৩১০-নদী ড্রেজিং কাজ (২৭.০০ কিঃমিঃ)	১,৮৬,৭৭,০০০.০০
৪১১১৩২১- তীর প্রতিরক্ষা কাজ (৫.১৪৫ কিঃমিঃ)	৬,৬০,৭৩,০০০.০০
৪১১১৩২১-বাধ পুনরাকৃতিকরণ (২৫.০০ কিঃমিঃ)	৫০,০০,০০০.০০
৪১১৩১০২-বৃক্ষ, শস্য ও উদ্ভিদ সম্পদ উৎপাদনকারী আবর্তক পন্য	-
মোট মূলধন ব্যয়:	৮,৯৯,৫০,০০০.০০
সর্বমোট ব্যয়:	৮,৯৯,৫০,০০০.০০

বিলিকৃত অর্থ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত বিভাজনের সংশ্লিষ্ট অর্থ কোড অনুযায়ী ডিপিপি'র খাত / উপখাত ব্যতিত অন্য কোন খাত/ উপখাতে খরচ করা যাবেনা। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যয়কারীকে PPA, PPR আর্থিক ক্ষমতা ও বিধি বিধানসহ বোর্ড ও পাসম এর অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল বিধি-বিধান ও নিয়মাদির প্রতিপালন করতঃ এ অর্থ ব্যয় করতে হবে।

** অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের স্মারক নং- নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৯.২০২২-০১; তারিখঃ ০২/০৭/২০২৩ খ্রিঃ এর নির্দেশনায় উল্লেখিত আবর্তক খাতের ব্যয় সমূহ হাসকৃত হারে সম্পাদন করতে হবে এবং মূলধন খাতের ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ব্যয় সম্পাদনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের পূর্বনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। ইহা ছাড়া এই নির্দেশনার অন্যান্য শর্তাবলীও অনুসরণ করতে হবে।

(ফরিদ আহমেদ খান)
উপ-পরিচালক, অর্থ
বাণাউবো, ঢাকা।

আপনার বিশ্বস্ত,

(স্বাক্ষর)

সর্বমোট = ৮,৯৯,৫০,০০০.০০
(আট কোটি নিরানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)।

(মোঃ কবির আহম্মদ)
পরিচালক, অর্থ
বাণাউবো, ঢাকা।

৩য় কিষ্কি



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

পরিচালকের কার্যালয়

অর্থ পরিদপ্তর

পানি ভবন (৯ম তলা), ব্লক-এ, ৭২ মীনরোড, ঢাকা।

Email: dir.finance@bwdb.gov.bd



অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪

মঞ্জুরী নং-৪৪

ক্রমিক নং- ২৬৫

www.bwdb.gov.bd

স্মারক নং- পাউবো (অর্থ) উষাত/ ৫৫৪

তারিখঃ- ২২/০৩/২০২৪ খ্রিঃ।

বাবস্থাপক,
সোনালী ব্যাংক লি.,
সোনালীপাড়া হোটেল শাখা,
ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ব্যাংকে গচ্ছিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের "নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০) প্রকল্পের হিসাব নম্বর এসএনডিএস-০১২৩০০৩০০০০৫৫ হতে নিম্নবর্ণিত হিসাবে মোট: ৮,৯৯,৭৫,০০০.০০ (আট কোটি নিরানব্বই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা মাত্র অদ্যই স্থানান্তর করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অফিসের নাম	ব্যাংক শাখা	হিসাব নং	টাকার পরিমাণ
১. হিসাব রক্ষন অফিসার, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাণাউবো, রাজশাহী।	অগ্রাণী ব্যাংক লি., ওয়ার্পদা (ইলি) শাখা, সপুরা, রাজশাহী।	এসএনডি-০২০০০০৪১০৬২৯১ (রাউটিং নং-০১০৮১২৪১৭)	টাক ৮,৯৯,৭৫,০০০.০০

সংকল্প ২- "নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০)।

ক) প্রকল্প বিবিসি (৩য় কিষ্কি) = ৮,৯৯,৭৫,০০০.০০ (1211-F2000-224319200-00001)

৩২৪৩১০১-পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	১,০০,০০০.০০
৩২৫৫১০৪-গিল ও স্ট্যাম্প (স্টেশনারীসহ)	৫০,০০০.০০
৩১১১৩৩২- সম্মানী ভাতা (পিএসসি, পিআইসি, টিইসি, ডিপিইসি ইত্যাদি)	৮,০০০.০০
৩২৫৭১০৪-জরিপ	৪২,০০০.০০
৩২৫৮১০১-মোটরযান (বিদ্যমান যানবাহনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ-৫টি)	২৫,০০০.০০
মোট আবর্তক ব্যয়:	২,২৫,০০০.০০
৪১১১৩১০-নদী ড্রেজিং কাজ (২৭.০০ কিঃমিঃ)	-
৪১১১৩২১- তীর প্রতিরক্ষা কাজ (৫.১৪৫ কিঃমিঃ)	৭,৪৭,৫০,০০০.০০
৪১১১৩২১- নদী পুনরাকৃতিকরণ (২৫.০০ কিঃমিঃ)	১,৫০,০০,০০০.০০
৪১১৩১০২-পুষ্ক, লম্বা ও উচ্চজ সম্পদ উৎপাদনকারী আবর্তক পন্য	-
মোট মূলধন ব্যয়:	৮,৯৭,৫০,০০০.০০
সর্বমোট ব্যয়:	৮,৯৯,৭৫,০০০.০০

বিস্তৃতি অর্থ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত বিভাজনের সংশ্লিষ্ট অর্থ কোড অনুযায়ী ডিপিপি'র খাত / উপখাত বন্টিত অন্য কোম খাত/ উপখাতে খরচ করা যাবে না। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যয়কারীকে PPA, PPR আর্থিক ক্ষমতা ও বিসি বিধানসহ বোর্ড ও পাসম এর অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল বিধি-বিধান ও নিয়মাদির প্রতিপালন করতঃ এ অর্থ ব্যয় করতে হবে।

.. অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের স্মারক নং- নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৯.২০২২-০১; তারিখঃ ০২/০৭/২০২৩ খ্রিঃ এর নির্দেশনায় উল্লিখিত আবর্তক খাতের ব্যয় সমূহ হাসকৃত হারে সম্পাদন করতে হবে এবং মূলধন খাতের ভূমি অধিগ্রহণ ব্যবদ ব্যয় সম্পাদনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের পূর্ণনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। ইহা ছাড়া এই নির্দেশনার অন্যান্য শর্তাবলীও অনুসরণ করতে হবে।

সর্বমোট = ৮,৯৯,৭৫,০০০.০০

(আট কোটি নিরানব্বই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা মাত্র)

আপনার বিশুদ্ধ,

(নি. এম. মোশাররফ হোসেন)
অতিরিক্ত পরিচালক, অর্থ,
বাণাউবো, ঢাকা।

২০২৪

মোঃ জাকির হোসেন
পরিচালক, অর্থ,
বাণাউবো, ঢাকা।

চলমান পাতা: ২/



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

পরিচালকের কার্যালয়

অর্থ পরিদপ্তর

পানি ভবন (৯ম তলা), ব্লক-এ, ৭২ গ্রীণরোড, ঢাকা।

Email: dir.finance@bwdb.gov.bd



অর্থ বৎসর ২০২৩-২০২৪

মঞ্জুরী নং-৪৪

ক্রমিক নং- ১০৪

www.bwdb.gov.bd

স্মারক নং- পাউবো (অর্থ) উবাত/১৮৬০

তারিখঃ- ২৬/০৪/২০২৪ খ্রিঃ।

ব্যবস্থাপক,
সোনালী ব্যাংক লি.,
সোনারগাঁও হোটেল শাখা,
ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ব্যাংকে গচ্ছিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের “নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্মাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০) প্রকল্পের হিসাব নম্বর এসএনডিএস-০১২৩০০৩০০০০৫৫ হতে নিম্নবর্ণিত হিসাবে মোট: ১৭,৯৯,৯৯,০০০.০০ (সতের কোটি নিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার) টাকা মাত্র অদ্যই স্থানান্তর করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অফিসের নাম	ব্যাংক শাখা	হিসাব নং	টাকার পরিমাণ
১। হিসাব রক্ষন অফিসার, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাপাউবো, রাজশাহী।	অগ্রণী ব্যাংক লি., ওয়াপদা (ইরি) শাখা, সপুরা, রাজশাহী।	এসএনডি-০২০০০০৪১০৬২৯১ (রাউটিং নং-০১০৮১২৪১৭)	টঃ ১৭,৯৯,৯৯,০০০.০০

প্রকল্পঃ- “নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্মাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০)।

ক) প্রকল্প বিলি (১ম থেকে ৩য় কিস্তির অবশিষ্টাংশ) = ১৭,৯৯,৯৯,০০০.০০ (1211-F2000-224319200-00001)

৩২৪৩১০১-পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৪৭,০০০.০০
৩২৫৫১০২-মুদ্রণ ও বাঁধাই	৭৫,০০০.০০
৩২৫৫১০৪-সিল ও স্ট্যাম্প (স্টেশনারীসহ)	২৫,০০০.০০
৩২১১১০৯-শ্রমিক মজুরি (অনিয়মিত শ্রমিক)	২৫,০০০.০০
৩১১১৩৩২-সম্মানী ভাতা (পিএসসি, পিআইসি, টিইসি, ডিপিইসি ইত্যাদি)	১,০২,০০০.০০
৩২৫৭১০৪-জরিপ	৫০,০০০.০০
৩২৫৮১০১-মোটরযান (বিদ্যমান যানবাহনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ-৫টি)	৫০,০০০.০০
	মোট আবর্তক ব্যয়: ৩,৭৪,০০০.০০
৪১১১৩১০-নদী ড্রেজিং কাজ (২৭.০০ কিঃমিঃ)	-
৪১১১৩২১-তীর প্রতিরক্ষা কাজ (৫.১৪৫ কিঃমিঃ)	১০,১০,০০,০০০.০০
৪১১১৩২১-বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ (২৫.০০ কিঃমিঃ)	৭,৮৬,২৫,০০০.০০
৪১১৩১০২-বৃক্ষ, শস্য ও উদ্ভিদ সম্পদ উৎপাদনকারী আবর্তক পন্য	-
	মোট মূলধন ব্যয়: ১৭,৯৬,২৫,০০০.০০
	সর্বমোট ব্যয়: ১৭,৯৯,৯৯,০০০.০০

বিলিকৃত অর্থ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত বিভাজনের সংশ্লিষ্ট অর্থ কোড অনুযায়ী ডিপিপি'র খাত / উপখাত ব্যক্তিত অন্য কোন খাত/ উপখাতে খরচ করা যাবে না। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যয়কারীকে PPA, PPR আর্থিক ক্ষমতা ও বিধি বিধানসহ বোর্ড ও পাসম এর অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল বিধি-বিধান ও নিয়মাদার প্রতিপালন করতঃ এ অর্থ ব্যয় করতে হবে।

** অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের স্মারক নং- নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৯.২০২২-০১; তারিখঃ ০২/০৭/২০২৩ খ্রিঃ এর নির্দেশনায় উল্লিখিত আবর্তক খাতের ব্যয় সমূহ হ্রাসকৃত হারে সম্পাদন করতে হবে এবং মূলধন খাতের ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ব্যয় সম্পাদনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। ইহা হাড়া এই নির্দেশনার অন্যান্য শর্তাবলীও অনুসরণ করতে হবে।

সর্বমোট = ১৭,৯৯,৯৯,০০০.০০

(সতের কোটি নিরানব্বই লক্ষ নিরানব্বই হাজার টাকা মাত্র)।

আপনার বিশ্বস্ত,

(বি. এম. মোশাররফ হোসেন)
অতিরিক্ত পরিচালক, অর্থ,
বাপাউবো, ঢাকা।

(মোঃ জাকির হোসেন)
পরিচালক, অর্থ,
বাপাউবো, ঢাকা।

স্বাক্ষর

- ৮৫ -



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

পরিচালকের কার্যালয়

অর্থ পরিদপ্তর

পানি ভবন (৯ম তলা), ব্লক-এ, ৭২ ব্রীলরোড, ঢাকা।

Email: dir.finance@bwdb.gov.bd



অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪

মহুরী নং-৪৪

ক্রমিক নং-২০৬

www.bwdb.gov.bd

স্মারক নং- পাউবো (অর্থ) উদ্বা/ ৬৭৭

তারিখ ১-১০/০৬/২০২৪ খ্রি।

বাণিজ্যিক,
সোনালী ব্যাংক পিএলসি,
সোমাবলীও হোটেল শাখা,
ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ব্যাংকে গচ্ছিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের “নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্মাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০) প্রকল্পের হিসাব নবর এসএমডিএস-০১২৩০০৩০০০০৫৫ হতে নিম্নবর্ণিত হিসাবে মোট: ৫,০০,০০,০০০.০০ (পাঁচ কোটি) টাকা মাত্র অদ্যই স্থানান্তর করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অফিসের নাম	ব্যাংক শাখা	হিসাব নং	টাকার পরিমাণ
১। হিসাব রক্ষন অফিসার, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাণাউবো, রাজশাহী।	অগ্রদী ব্যাংক পিএলসি, ওয়াদা (ইরি) শাখা, সপুরা, রাজশাহী।	এসএমডি-০২০০০০৪১০৬২৯১ (রাউটিং নং-০১০৮১২৪১৭)	টঃ ৫,০০,০০,০০০.০০

প্রকল্প ৪- “নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্মাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০)।

ক) প্রকল্প বিলি (৪র্থ কিটি) = ৫,০০,০০,০০০.০০ (1211-F2000-224319200-00001)

৩২৪৩১০১-পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৫৬,০০০.০০
৩২৫৫১০২-মুদ্রণ ও বাধাই	২৫,০০০.০০
৩২৫৫১০৪-সিল ও স্ট্যাম্প (স্টেশনারীসহ)	৫০,০০০.০০
৩২১১১০৯-প্রমিত মঞ্জুরি (অনিয়মিত প্রমিত)	২৫,০০০.০০
৩১১১৩৩২-স্বাক্ষরী ভাতা (পিএসসি, পিআইসি, টিইসি, ডিপিইসি ইত্যাদি)	-
৩২৫৭১০৪-জরিপ	২৫,০০০.০০
৩২৫৮১০১-মোটরযান (বিদ্যমান যানবাহনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ-৫টি)	১,৫০,০০০.০০
মোট আবর্তক ব্যয়:	৩,৩১,০০০.০০
৪১১১৩১০-নদী ড্রেজিং কাজ (২৭.০০ কিঃমিঃ)	-
৪১১১৩২১-তীর প্রতিরক্ষা কাজ (৫.১৪৫ কিঃমিঃ)	৪,৯৬,৬৯,০০০.০০
৪১১১৩২১-নাথ পুনরাকৃতিকরণ (২৫.০০ কিঃমিঃ)	-
৪১১৩১০২-শস্য ও উদ্ভিদ সম্পদ উৎপাদনকারী আবর্তক: পন্য	-
মোট মূলধন ব্যয়:	৪,৯৬,৬৯,০০০.০০
সর্বমোট ব্যয়:	৫,০০,০০,০০০.০০

বিলিকৃত অর্থ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে আরীকৃত বিভাজনের সংশ্লিষ্ট অর্থ কোড অনুযায়ী ডিসিপি'র খাত / উপখাত ব্যতীত অন্য কোন খাত/ উপখাতে খরচ করা যাবে না। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যয়কারীকে PPA,PPR আর্থিক ক্ষমতা ও বিধি বিধানসহ বোর্ড ও পাসম এর অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল বিধি-বিধান ও গিয়ারমাচার প্রতিপালন করতে এ অর্থ ব্যয় করতে হবে।

** অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের স্মারক নং- নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৯.২০২২-০১; তারিখঃ ০২/০৭/২০২৩ খ্রিঃ এর নির্দেশনায় উল্লিখিত আবর্তক খাতের ব্যয় সমূহ হাসকৃত হারে সম্পাদন করতে হবে এবং মূলধন খাতের ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ব্যয় সম্পাদনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। ইহা ছাড়া এই নির্দেশনার অন্যান্য শর্তাবলীও অনুসরণ করতে হবে।

সর্বমোট = ৫,০০,০০,০০০.০০
(পাঁচ কোটি টাকা মাত্র)।

আপনার বিশ্বস্ত,

(ফরিদ আহমেদ খান)

উপ-পরিচালক, অর্থ (উদ্বা)

বাণাউবো, ঢাকা।

(মোঃ জায়েদুল ইসলাম)

পরিচালক, অর্থ

বাণাউবো, ঢাকা।



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

পরিচালকের কার্যালয়

অর্থ পরিদপ্তর

পানি ভবন (৯ম তলা), ব্লক-এ, ৭২ ব্রিগেড, ঢাকা।

Email: dir.finance@bwdb.gov.bd



www.bwdb.gov.bd

অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪

মকরী নং-৪৪

ক্রমিক নং-২৫৭

স্মারক নং- পাউবো (অর্থ) উবাত/ ১১৪

তারিখঃ ২০/০৬/২০২৪ খ্রিঃ।

স্বাক্ষরপত্র,
সোনালী ব্যাংক পিএলসি,
সোনালগাঁও হোটেল শাখা,
ঢাকা।

প্রিয় মহোদয়,

আপনার ব্যাংকে গচ্ছিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের “নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০) প্রকল্পের হিসাব নম্বর এসএনডিএস-০১২৩০০৩০০০০৫৫ হতে নিম্নবর্ণিত হিসাবে মোট: ৫,৮৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ কোটি পঁচালিশ লক্ষ) টাকা মাত্র অদ্যই স্থানান্তর করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অফিসের নাম	ব্যাংক শাখা	হিসাব নং	টাকার পরিমাণ
১। হিসাব রক্ষণ অফিসার, আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাগাউবো, রাজশাহী।	অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, ওয়ালদা (হরি) শাখা, সপুরা, রাজশাহী।	এসএনডি-০২০০০০৪১০৬২৯১ (রাউটিং নং=০১০৮১২৪১৭)	টঃ ৫,৮৫,০০,০০০.০০

প্রকল্পঃ- “নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০)।

ক) প্রকল্প বিলি (৪র্থ কিঙ্গির অবশিষ্টাংশ) = ৫,৮৫,০০,০০০.০০ (1211-F2000-224319200-00001)

৩২৪৩১০১-পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	-
৩২৫৫১০২-মুদ্রণ ও বাঁধাই	-
৩২৫৫১০৪-সিল ও স্ট্যাম্প (স্টেশনারীসহ)	-
৩২১১১০৯-প্রমিত মজুরি (অনিয়মিত প্রমিত)	-
৩১১১৩৩২- সম্মানী ভাতা (পিএসসি, পিআইসি, টিএসি, ডিপিএসি ইত্যাদি)	-
৩২৫৭১০৪-জরিপ	-
৩২৫৮১০১-মোটরযান (বিদ্যমান যানবাহনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ-৫টি)	১৭,০০০.০০
মোট আবর্তক ব্যয়:	১৭,০০০.০০
৪১১১৩১০-নদী ড্রেজিং কাজ (২৭.০০ কিঃমিঃ)	-
৪১১১৩২১- তীর প্রতিরক্ষা কাজ (৫.১৪৫ কিঃমিঃ)	৪,৮৮,৯৩,০০০.০০
৪১১১৩২১-বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ (২৫.০০ কিঃমিঃ)	৯৫,৯০,০০০.০০
৪১১৩১০২-বৃক্ষ, শস্য ও উদ্ভিদ সম্পদ উৎপাদনকারী আবর্তক পন্য	-
মোট মূলধন ব্যয়:	৫,৮৪,৮৩,০০০.০০
সর্বমোট ব্যয়:	৫,৮৫,০০,০০০.০০

বিলিকৃত অর্থ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত বিভাজনের সফ্রিই অর্থ কোড অনুযায়ী ডিপিএসি খাত / উপখাত ব্যতিত অন্য কোন খাত/ উপখাতে খরচ করা যাবে না। অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যয়কারীকে PPA,PPR আর্থিক ক্ষমতা ও বিধি বিধানসহ বোর্ড ও পাসম এর অন্যান্য প্রয়োজনীয় সকল বিধি-বিধান ও নিয়মাদার প্রতিপালন করতঃ এ অর্থ ব্যয় করতে হবে।

•• অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের স্মারক নং- নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৯.২০২২-০১; তারিখঃ ০২/০৭/২০২৩ খ্রিঃ এর নির্দেশনায় উল্লিখিত আবর্তক খাতের ব্যয় সমূহ হ্রাসকৃত হারে সম্পাদন করতে হবে এবং মূলধন খাতের ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ব্যয় সম্পাদনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। ইহা হাড়া এই নির্দেশনার অন্যান্য শর্তাবলীও অনুসরণ করতে হবে।

(ফরিদ আহমেদ খান)
উপ-পরিচালক, অর্থ (উবাত)
বাগাউবো, ঢাকা।

আপনার বিশ্বস্ত,

২৪/২৬

সর্বমোট = ৫,৮৫,০০,০০০.০০
(পাঁচ কোটি পঁচালিশ লক্ষ টাকা মাত্র)।

(মোঃ জাকিরুল ইসলাম)
পরিচালক, অর্থ,
বাগাউবো, ঢাকা।

চলমান পাতা-২/

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিচালনা-৩৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

তারিখ: ১৮ জুলাই ২০২৩
০১ জুলাই ২০২৩

নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০৫০.২১-২১৫

প্রেরক : আশেকুল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব
প্রাপক : চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২য় ১২তলা ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
বিষয় : ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আরএডিসিভুক্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন 'নওগাঁ জেলার ধানুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্মাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০)' শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে উন্নয়ন ব্যয়ে বরাদ্দের বিভাজন অনুমোদন।

অনুদিত হয়ে বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিসিভুক্ত উন্নয়ন ব্যয়ের মঞ্জুরি নম্বর-৪৪, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কোড নম্বর-১৪১ এর অধীনে 'নওগাঁ জেলার ধানুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্মাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০)' শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৬০০০.০০ (ষাট কোটি) লক্ষ টাকার নিম্নোক্ত বিভাজনের সরকারি অনুমোদন আশন করছি। মূলধন ও আবর্তক খাতের নিম্নিষ্ট ব্যয়খাত অনুসারে এই বিভাজন আদেশ জারি করা হলো:

ব্যয়খাত		জিএসি	প্রকল্প সাপাঠ্য			সর্বমোট
			পুনঃনির্মাণ যোগ্য (জিএসির মাপ্যমে)	ড্রপা, কোনটোপা সেফ, ইনপ্রেস্ট, বিশেষ হিসাব	অবর্তক প্রকল্প সাপাঠ্য (জিএসি)	
(ক) আবর্তক ব্যয়:						
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৫.০৪	০.০০	০.০০	০.০০	৫.০৪
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও কাগজ	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১.০০
৩২৫৫১০৪	সীল ও স্ট্যাম্প (স্টেশনারীসহ)	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২.০০
৩২১১১০৯	প্রমিত মজুরী (অনিয়মিত শ্রমিক)	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা (পিএসসি, পিআইসি, টিইসি, ডিপিইসি ইত্যাদি)	১.৯৪	০.০০	০.০০	০.০০	১.৯৪
৩২৫৭১০৪	জরিপ	১.৫২	০.০০	০.০০	০.০০	১.৫২
৩২৫৮১০১	মোটরযান (বিদ্যমান যানবাহনের সেরামিক ও রক্ষণাবেক্ষণ-৫টি)	৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩.০০
মোট আবর্তক ব্যয়:		১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫.০০
(খ) মূলধন ব্যয়						
৪১১৩১০২	বৃক্ষ, শস্য ও উদ্ভিদসম্পদ উপপল্লবী আবর্তক পল্লী	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০
৪১১১৩২১	তীর প্রতিরক্ষা কাজ (৫.১৪৫ কি.মি.)	৩৯৪১.৩৫	০.০০	০.০০	০.০০	৩৯৪১.৩৫
	বীধ পুনরাকৃতিকরণ (২৫.০০ কি.মি.)	১৫৪৬.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	১৫৪৬.৮৭
৪১১১৩১০	নদী ড্রেজিং কাজ (২৭.০০ কি.মি.)	৪৮৬.৭৮	০.০০	০.০০	০.০০	৪৮৬.৭৮
মোট মূলধন ব্যয়:		৫৯৭৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫৯৭৪.০০
সর্বমোট (ক+খ):		৬০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬০০০.০০

তবে শর্ত থাকে যে,

- অনুমোদিত প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অনুমোদিত ব্যয়ের মধ্যে গীমিত থেকে বিভাজিত অর্থব্যয় করতে হবে;
- নতুন/অতিরিক্ত অংশে বিভাজিত অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

স্বাক্ষর
২৪/৭/২৩
আশেকুল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ২২৩৩৫৭২৩৪

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ০১। সচিব, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ.আ. উপসচিব, ব্যজেট অধিশাখা-১৯)
- ০২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি ভবন, ৭২, গ্রিন রোড, ঢাকা।
- ০৩। প্রকল্প পরিচালক, 'নওগাঁ জেলার ধানুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্মাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০)' শীর্ষক প্রকল্প, নওগাঁ পওর বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নওগাঁ।
- ০৪। পরিচালক, অর্থ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি ভবন, ৭২, গ্রিন রোড, ঢাকা।
- ০৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৬। যুগ্মসচিব (পরিচালনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৭। সংশ্লিষ্ট নথি/স্মার্টার নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-০৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

তারিখ: ১৬ আষাঢ় ১৪৩১
৩০ জুন ২০২৪

নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০৫০.২১-৪৩০

প্রেরক : আশেকুল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব
প্রাপক : চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২য় ১২তলা ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয় : ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আরএডিপিভুক্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন 'নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০)' শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে উপযোজনপূর্বক পুনঃনির্ধারিত বরাদ্দকৃত অর্থের উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের সংশোধিত বিভাজন অনুমোদন।

আদিষ্ট হয়ে বর্তমান ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন বাজেটের মঞ্জুরি নম্বর-৪৪, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কোড নম্বর-১৪৭ এর অধীনে 'নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০)' শীর্ষক প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে উপযোজনপূর্বক পুনঃনির্ধারিত বরাদ্দকৃত ৫৬৫০.০০ (ছাপান্ন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) লক্ষ টাকার নিম্নোক্ত সংশোধিত বিভাজনের সরকারি অনুমোদন জ্ঞাপন করছি। মূলধন ও আবর্তক খাতের নির্দিষ্ট ব্যয়খাত অনুসারে এই বিভাজন আদেশ জারি করা হলো:

(লক্ষ টাকায়)

ব্যয়খাত	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য			সর্বমোট
	পুনর্ভরণ যোগ্য (জিওবির মাধ্যমে)	ডসা, কোনটাসা সেফ, ইমপ্রোভ, বিশেষ হিসাব	আরপিএ ব্যতীত প্রকল্প সাহায্য (ডিপিএ)		
(ক) আবর্তক ব্যয়:					
৩২৪৩১০১ পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	৫.০৪	০.০০	০.০০	০.০০	৫.০৪
৩২৫৫১০২ মূল্য ও বীধাই	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১.০০
৩২৫৫১০৪ সীল ও স্ট্যাম্প (স্টেশনারীসহ)	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২.০০
৩২১১১০৯ শ্রমিক মজুরী (অনিয়মিত শ্রমিক)	০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.৫০
৩১১১৩৩২ সম্মানী ভাতা (পিএসসি, পিআইসি, টিইসি, ডিপিইসি ইত্যাদি)	২.০২	০.০০	০.০০	০.০০	২.০২
৩২৫৭১০৪ জরিপ	১.৫২	০.০০	০.০০	০.০০	১.৫২
৩২৫৮১০১ মোটরযান (বিদ্যমান যানবাহনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ-৫টি)	২.৯২	০.০০	০.০০	০.০০	২.৯২
মোট আবর্তক ব্যয়:	১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫.০০
(খ) মূলধন ব্যয়					
৪১১৩১০২ বৃক্ষ, শস্য ও উদ্ভিদসম্পদ উৎপাদনকারী আবর্তক গণ্য	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০
৪১১৩২১ তীর প্রতিরক্ষা কাজ (৫.১৪৫ কি.মি.)	৩৯৪১.৩৫	০.০০	০.০০	০.০০	৩৯৪১.৩৫
বীধ পুনরাকৃতিকরণ (২৫.০০ কি.মি.)	১১৯৬.৮৭	০.০০	০.০০	০.০০	১১৯৬.৮৭
৪১১৩১০ নদী ডেজিং কাজ (২৭.০০ কি.মি.)	৪৮৬.৭৮	০.০০	০.০০	০.০০	৪৮৬.৭৮
মোট মূলধন ব্যয়:	৫৬৩৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫৬৩৫.০০
সর্বমোট (ক+খ):	৫৬৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫৬৫০.০০

তবে শর্ত থাকে যে,

- অনুমোদিত প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক অনুমোদিত ব্যয়ের মধ্যে সীমিত থেকে বিভাজিত অর্থব্যয় করতে হবে;
- নতুন/অতিরিক্ত অঙ্গ বিভাজিত অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

Signature
২০/৬/২৪

আশেকুল হক
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ২২৩৩৫৭২৩৪

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ০১। সচিব, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ.আ. উপসচিব, বাজেট অধিশাখা-১৯)
- ০২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি ভবন, ৭২, গ্রিন রোড, ঢাকা।
- ০৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি ভবন, ৭২, গ্রিন রোড, ঢাকা।
- ০৪। প্রকল্প পরিচালক, 'নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ (প্রকল্প কোড নং-২২৪৩১৯২০০)' শীর্ষক প্রকল্প, নওগাঁ পওর বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নওগাঁ।
- ০৫। পরিচালক, অর্থ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি ভবন, ৭২, গ্রিন রোড, ঢাকা।
- ০৬। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ০৭। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

Signature

২০২০-২০২১ সালের এডিসিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের অব্যয়িত জেরের বিবরণী।

ফক "ক"

ক্রমিক নং	এডিসি প্রকল্পের নাম ও কোড নং (ডাইনামিক এর প্রকল্প/উপ-প্রকল্প কোড)	২০২০-২০২১ সালের জার্ম পরিসর হইতে তথ্যিক প্রাপ্তি	২০২০-২০২১ সালের খরচ	অব্যয়িত জের (৩-৪)	ব্যয়ক শাখার নাম, ব্যয়ক ড্রাফট নং ও তারিখের টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬
	"নগরী প্রশাসন শাখার নগরীতলা ও মহাস্থানগড় উপজেলায় ৩টি প্রকল্পের পুনর্নির্মাণ এবং আড়াই নগরী প্রকল্পের তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (কোড নং ৪- ২২৪৩১৩০০) ২২৪৩১৩০০ ২২৪৩১৩০০ ২২৪৩১৩০০				অর্থনী ব্যয়ক লিঃ, প্রশাসন ইউনিয়ন শাখা, রাজশাহী প্রকল্পের নং-২২৪৩১৩০০ তারিখ ৪-১১/০৮/২০২০ টাকা-২,০৫,১১৯.০০ (আনুগত্যিক)
১)	৩১১১৩৩২- সখানী জাত(মধ্যবর্তী মূল্যায়ন)	২৫০,০০০.০০	১৯৮,০০০.০০	৫২,০০০.০০	
২)	৩২১১১২৫- বিজ্ঞান	১০০,০০০.০০	০০'৭৬'৬৬	২২৬.০০	
৩)	৩২৪১১০১-সমন বার	৩০০,০০০.০০	০০'৪৪'৬৬	৩২৬.০০	
৪)	৩২৪৩১০১-পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	৩৫০,০০০.০০	০০'৪৪'৬৬	৮১,৫৪৫.০০	
৫)	৩২৫৫১০২- সুপ্রদ ও বাথাই	৫০,০০০.০০	০০'০০'০০	১৫০.০০	
৬)	৩২৫৫১০৪- ইলেক্স স্ট্রীট	২০০,০০০.০০	১৯৭,০০০.০০	২,৯৮০.০০	
৭)	৩২৫৫১০৪- সার্ভে	৩০০,০০০.০০	০০'০০'০০	২,৬১১.০০	
৮)	৩২৫৮১০১- মোটর যানবাহন সেরামড	৩৫০,০০০.০০	৩৪৯,০০০.০০	১,০০০.০০	
	মোট আবর্তক ব্যয় =	১,৯০০,০০০.০০	১,৭৬০,০০০.০০	১৪০,০০০.০০	
৯)	৪১১১৩২১- বাঁধ পুনরুদ্ধার	১১,০৫০,০০০.০০	১০,৯৯৯,৮৮১.০০	৫০,১১৯.০০	
১০)	৪১১২১০১- মোটর যানবাহন ক্রম	৪০০,০০০.০০	৪০০,০০০.০০	-	
১১)	৪১১২২০২- কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (সফটওয়্যার)	৪৫০,০০০.০০	৪৫০,০০০.০০	-	
১২)	৪১১২৩০৪- জনস্বাস্থ্য সরঞ্জামাদি	৩৫০,০০০.০০	৩৩৫,০০০.০০	১৫,০০০.০০	
১৩)	৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	-	
১৪)	৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	৪০০,০০০.০০	৩৯৯,৯০০.০০	১০০.০০	
	মোট মুদ্রণী ব্যয় =	১২,৮০০,০০০.০০	১২,৭৯৮,৭৮১.০০	১,০০১,২১৯.০০	
	সর্বমোট ব্যয় =	১৪,৭০০,০০০.০০	১৪,৭৬০,০০০.০০	২০৫,১১৯.০০	

১৭০

২৩/০৮/২০২০

(ক, এম, তারিফুল আলী)

হিসাবরক্ষণ অফিসার

আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র

বাগডোবা, রাজশাহী।



Agrani Bank Limited
Committed to serve the nation

Agrani Bank Limited

WAPDA IRRIGATION

Acknowledgement Slip

Ref-/259331/11/08/2021	
Details Information	
Sender Information	Beinificiary Information
Bank : Agrani Bank Limited	Bank : Sonali Bank Limited
Branch : WAPDA IRRIGATION	Branch : SONARGOAN HOTEL
Routing No : 010812417	Routing No : 200264396
Date : 11 Aug 2021	Amount : 205113.00
A/C : 0200004106291	A/C : 0123003000055
A/C Name : UPO PORICHALOK.RAC.BPUB,RAJSHAHI	A/C Name : NAGOAN ZELLAR DHAMURHAT,POTNITOLA O MOHADEBPUR UPOZELLADHIN 3 PROKOLPO

System generated report. Does not required any signature

- ১১ -


Bangladesh Water Development Board

Rajshahi RAC

22431920000_DhamurHat_Project_Naogaon.

30, June 2022

<u>Economic Code & Description</u>	<u>Fund Received GOB</u>	<u>Current Month Expenditure GOB</u>	<u>Yearly Expenditure GOB</u>	<u>Unspent Balance GOB</u>
Eco.Code & Description				
/3111332_Honorium	1,100,000.00	1,082,000.00	1,100,000.00	22.00
/3211125_Publicity/Adverti	100,000.00	99,978.00	99,978.00	
/3241101_Travel Allowance	200,000.00	174,962.00	200,000.00	
/3243101_Petrol & Lubricant	300,000.00	(64.00)	300,000.00	536.00
/3255102_Printing & Publica	50,000.00	24,764.00	49,464.00	381.00
/3255104_Seal & Staps	100,000.00	0.00	99,619.00	1,080.00
/3257104_Survey	200,000.00	198,920.00	198,920.00	380.00
/3258101_Motor Vehicle	150,000.00	149,620.00	149,620.00	
3258114_Repair of Regulat	5,500,000.00	1,999,996.00	5,500,000.00	
4111310_Khal Khanon	150,500,000.00	50,830,194.00	150,500,000.00	
4111321_Others Civil Work	241,800,000.00	53,038,403.00	241,800,000.00	
Total: Development Project	400,000,000.00	107,598,773.00	399,997,601.00	2,399.00


 Accounts Officer
 Regional Accounting Centre
 BWDB, Rajshahi
 22/09/22

৩২

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড



উপ-পরিচালকের দপ্তর
আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র,
বাপাউবো, সপুড়া, রাজশাহী।
ফোন নং-০২৫৮৮৮৬৩৩০৭(অফিস)
E-Mail-rac.raishahi@gmail.com

Office of the
Deputy Director
Regional Accounting Centre,
BWDB, Supura, Rajshahi.
Phone : 02588863307(Office).

২০২২-২০২৩ইং অর্থ বছরে "নতুণা জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলায়ীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ প্রকল্প
(কোড নং ৪-২২৪৩১৯২০০) বরাদ্দ, তহবিল ও খরচের বিবরণী।
দপ্তরের নামঃ- নতুণা পত্তর বিভাগ, বাপাউবো, নতুণা।


26-Jun-2023 খ্রিঃ পর্বত

খাত	বরাদ্দ	তহবিল প্রাপ্তি	খরচ	অব্যয়িত জের
ক) আবর্তক ব্যয়				
৩২৪৩১০১-পেট্রোল ও নুট্রিকেন্ট	৩১,০০০.০০	৩১,০০০.০০	৩১,০০০.০০	-
মোট আবর্তক ব্যয়ঃ	৩১,০০০.০০	৩১,০০০.০০	৩১,০০০.০০	-
খ) মুশখলী ব্যয়				
৩২৫৮১১৪-রেজুলেটর মেরামত	৪৬,০০০.০০	৪৬,০০০.০০	৪৬,০০০.০০	-
৪১১১৩১০-নদী ড্রেজিং	২১৬,৩১১,০০০.০০	২১৬,৩১১,০০০.০০	২১৬,৩১১,০০০.০০	-
৪১১১৩২১-প্রতিরক্ষা কাজ	৩২১,২২৮,০০০.০০	৩২১,২২৮,০০০.০০	৩২১,২২৮,০০০.০০	৬.০০
৪১১১৩২১-বাঁধ পুনরুদ্ধারকরণ	৬২,৩১৫,০০০.০০	৬২,৩১৫,০০০.০০	৬২,৩১৫,০০০.০০	-
মোট মুশখলী ব্যয়ঃ	৪৪৫,৫৩৯,০০০.০০	৪৪৫,৫৩৯,০০০.০০	৪৪৫,৫৩৯,০০০.০০	৬.০০
মোট ব্যয়ঃ	৪৭৬,৫৩৯,০০০.০০	৪৭৬,৫৩৯,০০০.০০	৪৭৬,৫৩৯,০০০.০০	৬.০০

(কে.এম. আরিফুল আলম)
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা

আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাপাউবো, রাজশাহী

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড



উপ-পরিচালকের দপ্তর
আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র,
বাপাউবো, সপুবা, রাজশাহী।
ফোন নং-০২৫৮৮৮৬৩০৭(অফিস)
E-Mail-rac.raishahi@gmail.com

Office of the
Deputy Director
Regional Accounting Centre,
BWDB, Supura, Rajshahi
Phone : 02588863307(Office).

২০২৩-২০২৪ইং অর্থ বছরে "নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেশপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আড়াই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (কোড নং ৪-২২৪৩১৯২০০)

বরাদ্দ, তহবিল ও খরচের বিবরণী।

দপ্তরের নাম ৪- নওগাঁ পত্তর বিভাগ, বাপাউবো, নওগাঁ।

30/Jun/2024 খ্রিঃ পর্যন্ত

ক) আওতাধীন ব্যয়	খ) তহবিল	বরাদ্দ	তহবিল প্রাপ্তি	খরচ	অব্যয়িত জের
৩১১৩৩২-সম্মানী ভাতা (পিএসসি, পিআইসি, টিইসি, জিপিইসি ইত্যাদি)		১৯৪,০০০.০০	২০২,০০০.০০	২০২,০০০.০০	
৩২৪৩১০১-পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট		৫০৪,০০০.০০	৪০৩,০০০.০০	৪০২,৫০০.০০	৪০০.০০
৩২১১০৯-মাসিক মজুরী		৫০,০০০.০০	৫০,০০০.০০	৪৯,৫৪০.০০	৪৬০.০০
৩২৫৫১০২-মুদ্রণ ও বাধাই।		১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	৯৯,৯৫০.০০	৪০.০০
৩২৫৫১০৪- স্ট্যাম্প সীল (স্টেশনারীসহ)		২০০,০০০.০৫	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	
৩২৫৫১০৪-জরিপ		১৫২,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	১৪৯,২৪০.০০	৯৬০.০০
৩২৫৫১০১- মেট্রিক যান (বিদ্যমান যানবাহনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন - টেটি)		৩০০,০০০.০০	২৯২,০০০.০০	২৯১,৯৭০.০০	৩০.০০
খ) মূলধনী ব্যয়		১,৫০০,০০০.০০	১,৩৯৭,০০০.০০	১,৩৯৫,২০০.০০	১,৫০০.০০
৪১১৩১০-নদী ড্রেজিং		৪৮,৬৭৮,০০০.০০	৪৮,৬৭৭,০০০.০০	৪৮,৬৭৬,৫৫৩.০০	৪৪৭.০০
৪১১৩২১- প্রতিরক্ষা কাজ		৩৯৪,১৩৫,০০০.০০	৩৯৪,১৩৫,০০০.০০	৩৯৩,৬২৪,২৮৩.০০	৪,৫১০,৭১৭.০০
৪১১৩২১- বাঁধ পুনরুদ্ধারকরণ		১১৯,৬৮৭,০০০.০০	১১৩,২১৫,০০০.০০	৮৫,২১৭,৩৯৫.০০	২৭,৯৯৭,৬০৫.০০
৪১১৩১০২-বৃক্ষ, শস্য ও উদ্ভিদ সম্পদ উৎপাদনকারী আবর্তক পণ্য		১,০০০,০০০.০০	১,০০০,০০০.০০	৮৯১,৭৬৪.০০	১০৮,২৩৬.০০
মোট মূলধনী ব্যয়ঃ		৫৬৩,৫০০,০০০.০০	৫৫৭,০২৭,০০০.০০	৫২৪,৪০৯,৯৯৫.০০	৩২,৬১৭,০০৫.০০
মোট ব্যয়ঃ		৫৬৫,০০০,০০০.০০	৫৫৮,৪২৪,০০০.০০	৫২৫,৮০৫,১৯৫.০০	৩২,৬১৮,৮০৫.০০

(মোঃ শওকত আলী)

সহকারী পরিচালক(অফিস)

আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, বাপাউবো, রাজশাহী

২০/৬/২৪



Agrani Bank Limited

WAPDA IRRIGATION

Acknowledgement Slip

Ref-/1119594/04/08/2024

Details Information

Sender Information	Beinificiary Information
Bank : Agrani Bank Limited	Bank : Sonali Bank Limited
Branch : WAPDA IRRIGATION	Branch : SONARGOAN HOTEL
Routing No : 010812417	Routing No : 200264396
Date : 04 Aug 2024	Amount : 32618805.00
A/C : 0200004106291	A/C : 01230030000055
A/C Name : UPO PORICHALOC ANCHOLIC HESAB CAND	A/C Name : NAGOAN DIST DHAMURHAT, PATNITALA and MOHADEBPUR UPOZILA PROJECT

System generated report. Does not required any signature

-20-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা বিভাগ
এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ
একনেক শাখা-১
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

অতি জরুরি
বিশেষ বাহক মারফত

স্মারক : ২০.০০.০০০০.৪১১.১৪.০৮৫.২০.৩১০

তারিখ: ০৫ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২০ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রি:

বিষয় : একনেক কর্তৃক অনুমোদিত "নওগাঁ জেলার ধানুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আতাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদন

সূত্র : (ক) একনেক সভার কার্যবিবরণী নম্বর- ২০.০০.০০০০.৪১১.০৬.০৪১.২০-১৬০, তারিখ: ১৬.০৭.২০২০
(খ) একনেক-১ শাখার স্মারক নম্বর-২০.০০.০০০০.৪১১.১৪.০৮৫.২০-২৩৭, তারিখ: ২০.০৭.২০২০
(গ) কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের স্মারক নম্বর-২০.৩৫৮.০১৪.০১.০১.১৭.১৮-১০৩ তারিখ: ০৬.০৯.২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে পানি সম্পদ সচিবালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যাহিত "নওগাঁ জেলার ধানুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আতাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৬.০৭.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভার চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির মোট প্রাকল্পিত ব্যয় ১৭৯.৪৭০৫ কোটি টাকা (একশত উনাত্তাশি কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে।

২। প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২২।

৩। প্রকল্পটির অনুমোদিত অংশ ও অশাণ্ডিতিক বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন নিম্নরূপ :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	অংশের নাম	সংখ্যা/ পরিমাণ	জিওবি	মোট ব্যয়
(ক) রাজস্ব ব্যয় :				
	সরবরাহ ও সেবাঃ			
১.	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	থোক	৫.০০	৫.০০
২.	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	৬.০০	৬.০০
৩.	মুদ্রন ও বান্ধাই	থোক	১.০০	১.০০
৪.	স্ট্যাম্প ও সীল (স্টেশনারীসহ)	থোক	৩.০০	৩.০০
৫.	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২.০০	২.০০
৬.	শ্রমিক মজুরী (সরকারি কর্মচারী ব্যতীত)	থোক	৫.০০	৫.০০
৭.	সম্মানী ভাতা (পিইসি, পিআইসি, টিইসি, ডিপিইসি)	থোক	৫.০০	৫.০০
৮.	সম্মানী ভাতা (মহাবর্তী মূল্যায়ন বাবদ)	থোক	৮.০০	৮.০০
৯.	জরিপ	থোক	৫.০০	৫.০০
১০.	মেসারি, রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসন			
১১.	মোটরযান (বিদ্যমান যানবাহনের মেসারি ও রক্ষণাবেক্ষণ)	৫টি	৫.০০	৫.০০
	উপ-মোট (রাজস্ব ব্যয়)(ক):	-	৪৫.০০	৪৫.০০
(খ) মূলধন ব্যয় :				
১২.	মোটরযান (মোটর সাইকেল ২টি)	২টি	৪.০০	৪.০০
১৩.	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (স্কোভার্স লেভেলিং মেশিন-২টি, জিপিএস-১টি)	৩টি	৩.৫০	৩.৫০
১৪.	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (নেজার প্রিন্টার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ ব্রান্ড কম্পিউটার-২টি)	২টি	২.০০	২.০০
১৫.	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (নেজার প্রিন্টারসহ ল্যাপটপ-২টি)	২টি	২.৫০	২.৫০
১৬.	অফিস সরঞ্জামাদি (ফটোকপিয়ার-১টি)	১টি	১.৫০	১.৫০
১৭.	আসবাবপত্র	থোক	৪.০০	৪.০০
১৮.	বৃক্ষ, শস্য ও উদ্ভিদসম্পদ উৎপাদনকারী আরওক গাছ	থোক	১০.০০	১০.০০
১৯.	নির্মাণ ও পূর্তঃ			
২০.	তীর প্রতিরক্ষা কাজ (৪.০০ কিঃমিঃ)	৪.০০ কিঃমিঃ	৮২২৫.৮৯	৮২২৫.৮৯

পৃষ্ঠা-১/২

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-০৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।



নং- ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৯.১৭-৭৯

তারিখ: ০৬ আশ্বিন ১৪২৭
২১ সেপ্টেম্বর ২০২০

প্রেরক: মোহাম্মদ মোহাম্মদুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব

প্রাপক: প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২য়, ১২তলা সরকারী ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয়: 'নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের স্মারক নং-২০.০০.০০০০.৪১১.১৪.০১৭.২০-৩১০ তারিখ: ২০-০৯-২০২০ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশক্রমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রত্যাবিত 'নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করছি। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭৯.৪৭০৫ কোটি (একশত উনআশি কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে।

২। অনুমোদিত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত।

৩। অনুমোদিত প্রকল্পের অনুমোদিত অর্থায়নিক ব্যয় বিভাজন নিম্নরূপ:

		(লক্ষ টাকায়)	
ক্রঃ	অঙ্গের বিবরণ	পরিমাণ/সংখ্যা	ব্যয়
(ক)	রাজস্ব ব্যয়:		
	সরবরাহ সেবা:		
১।	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	থোক	৫.০০
২।	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	৬.০০
৩।	মুদ্রণ ও বঁধাই	থোক	১.০০
৪।	স্ট্যাম্প ও সীল (স্টেশনারীসহ)	থোক	৩.০০
৫।	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২.০০
৬।	প্রমিত মজুরী (সরকারি কর্মচারী ব্যতীত)	থোক	৫.০০
৭।	সম্মানী ভাতা (পিইসি, পিআইসি, টিইসি, ডিপিইসি)	থোক	৫.০০
৮।	সম্মানী ভাতা (মধ্যবর্তী মূল্যায়ন বারদ)	থোক	৮.০০
৯।	জরিপ	থোক	৫.০০
	সেয়ারমত রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনর্বাসন:		
১০।	মোটরযান (বিসদৃশ যানবাহনের সেয়ারমত ও রক্ষণাবেক্ষণ)	৫টি	৫.০০
	উপমোট (রাজস্ব):		৪৫.০০

(পৃষ্ঠা: ১/২)

-২৫-

২৫-

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-০৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।



নং- ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৯.১৭-১৭

তারিখ: ০৫ শ্রাবণ ১৪২৭
২০ জুলাই ২০২২

প্রেরক: মোহাম্মদ মোবাশশেরুল ইসলাম
উপসচিব

প্রাপক: চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২য়, ১২তলা সরকারী ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয়: 'নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পয়ীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদবৃদ্ধির প্রশাসনিক অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের স্মারক নম্বর-২০.০০.০০০০.১২১.১৪.২৩৪.২০২০-৩৩৯ তারিখ: ১৭-০৭-২০২২।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিশ্রেফিতে আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশক্রমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রস্তাবিত 'নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পয়ীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদবৃদ্ধির প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করছি। প্রকল্পের মোট প্রাকল্পিত ব্যয় ১৭৯.৪৭০৫ কোটি (একশত উনাত্তালি কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে।

২। অনুমোদিত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত।

৩। অনুমোদিত প্রকল্পের অনুমোদিত অশাচিটিক ব্যয় বিভাজন নিম্নরূপ:

ক্র:	অংশের বিবরণ	পরিমাপ/সংখ্যা	ব্যয়
(ক)	রাজস্ব ব্যয়:		
	সরবরাহ সেবা:		
১।	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	থোক	৫.০০
২।	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	৬.০০
৩।	মুদ্রণ ও বীধাই	থোক	১.০০
৪।	স্ট্যাম্প ও সীল (স্টেশনারীসহ)	থোক	৩.০০
৫।	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	২.০০
৬।	প্রমিতিক মজুরী (সরকারি কর্মচারী ব্যতীত)	থোক	৫.০০
৭।	সম্মানী ভাতা (পিইসি, পিআইসি, টিইসি, ডিএসিইসি)	থোক	৫.০০
৮।	সম্মানী ভাতা (মধ্যবর্তী মূল্যায়ন বাদ)	থোক	৮.০০
৯।	জরিপ	থোক	৫.০০
	মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনর্বাসন:		
১০।	মোটরযান (বিদ্যমান যানবাহনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ)	৫টি	৫.০০
	উপমোট (রাজস্ব):		৪৫.০০

(গৃহ-১/১)

মোহাম্মদ আব্দুর রহিম মিলন
উপসচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

- ২৪৪ -

২০০৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-০৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নম্বর-৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৯.১৭-৪৮০

তারিখ: ০১ আষাঢ় ১৪৩০
১৫ জুন ২০২৩

প্রেরক : মোহাম্মদ আব্দুর রহিম রিপন
উপসচিব
প্রাপক : চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২য়, ১২তলা সরকারি ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পরীতলা ও মহাসেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের ১ম সংশোধনের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর: ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৯.১৭-৪৮০ তারিখ: ০৬ জুন ২০২৩।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশক্রমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পরীতলা ও মহাসেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের ১ম সংশোধনের প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করছি। প্রকল্পের মোট প্রাকল্পিত ব্যয় ১৭৬৩৬.৪১ লক্ষ (একশত ছিয়াত্তর কোটি ছত্রিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার) টাকা। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে।

০২। অনুমোদিত প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২৩।

০৩। অনুমোদিত প্রকল্পের অনুমোদিত অশাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ইকোনমিক কোড	অংশের নাম	১ম সংশোধন অনুযায়ী		
		একক	পরিমাণ/ সংখ্যা	ব্যয়
(ক) রাজস্ব ব্যয়:				
৩২৪১১০১	অত্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	জনদিবস	৪৯৮.০০	৫.০০
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	লিটার	৯৩৫৯.০০	১১.০০
৩২৪৫১০২	মুদ্রণ ও বীধাই	সেট	১৬৯.০০	২.০০
৩২৪৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সিল (স্টেশনারীসহ)	প্রতিটি	১৪৬৭.০০	৫.০০
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	সেট	১.০০	২.০০
৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরি (সরকারি কর্মচারী ব্যতীত)	থোক	থোক	০.৫০
৩১১১৩৩২	সম্মানি ভাতা (পিএসসি, পিআইসি, টিইসি, ডিপিইসি ইত্যাদি)	সভা	৩৩.০০	৭.০০
৩১১১৩৩২	সম্মানি ভাতা (মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ব্যবদ)	টি	১.০০	৮.০০
৩২৫৭১০৪	জরিপ	কি.মি.	২০.০০	৬.৫০
সেৱামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন				
৩২৫৮১০১	মটরযান (বিদ্যমান যানবাহনের সেৱামত ও রক্ষণাবেক্ষণ-৫টি)	টি	৫	৮.০০
	উপমোট (রাজস্ব):			৫৫.০০
(খ) মূলধন ব্যয়:				
	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়:			
৪১১২১০১	মটরযান (মটর সাইকেল ২টি)	টি	২	৪.০০
৪১১২৩০৪	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (স্ট্যান্ডসহ লেভেলিং মেশিন-২টি,	টি	৩	৩.২০

নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর, বাগাউনো, নওগাঁ

উপসচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা

১৫ জুন ২০২৩

নির্বাহী প্রকৌশলী

-৮০-

-৩০২-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
সেচ অনুবিভাগ

নং-২০.৩৫৮.০১৪.০১.০১.১৭.২০১৮/৩৬

১১ শ্রাবন ১৪৩০ ব.
তারিখঃ -----
২৬ জুলাই ২০২৩ খ্রি.


বিষয়ঃ “নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পদ্মীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি সংক্রান্ত।

সূত্র: (ক) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৯.১৭-৩৪৪, তারিখঃ ২৭-০৩-২০২৩ খ্রি.

(খ) আইএমইডি'র স্মারক নং- ২১.০০.০০০০.১২১.১৪.২৬৪.২২-১৩১, তারিখঃ ২২-০৬-২০২৩ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পদ্মীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পটির মেয়াদ জুন ২০২৩ এ সমাপ্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি অর্জিত না হওয়ায় নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পটির কার্যক্রম সচল রাখার সুবিধার্থে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আইএমইডি'র সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩ এর পরিবর্তে জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর নির্দেশক্রমে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলো। তবে শর্ত থাকে যে, প্রকল্পটি আবশ্যিকভাবে জুন ২০২৪-এ সমাপ্ত করতে হবে:

- (ক) প্রকল্পের আওতায় প্যাকেজ নং-Nao-W-7 ও প্যাকেজ-Nao-W-8 এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এলজিইডি কর্তৃক বীধের ওপর নির্মিত বিটুমিনাস কার্পেটিং রোডের অংশ অপসারণ করে বীধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়নের আদৌ প্রয়োজন আছে কি না তা উক্ত সংস্থা/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ একটি কারিগরি কমিটি গঠন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে;
- (খ) প্যাকেজ-Nao-W-8 সংশ্লিষ্ট বীধের কিছু অংশে গাছ রয়েছে যা স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমঝুত্বের মাধ্যমে দ্রুত অপসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে;
- (গ) সকল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন; এবং
- (ঘ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত বর্ধিত মেয়াদে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এডিপি-তে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও যথাসময়ে অর্থছাড় এবং প্রকল্পের নিবিড় পরিরীক্ষণ নিশ্চিত করবে।



(হাবিবুল হাসান রুমি)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোন- ৯১৮০৭৫৯

সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

কার্যার্থে অনুলিপিঃ

- ১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ৭২ গ্রীণরোড, ঢাকা
- ২। প্রকল্প পরিচালক, “নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পদ্মীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্প, বাপাউবো, নওগাঁ।

৮২

১০৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-০৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নম্বর-৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৯.১৭-৪৬

তারিখ: ২৫ শ্রাবণ ১৪৩০
০৯ আগস্ট ২০২৩

প্রেরক : খান মোঃ হাসানুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী সচিব

প্রাপক : চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২য়, ১২তলা-সরকারি ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০১ (এক) বছর মেয়াদবৃদ্ধির প্রশাসনিক অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র : পরিকল্পনা কমিশনের পত্র নম্বর-২০.৩৫৮.০১৪.০১.০১.১৭.২০১৮/৩৬ তারিখ: ২৬ জুলাই ২০২৩ খ্রি।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশক্রমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২৩ এর পরিবর্তে ০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধিতে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করছি:

(ক) প্রকল্পের আওতায় প্যাকেজ নং-Nao-W-7 ও প্যাকেজ-Nao-W-8 এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এলজিইডি কর্তৃক বাঁধের ওপর নির্মিত বিটুমিনাস কার্পেটিং রোডের অংশ অপসারণ করে বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ বাস্তবায়নের আদৌ প্রয়োজন আছে কি না তা উক্ত সংস্থা/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিসহ একটি কারিগরি কমিটি গঠন করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে;

(খ) প্যাকেজ-Nao-W-8 সংশ্লিষ্ট কিছু অংশে গাছ রয়েছে যা স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে দ্রুত অপসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে;

(গ) সকল অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন; এবং

(ঘ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত বর্ধিত মেয়াদে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এডিপি-তে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও যথাসময়ে অর্থছাড় এবং প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ নিশ্চিত করবে।

০২। এমতাবস্থায়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ' শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২৩ এর পরিবর্তে ০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদবৃদ্ধির প্রশাসনিক আদেশ নির্দেশক্রমে জারি করা হলো।

খান মোঃ হাসানুজ্জামান
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ২২৩৩৫৭২৩৪

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

০১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০২। সিনিয়র সচিব, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ.আ. উপসচিব, বাজেট অধিশাখা-১৯)।

০৩। সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

-৩০৮-

-৪৪-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-০৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নম্বর-৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৯.১৭-২০৭

তারিখ: ২৬ পৌষ ১৪৩০
১০ জানুয়ারি ২০২৪

প্রেরক : মোহাম্মদ আব্দুর রহিম রিপন
উপসচিব

প্রাপক : চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২য়, ১২তলা সরকারি ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের অঙ্গসমূহের অর্থনৈতিক কোড সংশোধনের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রেক্ষিতে আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী নির্দেশক্রমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট, পল্লীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ডেজিংসহ তীর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের অঙ্গসমূহের অর্থনৈতিক কোড সংশোধনের প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করছি। প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭৬৩৬.৪১ লক্ষ (একশত ছিয়াত্তর কোটি ছত্রিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার) টাকা। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে।

০২। অনুমোদিত প্রকল্পটির মেয়াদকাল ০১ জুলাই ২০২০ হতে ৩০ জুন ২০২৪।

০৩। অনুমোদিত প্রকল্পের অনুমোদিত অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিভাজন নিম্নরূপ:

(লক্ষ টাকায়)

ইকোনমিক কোড	অংশের নাম	১ম সংশোধন অনুযায়ী		
		একক	পরিমাণ/ সংখ্যা	ব্যয়
(ক) রাজস্ব ব্যয়:				
৩২৪১১০১	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	জনদিন	৪৯৮.০০	৫.০০
৩২৪৩১০১	পেট্রোল, ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট	লিটার	৯৩৫৯.০০	১১.০০
৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও বাঁধাই	সেট	১৬৯.০০	২.০০
৩২৫৫১০৪	স্ট্যাম্প ও সিল (স্টেশনারীসহ)	প্রতিটি	১৪৬৭.০০	৫.০০
৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	সেট	১.০০	২.০০
৩২১১১০৯	শ্রমিক মজুরি (সরকারি কর্মচারী ব্যতীত)	থোক	১.০০	০.৫০
৩১১১৩৩২	সম্মানি ভাতা (পিএসসি, পিআইসি, টিইসি, ডিপিইসি ইত্যাদি)	টি	৩৩.০০	৭.০০
৩১১১৩৩২	সম্মানি ভাতা (মধ্যবর্তী মূল্যায়ন বাবদ)	টি	১.০০	৮.০০
৩২৫৭১০৪	জরিপ	কি.মি.	২০.০০	৬.৫০
মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন				
৩২৫৮১০১	মটরযান (বিদ্যমান যানবাহনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ-৫টি)	টি	৫	৮.০০
৩২৫৮১১৪	রেগুলেটর মেরামত-৫টি	টি	৫	৫৫.৪৭
	উপমোট (রাজস্ব):			১১০.৪৭
(খ) মূলধন ব্যয়:				
	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়:			
৪১১২১০১	মটরযান (মটর সাইকেল ২টি)	টি	২	৪.০০
৪১১২৩০৪	প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (স্ট্যান্ডসহ লেভেলিং মেশিন-২টি, জিপিএস-১টি)	টি	৩	৩.২০
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক (লেজার প্রিন্টার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিসহ ব্রান্ড কম্পিউটার)	টি	২	২.০০

৫

-১০৪-
